



BRUNO CALEBE



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Report

Pg 1

Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
STUMPF CABEÇOTE	STUMPF CAB	126,6	94,5
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET PRO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM
2,00	33,2
4,00	70,1
6,00	100,0
8,00	114,7
10,00	122,6
12,00	126,6
Average:	94,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

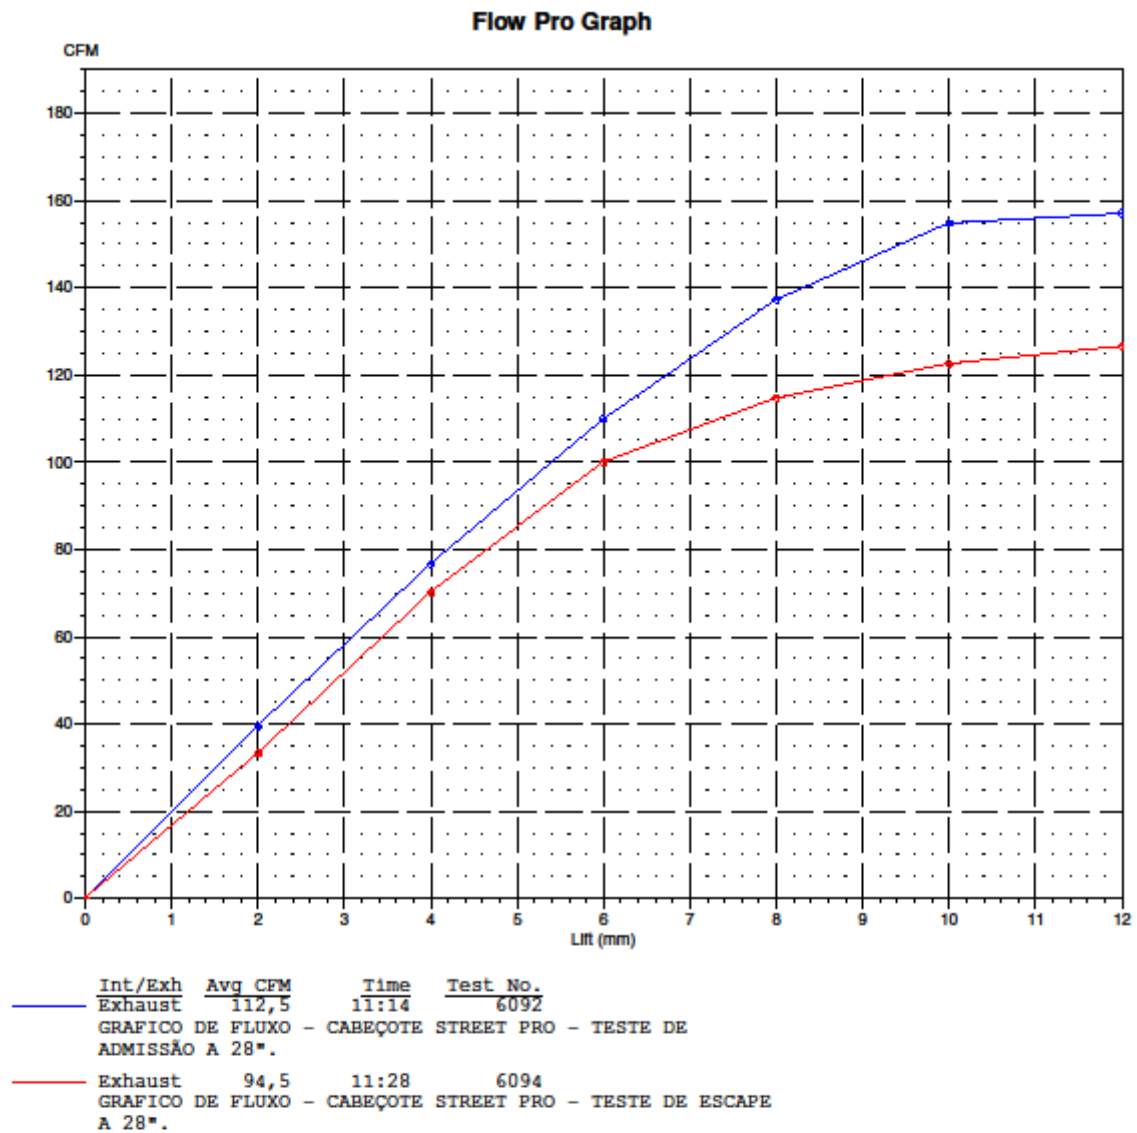


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET PRO



CHECK LIST

CLIENTE: BRUNO CALEBE
VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	30	30	30	30	-	-	-	-
ESC	35	35	35	35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	125/250	125/250	125/250	125/250	-	-	-	-
ESC	125/250	125/250	125/250	125/250	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

OBS>

34,2 CC



DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1


C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO SAMCAMS\350T.CPP							
		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA	
Lobe	I1						
Centerline	112,21 BTDC	0,10	290,99	78,68 BBDC	32,31 ATDC	1027,6	
.050 Lift C/L	112,18 BTDC	0,15	287,96	77,03 BBDC	30,93 ATDC	1027,3	
Runout	0,0457	0,20	285,17	75,54 BBDC	29,63 ATDC	1027,0	
Peak Open Acc.	0,01370	0,25	282,65	74,13 BBDC	28,52 ATDC	1026,7	
Peak Nose Acc.	-0,00836	0,30	280,38	72,93 BBDC	27,46 ATDC	1026,3	
Peak Close Acc.	0,01430	0,51	272,29	68,63 BBDC	23,66 ATDC	1024,4	
Lift @ TDC	2,882	1,27	252,31	58,21 BBDC	14,10 ATDC	1015,2	
Valve Lash	0,300	2,54	229,01	46,29 BBDC	2,72 ATDC	991,9	
Rocker Ratio	1,00	7,65	148,58	5,68 BBDC	37,09 BTDC	780,7	
Lobe Separation	112,2	8,89	125,51	5,69 ABDC	48,81 BTDC	683,9	
		10,16	97,48	19,61 ABDC	62,92 BTDC	548,8	
		11,43	57,95	39,15 ABDC	82,90 BTDC	333,2	
		12,4223	---	PEAK CAM LIFT ---			
		12,1223	---	PEAK VALVE LIFT ---			

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO SAMCAMS\350T.CPP							
		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA	
Lobe	E1						
Centerline	112,21 ATDC	0,10	287,61	32,31 BTDC	75,30 ABDC	1026,2	
.050 Lift C/L	112,39 ATDC	0,15	284,85	30,84 BTDC	74,00 ABDC	1025,8	
Runout	0,0330	0,20	282,36	29,50 BTDC	72,87 ABDC	1025,8	
Peak Open Acc.	0,01423	0,25	280,07	28,28 BTDC	71,79 ABDC	1025,6	
Peak Nose Acc.	-0,00728	0,30	277,95	27,14 BTDC	70,81 ABDC	1025,3	
Peak Close Acc.	0,01485	0,51	270,38	23,08 BTDC	67,30 ABDC	1023,7	
Lift @ TDC	2,702	1,27	251,10	13,05 BTDC	58,05 ABDC	1014,1	
Valve Lash	0,350	2,54	227,99	1,32 BTDC	46,67 ABDC	993,7	
Rocker Ratio	1,00	7,65	148,73	38,37 ATDC	7,10 ABDC	790,5	
Lobe Separation	112,2	8,89	125,84	49,77 ATDC	4,39 BBDC	695,7	
		10,16	97,92	63,69 ATDC	18,39 BBDC	562,4	
		11,43	59,01	82,99 ATDC	38,01 BBDC	351,4	
		12,4980	---	PEAK CAM LIFT ---			
		12,1480	---	PEAK VALVE LIFT ---			



GRAFICO DO COMANDO

Cam Pro Plus Graph

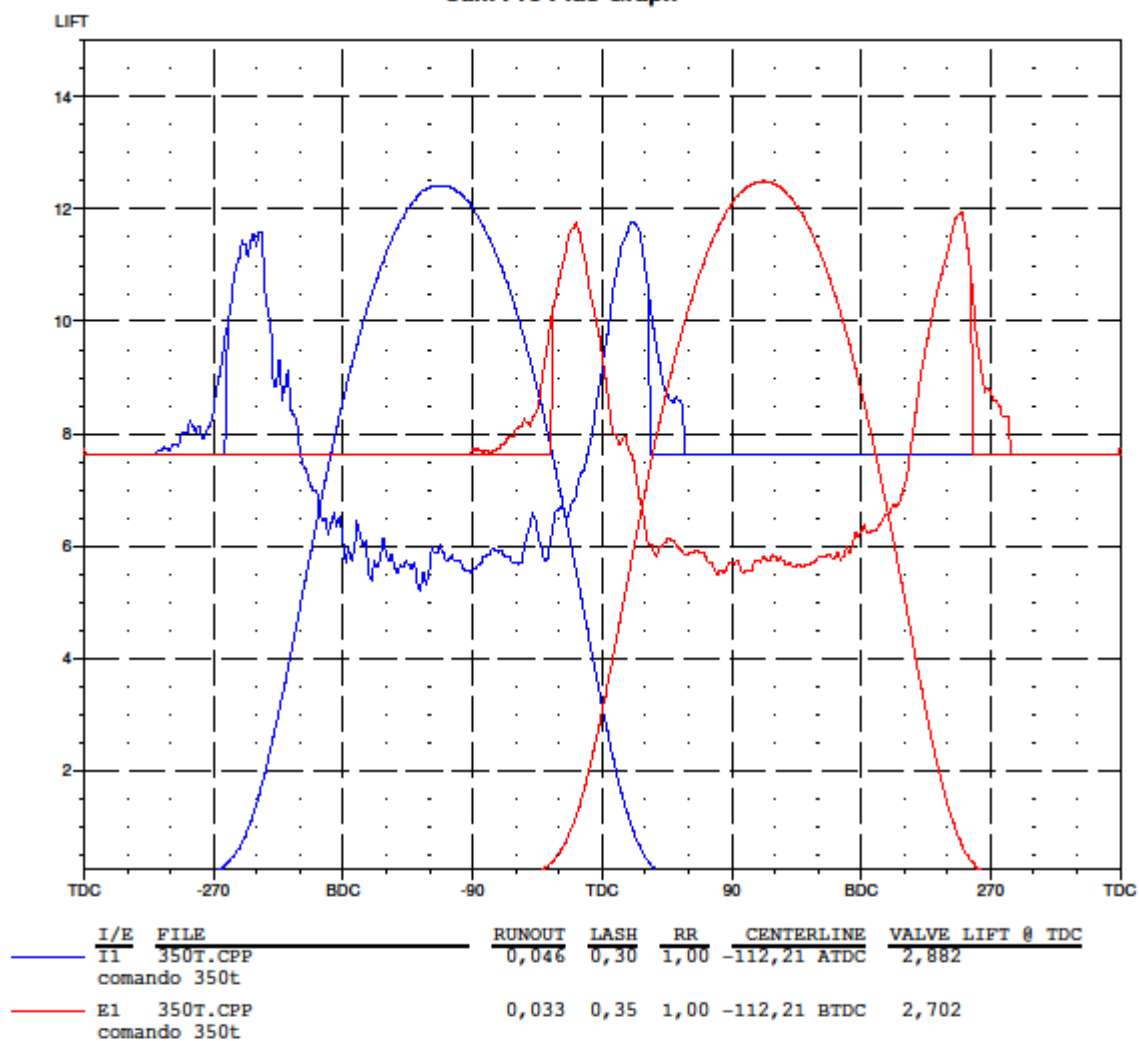

CHECK - LIST VALVULAS

	Responsável Téc.: Anderson
Material: Inox Nacional	Quantidade: 04
Trovas: () 3 Trovas (X) 1 Trova	Corridade: (x) Sim () Não

GT

CARRISTOS

	Responsável Téc.: Anderson
Material: Inox Nacional	Quantidade: 04
Trovas: () 3 Trovas (X) 1 Trova	Corridade: (x) Sim () Não

GT

CARRISTOS



ORÇAMENTO



STUMPF
Tel/Fax: (45)99948-0123
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 13/01/2026

ORÇAMENTO

Nº 23.355

O.S.: 449.465.157.129

Cliente: BRUNO CALEBE

CPF/CNPJ:

Fone: (027)99780-07 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.939	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE	4,0 UN
1.944	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO	4,0 UN
1.084	GUIA 8MM	8,0 UN
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	16,0 UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.159	PLAINA FACE	1,0 SE
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0 MO
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0 UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0 SE
1.111	MOLA LONGA	8,0 UN
1.049	CASCO AP ZERO	1,0 UN
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0 UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
2.211	TUCHO 35MM	8,0 UN
1.468	COMANDO NACIONAL- 350T	1,0 UN
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA- REFORÇO GALERIA	1,0 SE
2.656	JUNTA ADMISSAO AP 8V UNILATERAL	1,0 UN
2.554	KIT INSTALACAO	1,0 4

