



CLEBER BALTAZAR

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	CLEBER BAL	100,7	73,4
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL ASPIRADO DE RUA - TESTE DE ADMISSÃO A 10".				
2	STUMPF CABEÇOTE	CLEBER BAL	70,5	53,0
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL ASPIRADO DE RUA - TESTE DE ESCAPE A 10".				

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	27,5	18,0
4,00	49,9	35,3
6,00	67,4	50,8
8,00	80,8	60,6
10,00	90,0	67,2
12,00	97,6	68,8
14,00	100,7	70,5
Average:	73,4	53,0



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

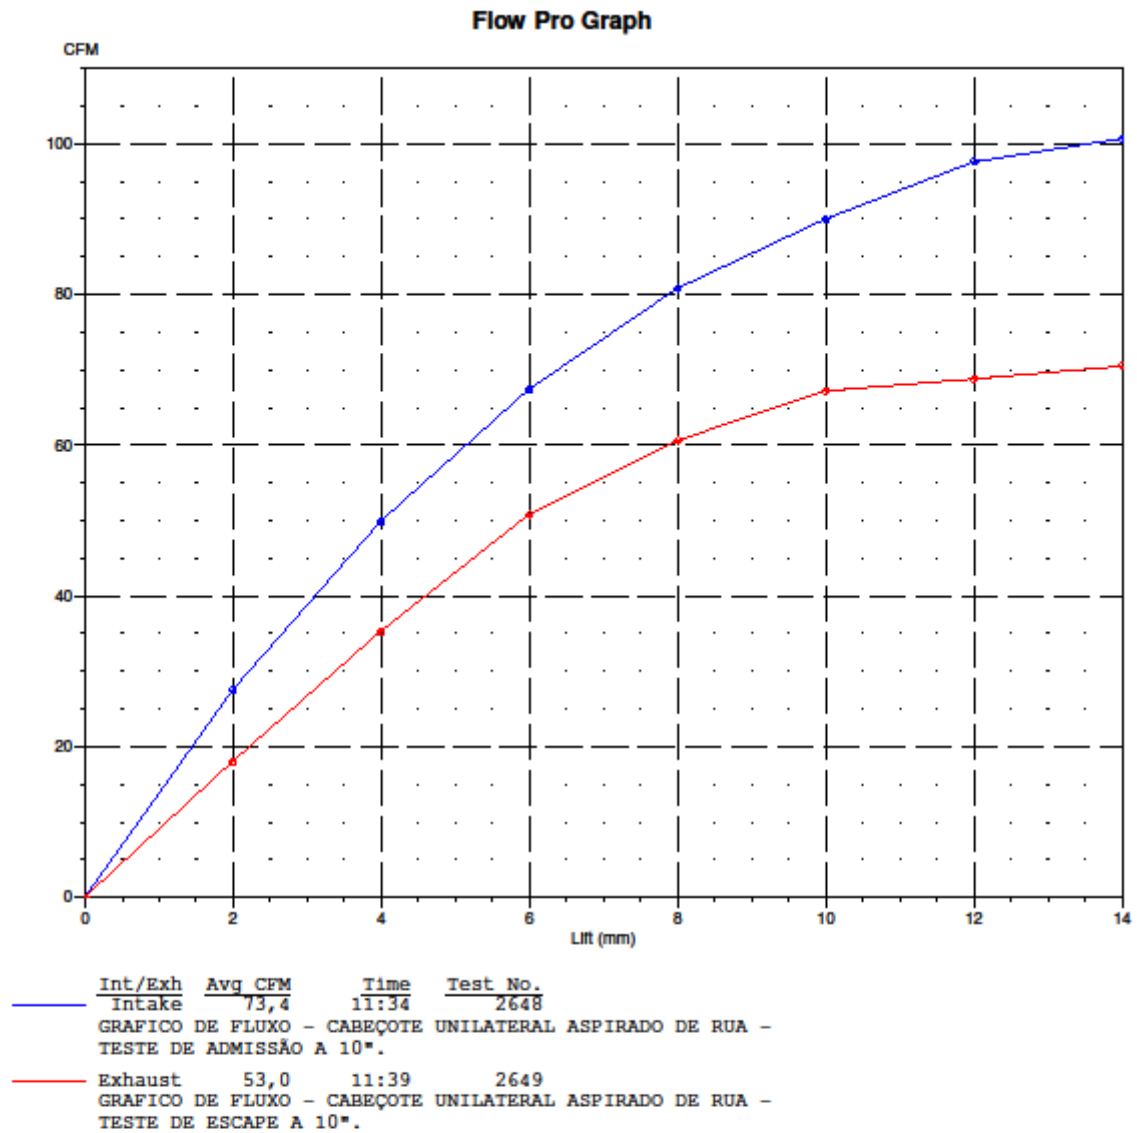


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL ASPIRADO DE RUA - CLEBER BALTAZAR.



CHECK LIST

CLIENTE: CLEBER BALTAZAR – O.S 13344

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	80/215	80/215	80/215	80/215	-	-	-	-
ESC	80/215	80/215	80/215	80/215	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 31,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 10/04/2023

ORÇAMENTO

Nº 13.344

O.S.: 4.444.766

Cliente: CLEBER BALTAZAR DA SILVA

CPF/CNPJ: 000.673.206-27

Fone: (031)99672-331 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.090	GUIA 7MM STD	8,0 UN
1.050	CASCO FLEX	1,0 UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0 SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0 SE
1.277	PRISIONEIRO DA TAMPA DE VALVULA	8,0 UN
1.276	PRISIONEIRO DE ESCAPE	8,0 UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0 UN
1.166	REBAIXAR CABECOTE AP	1,0 SE
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0 SE
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	4,0 UN
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0 UN
1.458	MAO DE OBRA RETRABALHO 8V	1,0 MO
1.919	ACABAMENTO DIMPLE - 8V	1,0 SE
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0 MO
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.289	PORCA	8,0 UN

