



ALEJO GRAZIANO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	ALEJO GRAZ	240,3	180,9
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V - TESTE DE ADMISSÃO À 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	ALEJO GRAZ	217,5	157,0
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V - TESTE ESCAPE À 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	78,1	65,6
4,00	139,4	113,1
6,00	180,6	149,1
8,00	215,6	188,5
10,00	231,4	208,5
12,00	240,3	217,5
Average:	180,9	157,0



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

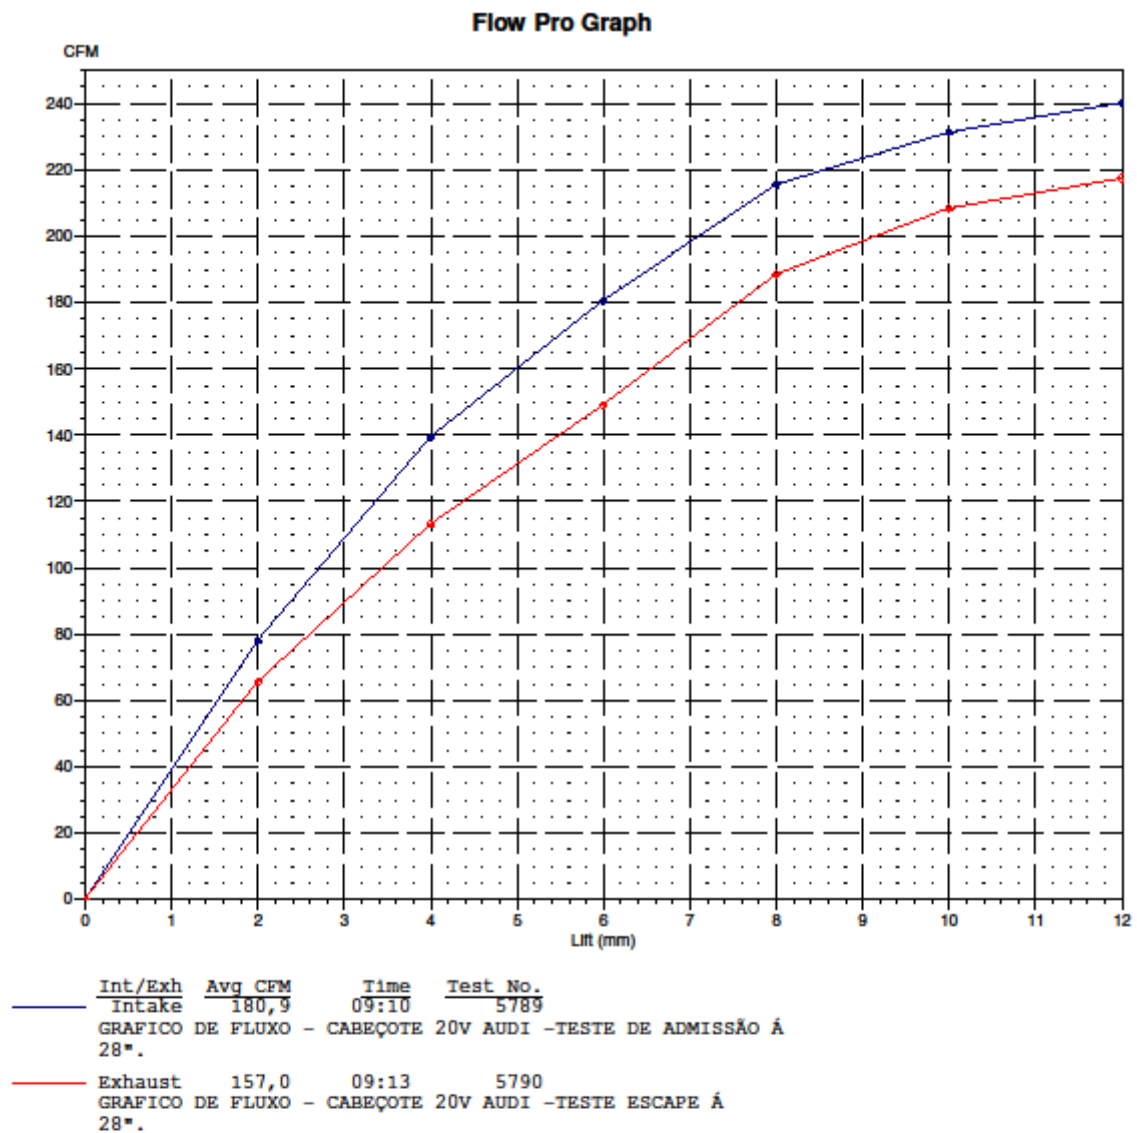


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE Á 28".



CHECK LIST

 Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR (45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123 cabecotesstumpf@gmail.com												
CHECK LIST												
CLIENTE : ALEJO GRAZIANO - O.S 20598												
VISTORIA : RONALDO												
FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	X	X	X	X
CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150
ESC	108/210	108/210	108/210	108/210	108/210	108/210	108/210	108/210	X	X	X	X
VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
OBS: VEDAÇÃO OK						VOLUME CÂMARA: 42,8 CC						



ORÇAMENTO

	STUMPF		
	Tel/Fax: (45)99948-0123		
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR		
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194	
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com			

Data: 29/04/2025

ORÇAMENTO

Nº

20.598

O.S.:

Cliente: ALEJO GRAZIANO			
CPF/CNPJ:	Fone:	Fone 2:	
Endereço:			
Veículo:		Placa:	

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN			
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.161	PLAINA FACE	1,0	SE			
1.608	PLAINA LATERAL 20V	2,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.727	VALVULA DE INOX NACIONAL	8,0	UN			
1.024	VALVULA DE INOX NACIONAL	12,0	UN			
1.090	GUIA 7MM STD	20,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	20,0	SE			
1.836	REABRIR PRATO DE MOLAS	20,0	SE			
1.514	TRAVA DE VALVULA 7MM	40,0	UN			
1.477	SERVICO GERAL. ELIMINAR TENSOR	1,0	UN			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN			
1.215	MAO DE OBRA RETRABALHO 20V	1,0	MO			
2.349		1,0	UN			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	4,0	UN			
1.149	VEDADOR 7MM	20,0	UN			
1.921	ACABAMENTO DIMPLE - 20V	1,0	SE	1.984,50	1.984,50	1.984,50

