




ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

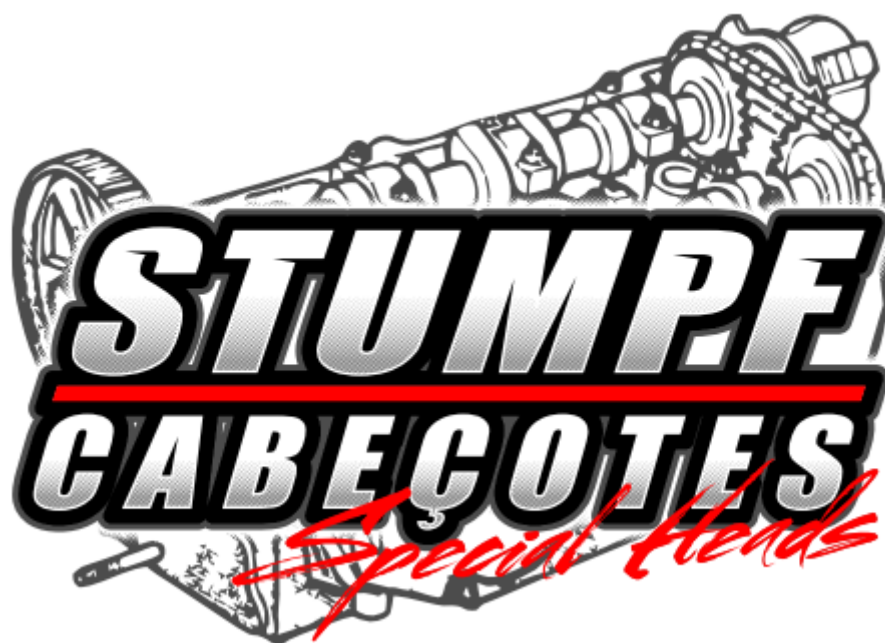

SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO DE REVISÃO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA – OS 10877

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	62/175	62/175	62/175	62/175	62/175	62/175	62/175	62/175
ESC	62/175	62/175	62/175	62/175	62/175	62/175	62/175	62/175

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 39,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 09/05/2022	<u>ORÇAMENTO</u>	Nº	10.877
		O.S.:	4.519

Cliente: ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA	
CPF/CNPJ: 18220841827	Fone: (011)94719-051 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.148	VEDADOR 6MM	16,0 UN
1.915	GUIA 6MM STD - 12.725.010	16,0 UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	2,0 UN
1.147	SEDE DE ACO	4,0 UN
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0 SE
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	8,0 UN
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	1,0 UN
1.165	Plaina Face	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0 SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0 SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0 MO
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0 UN
1.659	SERVICO DE SOLDA- MANCAL DO CABEÇOTE E CASTELO -	1,0 SE
1.715	AJUSTE DE MANCAL	2,0 SE
1.615	RETRABALHO CAMARA CNC	4,0 MO
1.536	JATO DE AREIA	1,0 SE

