



ANA LUCIA MERÇONI



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Report

Pg 1

Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
STUMPF CABEÇOTE	STUMPF CAB	232,1	171,0
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			

Lift	CCFM
2,00	57,0
4,00	112,4
6,00	156,9
8,00	187,2
10,00	221,4
12,00	230,1
14,00	232,1
Average:	171,0



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

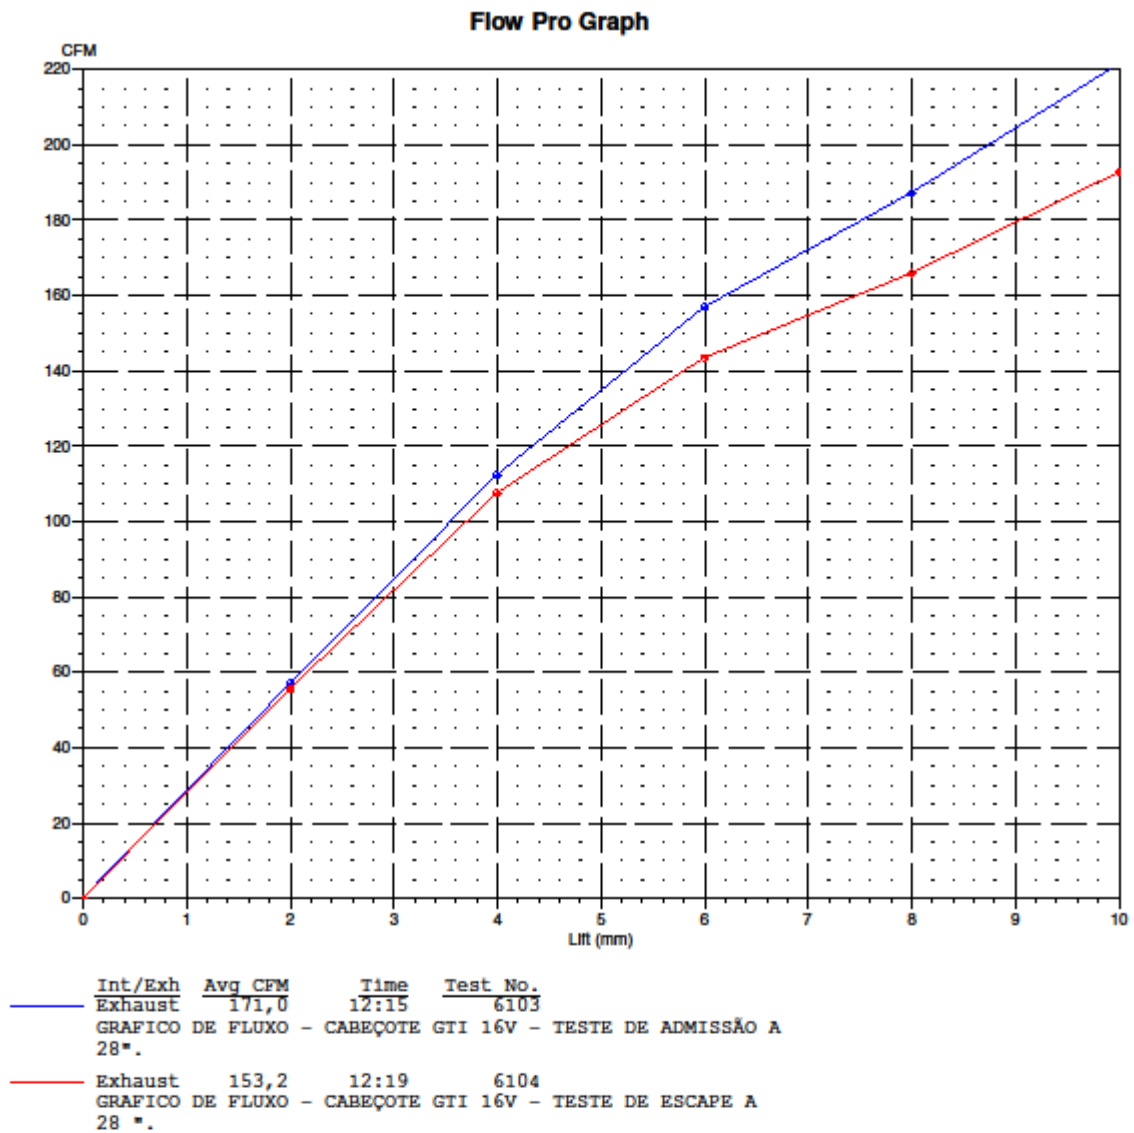


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V



CHECK LIST

CLIENTE: ANA LUCIA MERÇONI
VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	30	30	30	30	-	-	-	-
ESC	35	35	35	35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	120/210	120/210	120/210	120/210	-	-	-	-
ESC	120/210	120/210	120/210	120/210	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

OBS>	53 CC
----------------	--------------



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCATEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 31/10/2025

ORÇAMENTO

Nº

22.722

O.S.:

Cliente: ANA LUCIA MERÇONI

CPF/CNPJ: 12728841/0001-07

Fone: (055)99130-09/ Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA- TRINCADO DUTO 2º E 4º CIL - ESC	1,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.659	SERVICO DE SOLDA- MAIS ACABAMENTO - DUTO 2º E 4º	1,0	SE
	CIL ESC - ROSCA DA VELA 1º CIL		
1.690	REFAZER ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.146	SEDE DE BERILIO- ESC - 1º CIL - ESC	1,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	1,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	1,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0	SE
2.137	RETENTOR DO COMANDO- GTI	1,0	UN
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0	MO
1.259	MANDRILHAR MANCAIS 16V	1,0	SE

