



CARLOS AMBONI

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	CARLOS AMB	231,0	170,3	
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE C20XE TURBO DE RUA - STAGE 3 - TESTE DE ADMISSÃO A 28".					
2	STUMPF CABEÇOTE	CARLOS AMB	195,1	141,1	
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE C20XE TURBO DE RUA - STAGE 3 - TESTE DE ESCAPE A 28".					
Lift	CCFM No. 1	No. 2			
2,00	69,5	57,9			
4,00	119,3	99,0			
6,00	154,7	129,7			
8,00	183,8	148,6			
10,00	208,5	169,8			
12,00	225,2	187,4			
14,00	231,0	195,1			
Average:	170,3	141,1			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

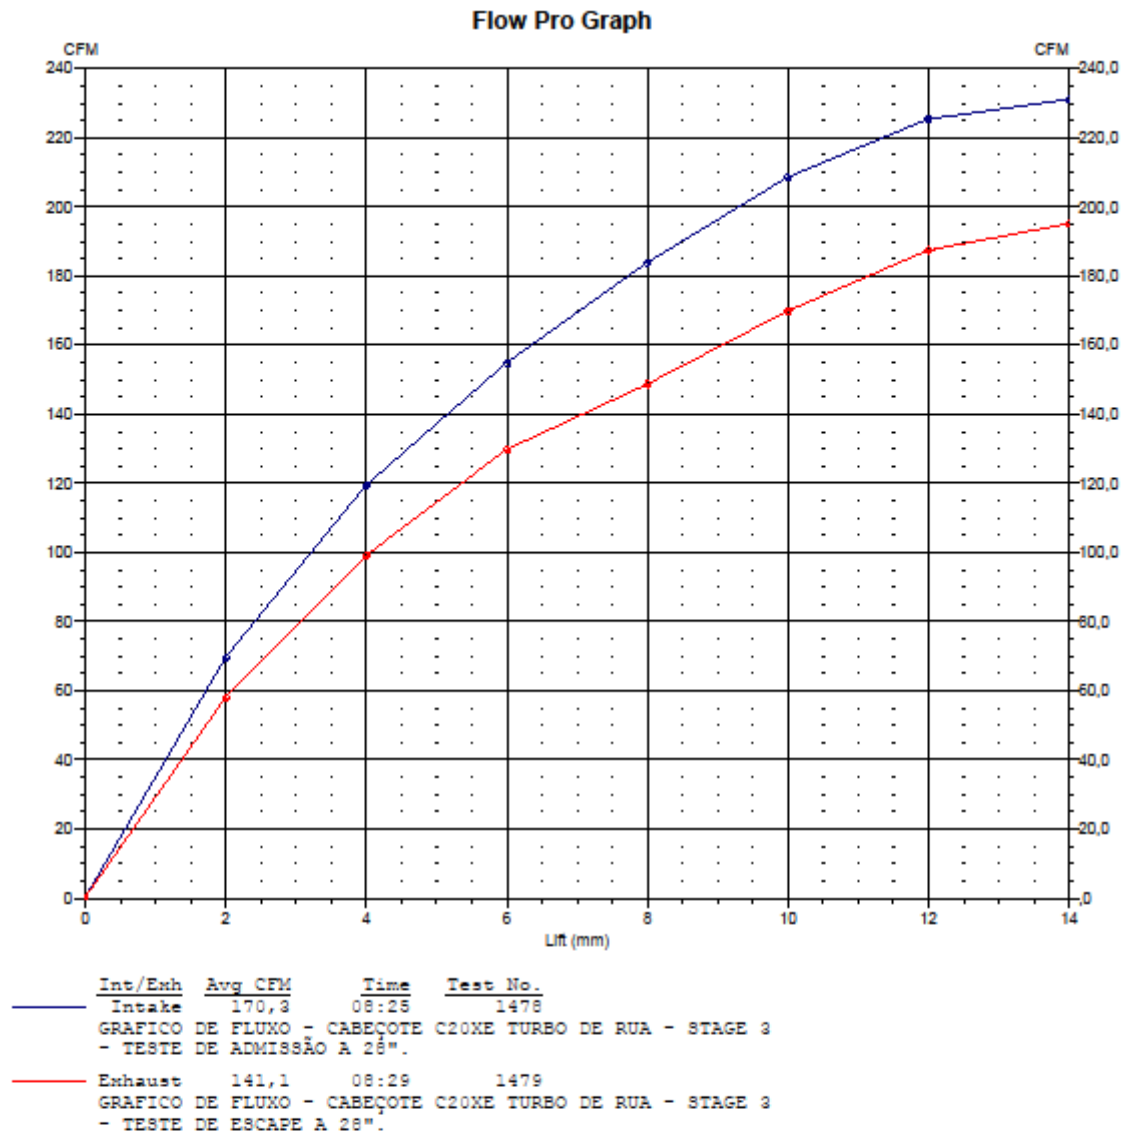


GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE C20XE TURBO DE RUA - STAGE 3 - CARLOS AMBONI.



CHECK LIST

CLIENTE: CARLOS AMBONI
VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	80/210	80/210	80/210	80/210	80/210	80/210	80/210	80/210
ESC	80/210	80/210	80/210	80/210	80/210	80/210	80/210	80/210

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 32,4 CC
-------------	-------------------	-------------------------------



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 10/06/2022

ORÇAMENTO

Nº 11.181

O.S.: 44.455.713

Cliente: **CARLOS AMBONI**

CPF/CNPJ: 388.556.439-88

Fone: (064)99975-751 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.631	MOLA RACING LONGA	16,0 PC
1.282	RETENTOR DO COMANDO	2,0 UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0 SE
1.492	CASCO C20XE	1,0 UN
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	8,0 UN
1.002	VALVULA DE INOX NACIONAL ADM	8,0 UN
1.084	GUIA 8MM	8,0 UN
1.514	TRAVA DE VALVULA 7MM	16,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0 UN
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	1,0 UN
1.947	CALCO DE ACO 0,5MM	32,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.165	PLAINA FACE	1,0 SE
1.185	PLAINA LATERAL	2,0 SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0 MO
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0 SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE

