



CARLOS AUGUSTO PROTTI

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report				Pg 1	
------------------------------	--	--	--	------	--

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	CARLOS AUG	153,0	113,9
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TURBO DE RUA/PISTA - TESDE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	CARLOS AUG	118,0	90,2
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TURBO DE RUA/PISTA - TESDE DE ESCAPE A 28".				

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	39,7	28,8
4,00	74,3	64,6
6,00	109,8	87,9
8,00	130,1	103,9
10,00	141,8	112,3
12,00	148,8	115,7
14,00	153,0	118,0
Average:	113,9	90,2



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

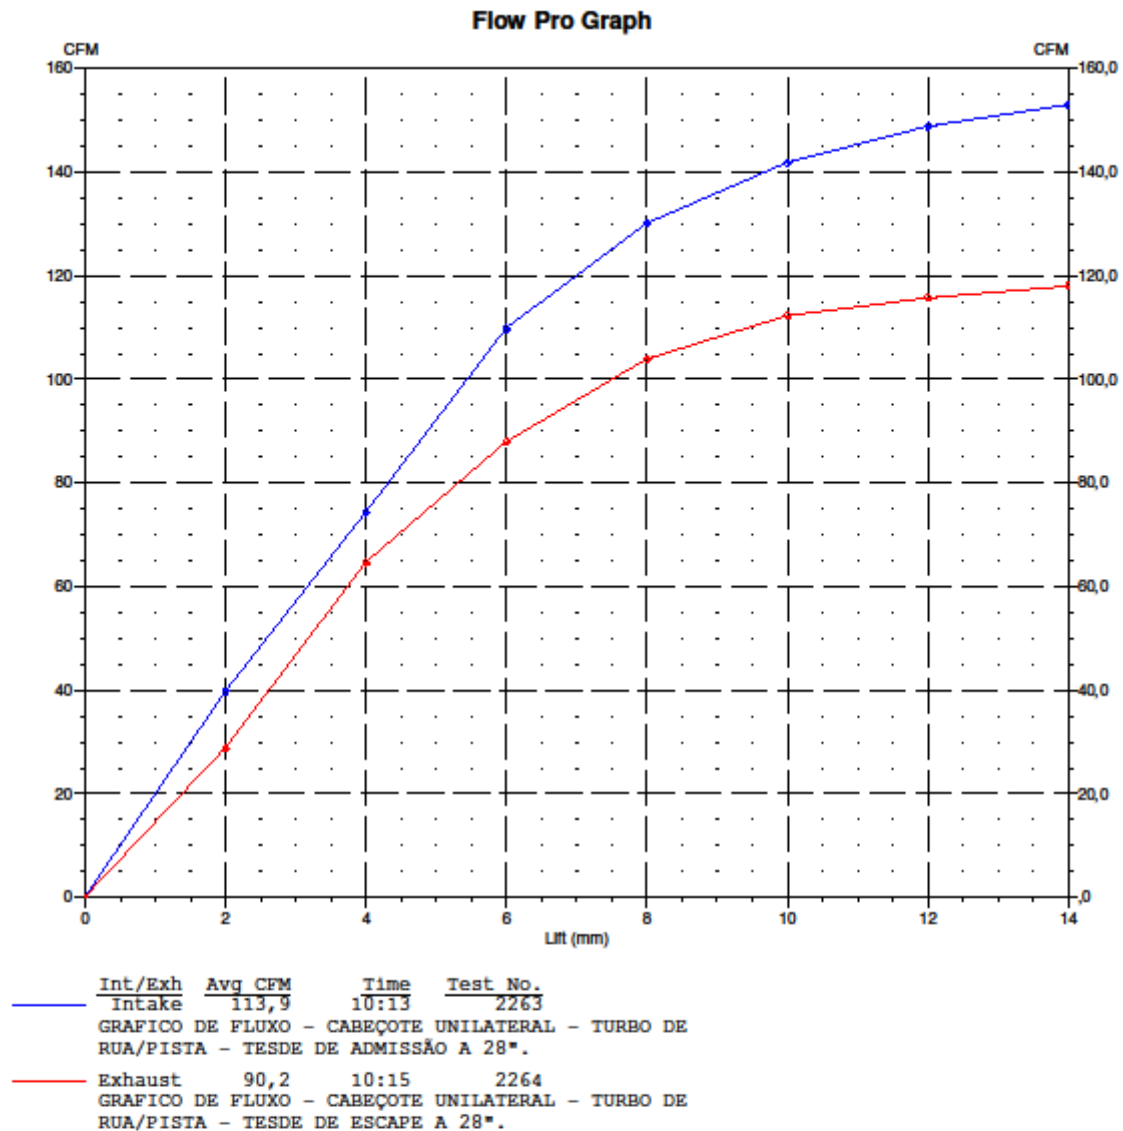


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TURBO DE RUA/PISTA - CARLOS AUGUSTO.



CHECK LIST

CLIENTE: CARLOS AUGUSTO PROTTI – O.S 12876

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-
ESC	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	100/205	100/205	100/205	100/205	-	-	-	-
ESC	100/205	100/205	100/205	100/205	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 31,8 CC



ORÇAMENTO



STUMPF
Tel/Fax: (45)99948-0123
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 30/01/2023

ORÇAMENTO

Nº 12.876

O.S.: 44.456.472

Cliente: CARLOS AUGUSTO PROTTI

CPF/CNPJ: 050.903.489-80

Fone: (045)9947-8191 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário
1.002	VALVULA DE INOX NACIONAL ADM	4,0	UN	85,65
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	4,0	UN	85,65
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN	22,32
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	8,0	UN	26,75
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN	9,00
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN	77,54
1.869	MOLA INTERMEDIARIA	8,0	PC	88,00
1.117	TUCHO 35,3MM	8,0	UN	88,00
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN	12,06
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN	27,50
1.289	PORCA	10,0	UN	1,65
1.286	ALUMINIO PARA SUPORTE DE GUIA	4,0	UN	16,50
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE	37,45
1.159	PLAINA FACE	1,0	SE	112,34
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0	MO	2.889,97
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE	42,80
1.179	PLAINA LATERAL	1,0	SE	112,34
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE	128,35
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0	MO	0,00
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE	198,00

