



CARLOS EDUARDO NASCIMENTO REPARACAO ME

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	CARLOS EDU	148,0	111,9
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI SV UNILATERAL - STREET - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	CARLOS EDU	113,7	88,5
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI SV UNILATERAL - STREET - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	38,7	27,8
4,00	73,4	63,6
6,00	108,7	86,8
8,00	129,1	102,8
10,00	140,1	111,3
12,00	145,1	113,2
14,00	148,0	113,7
Average:	111,9	88,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

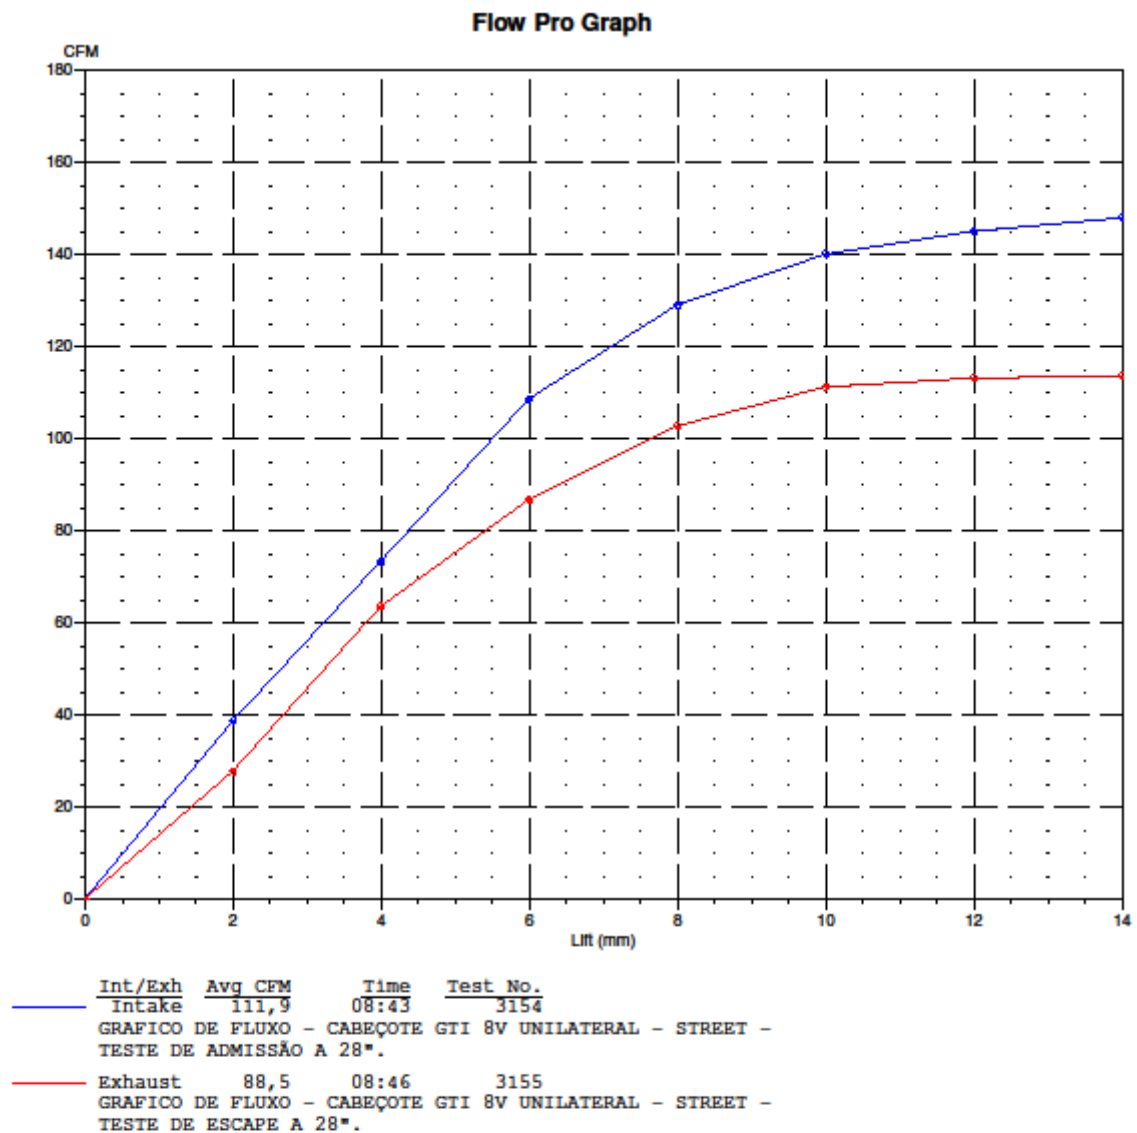


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 8V UNILATERAL - STREET - CARLOS EDUARDO NASCIMENTO.



CHECK LIST

CLIENTE: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO REPARACAO ME – O.S 14285

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	80/185	80/185	80/185	80/185	-	-	-	-
ESC	80/185	80/185	80/185	80/185	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 33,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 20/07/2023

ORÇAMENTO

Nº 14.285

O.S.:

Cliente: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO REPARACAO ME

CPF/CNPJ: 07083483000141

Fone: (019)97403-87 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
1.159	PLAINA FACE	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN
1.869	MOLA INTERMEDIARIA	8,0	PC
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	4,0	UN
1.002	VALVULA DE INOX NACIONAL ADM	4,0	UN
1.458	MAO DE OBRA RETRABALHO 8V	1,0	MO
1.130	TUCHO 35MM 15,5MM	8,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0	SE
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0	MO
1.439	SELO D'AGUA AP	1,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.270	BUCHA DE REFORÇO DO ESCAPE	2,0	UN
1.271	CALÇO DE MOLA EM AÇO	8,0	UN
1.844	COMANDO- CARBURADO	1,0	UN

