



CLAUDIO MARCELO GONÇALVES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro	Pg 1
------------------------------------	------

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	From CFM
1	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE TURBO DE RUA/PISTA UNILATERAL - STAGE 3 - TESTE DE ADMISSÃO À 28".	CLAUDIO MARCELO GONÇALVES	156,0	110,1
2	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE TURBO DE RUA/PISTA UNILATERAL - STAGE 3 - TESTE DE ESCAPE A 28".	CLAUDIO MARCELO GONÇALVES	127,0	88,8

Azada	CCFM No. 1	No. 2
2,00	38,2	30,6
4,00	69,8	54,1
6,00	96,7	74,2
8,00	120,1	95,8
10,00	140,0	116,4
12,00	149,8	123,3
14,00	156,0	127,0
Average:	110,1	88,8

DADOS DE FLUXO - CABEÇOTE 20V TURBO DE RUA - TOP - RICARDO ANTONIO WEIGEL BORBA.



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

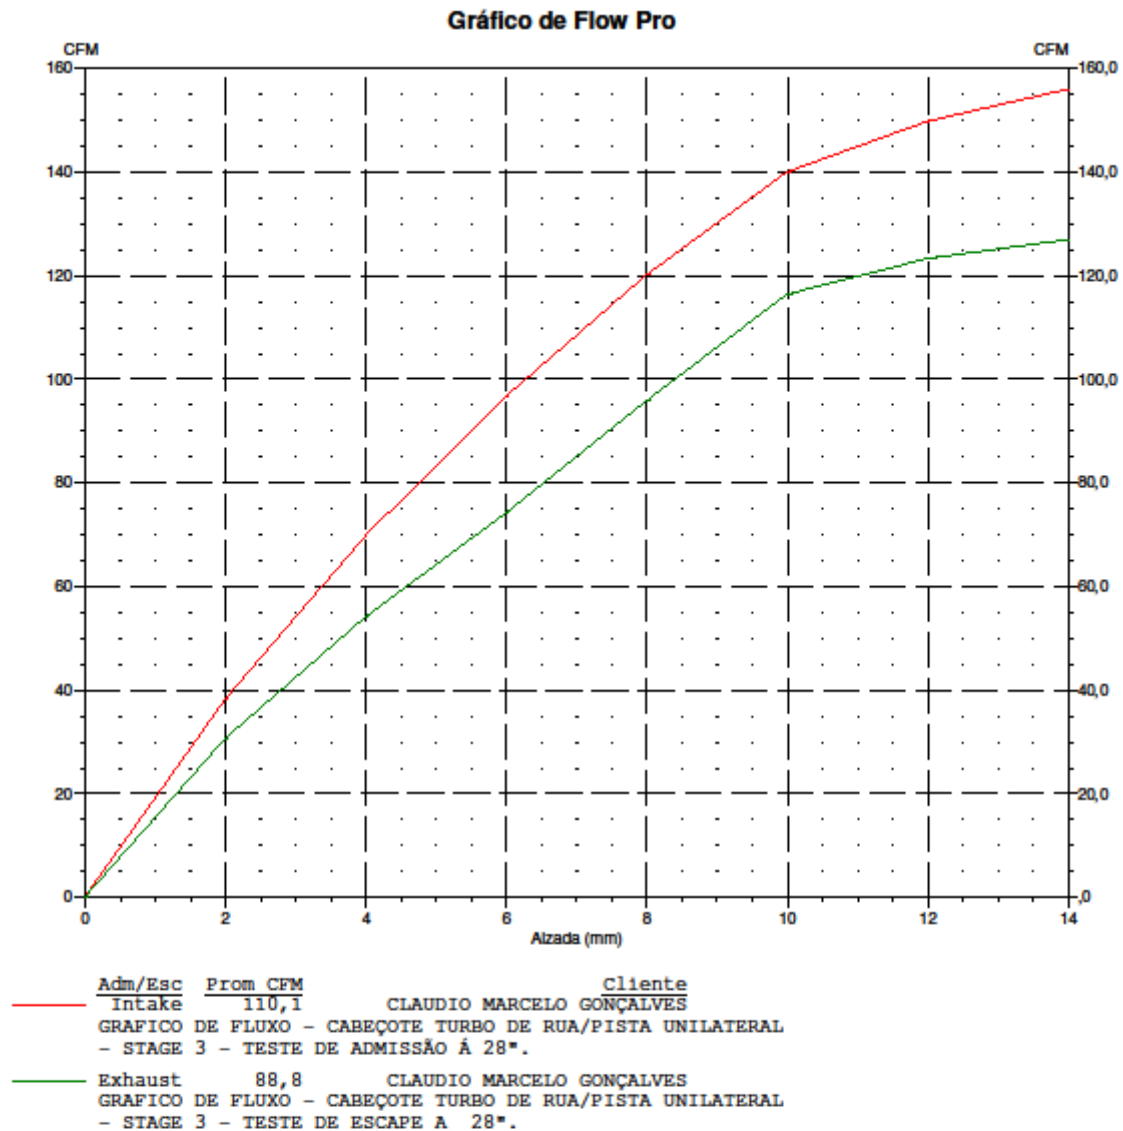


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE TURNO DE RUA/PISTA UNILATERAL - STAGE 3 - CLAUDIO MARCELO GONÇALVES.



CHECK LIST

CLIENTE: CLAUDIO MARCELO GONÇALVES – OS 9669

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	110/207	110/207	110/207	110/207	-	-	-	-
ESC	110/207	110/207	110/207	110/207	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 37,2 CC



ORÇAMENTO

STUMPF	
Tel/Fax: (45)99948-0123	
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 03/02/2021	<u>ORÇAMENTO</u>	Nº	9.669
		O.S.:	2.022

Cliente: CLAUDIO MARCELO GONÇALVES	
CPF/CNPJ: 112.281.608-24	Fone: (011)94753-574 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.147	SEDE DE ACO	8,0 UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.084	GUIA 8MM	8,0 UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0 UN
1.270	BUCHA DE REFORÇO DO ESCAPE	2,0 SE
1.048	CASCO AP	1,0 UN
1.002	VALVULA DE INOX NACIONAL ADM	4,0 UN
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	4,0 UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.159	Plaina Face	1,0 SE
1.187	Substituir Sede	8,0 SE
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0 MO
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0 MO

