



**CRISTIAN MATTIVE**

**ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO**



## SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28” .....	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28” .....	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO .....	5
4. ORÇAMENTO.....	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO REVISAO 13/06/20025 .....	7
6. ORÇAMENTO REVISÃO .....	8





## TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"


FLOW PRO Compare Data Report	Pg 1
------------------------------	------

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABECOTE	CHRISTIAN	156,8	120,6
	TESTE ADM CABECOTE NOVO SEDE DE BERILIO 28"			
2	STUMPF CABECOTE	CHRISTIAN	104,7	75,8
	TESTE ESC CABECOTE NOVO SEDE BERILIO 28"			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	44,6	20,6
4,00	84,1	65,1
6,00	116,9	75,4
8,00	135,2	89,5
10,00	150,0	99,2
12,00	156,7	104,7
Average:	114,6	75,8



## GRAFICOS DE FLUXO A 28"

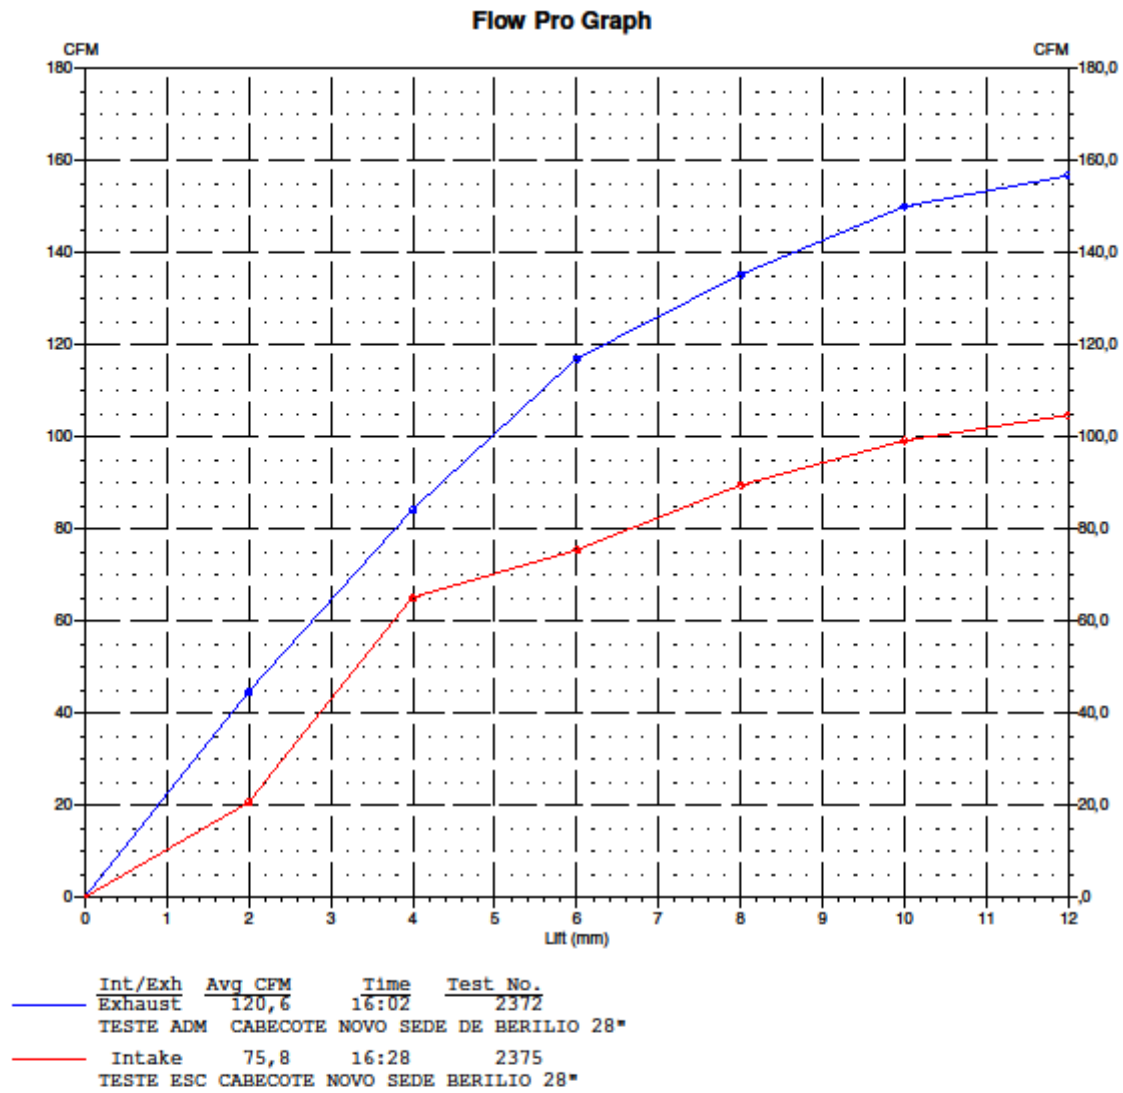

CRISTIAN MATTIVE NOVO.



## CHECK LIST

**CLIENTE:** CRISTIAN MATTIVE – O.S 12732

**VISTORIA:** OSNI

FOLGA VÁLVAS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	100/255	100/255	100/255	100/255	-	-	-	-
ESC	100/255	100/255	100/255	100/255	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

**OBS:**      VEDAÇÃO OK

**VOLUME CAMARA:** 29,4 CC



## ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 06/01/2023

### ORÇAMENTO

Nº 12.732

O.S.: 54

Cliente: CHRISTIAN MATTIVE

CPF/CNPJ:

Fone:

Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO	8,0 UN
1.048	CASCO AP	1,0 UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0 UN
1.439	SELO D'AGUA AP	1,0 UN
1.706	POLIA EXPERT/STUMPF- 8V- AZUL	1,0 UN
2.078	TUCHO 35MM COM DLC	8,0 UN
2.143	VALVULA ADMISSAO 44MM HASTE 7MM - COM DLC	4,0 UN
2.144	VALVULA DE ESCAPE 37MM HASTE 7MM- COM DLC	4,0 UN
1.146	SEDE DE BERILIO	8,0 UN
1.869	MOLA INTERMEDIARIA	8,0 PC
1.090	GUIA 7MM STD	8,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0 UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0 MO
1.159	PLAINA FACE	1,0 SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE



## CHECK LIST REVISAO 13/06/2025

**CLIENTE:** CRISTIAN MATTIVE – O.S 20964

**VISTORIA:** VINI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	90/255	90/255	90/255	90/255	-	-	-	-
ESC	90/255	90/255	90/255	90/255	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-


**OBS:**      VEDAÇÃO OK

**VOLUME CAMARA: 29,0CC**





# ORÇAMENTO REVISÃO

	STUMPF		
	Tel/Fax: (45)99948-0123		
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR		
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194	
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com			

Data: 04/06/2025

## ORÇAMENTO

Nº

20.964

O.S.:

Cliente: CHRISTIAN MATTIVE

CPF/CNPJ:

Fone:

Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

## DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.882	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.859	SERVICO DE SOLDA. E ACABAMENTO	1,0	SE
1.192	ABRIR ALOJAMENTO DE TUCHO	8,0	SE
2.708	TUCHO 35,3MM	8,0	UN
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	2,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	8,0	UN
1.256	ADAPTAR K-LINE	8,0	SE



