



DIOGO MACHADO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	DIOGO MACH	167,8	115,9
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FUSCA - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	DIOGO MACH	129,9	90,8
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FUSCA - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	32,8	29,2
4,00	66,5	59,3
6,00	100,4	81,1
8,00	129,2	99,3
10,00	152,0	113,6
12,00	162,3	123,0
14,00	167,8	129,9
Average:	115,9	90,8



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

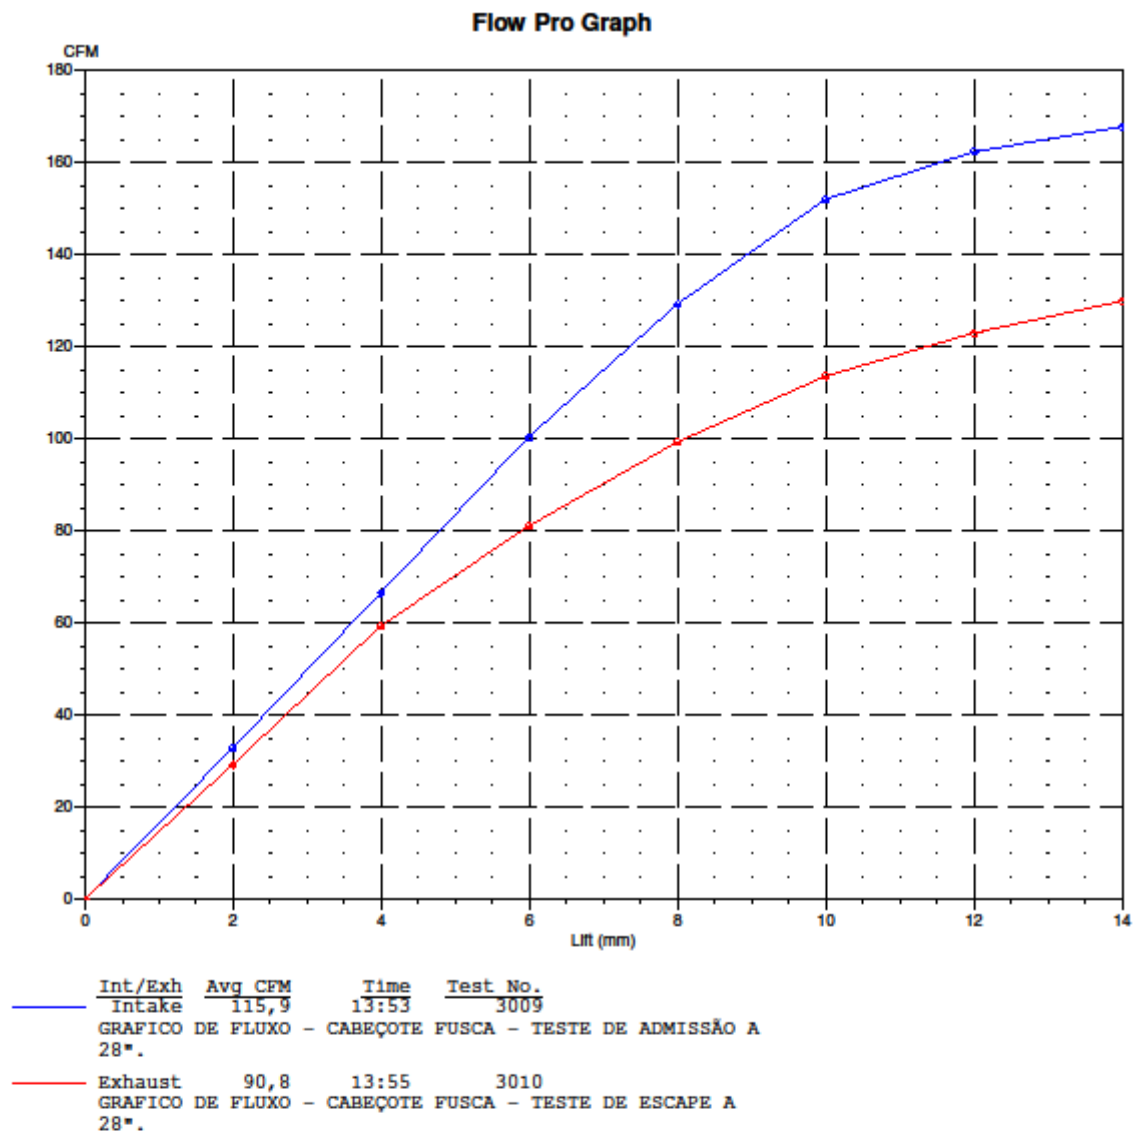


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FUSCA - DIOGO MACHAD.



CHECK LIST

CLIENTE: DIOGO MACHADO – O.S 13197

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	100/180	100/180	100/180	100/180	-	-	-	-
ESC	100/180	100/180	100/180	100/180	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 40,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194 E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 21/03/2023 **ORÇAMENTO** N° 13.197
O.S.: 44.456.678

Cliente: DIOGO MACHADO	
CPF/CNPJ:	Fone: Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.226	MAO DE OBRA RETRABALHO FUSCA	2,0	MO			
1.601	PLAINA FACE FUSCA	2,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN			
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	8,0	UN			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	2,0	SE			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN			
1.147	SEDE DE ACO	8,0	UN			
1.558	VALVULA DE FUSCA	8,0	UN			
1.997	GUIA 8MM (VW AR) - 12.146.911- 8MM + 1MM (ESCAPE)	4,0	UN			
1.084	GUIA 8MM- ADMISSÃO	4,0	UN			
1.460	SOLDA ROSCA DE VELA	3,0	SE			
1.191	REABRIR ALOJAMENTO VELA	3,0	SE			
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0	MO			
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	3,0	UN			
1.111	MOLA LONGA	8,0	UN			
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	3,0	UN			

