



DOUGLAS LUIZ RODRIGUES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	DOUGLAS LU	181,6	138,6
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MOTO TWISTER - KART CROSS - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	DOUGLAS LU	125,1	101,6
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MOTO TWISTER - KART CROSS - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	51,1	38,8
4,00	111,2	84,4
6,00	145,5	114,4
8,00	167,3	122,6
10,00	174,8	124,2
12,00	181,6	125,1
Average:	138,6	101,6



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

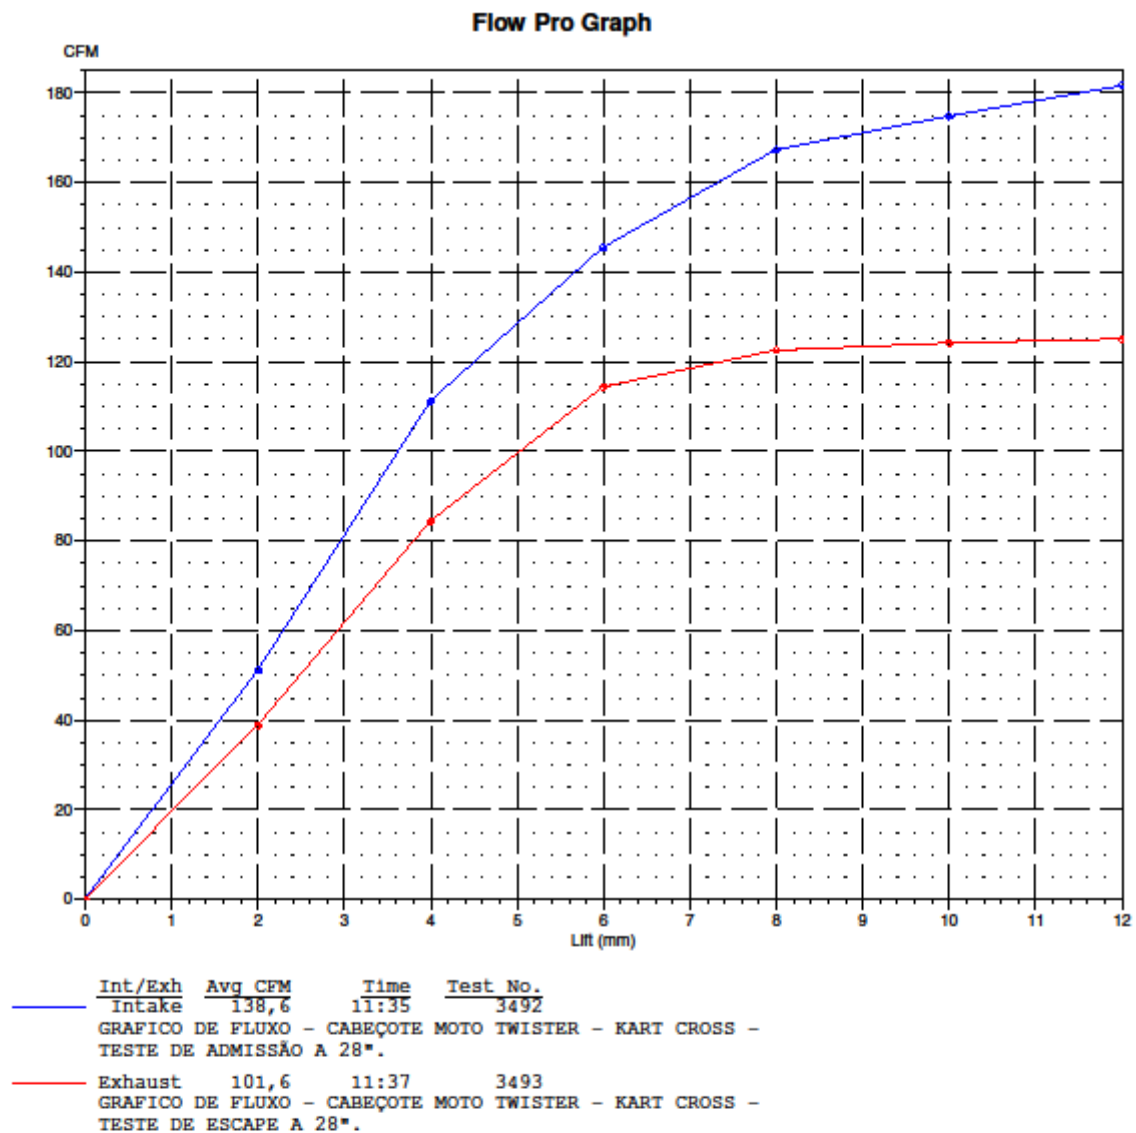


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MOTO TWISTER - KART CROSS - DOUGLAS LUIZ.



CHECK LIST

CLIENTE: DOUGLAS LUIZ RODRIGUES – O.S 14148

VISTORIA: RAFAEL

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-
ESC	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	50/100	50/100	-	-	-	-	-	-
ESC	50/100	50/100	-	-	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ESC	✓	✓	-	-	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 40,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 04/07/2023

ORÇAMENTO

Nº 14.148

O.S.: 44.457.038

Cliente: DOUGLAS LUIZ RODRIGUES

CPF/CNPJ: 066.872.939.23

Fone: (042)9823-8211 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.446	PLAINA FACE	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	4,0	SE
1.230	MAO DE OBRA RETRABALHO MOTO	1,0	MO
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0	SE
1.146	SEDE DE BERILIO	4,0	UN
1.188	RETIFICA DE VALVULA	4,0	SE
1.919	ACABAMENTO DIMPLE - 8V(MOTO TW)	1,0	SE
2.035	VEDADOR 5MM	4,0	UN
2.297	GUIA ESPECIAL BERILIO- 5MM	4,0	UN
2.345	PRATO TITANIO	4,0	UN
1.103	MOLA IMPORTADA	4,0	UN
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0	MO
1.228	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ESCAPE	1,0	MO

