



EDUARDO JUNGES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ORÇAMENTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1	
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM		
1	STUMPF CABEÇOTE	EDUARDO JU	224,2	168,7		
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - TESTE DE ADMISSÃO - A 28"					
2	STUMPF CABEÇOTE	EDUARDO JU	156,6	127,8		
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - TESTE DE ESCAPAMENTO - A 28"					
	CCFM					
Lift	No. 1	No. 2				
2,00	63,8	59,3				
4,00	124,4	111,7				
6,00	175,4	137,5				
8,00	206,0	148,0				
10,00	218,6	153,4				
12,00	224,2	156,6				
Average:	168,7	127,8				



GRAFICOS DE FLUXO A 28"



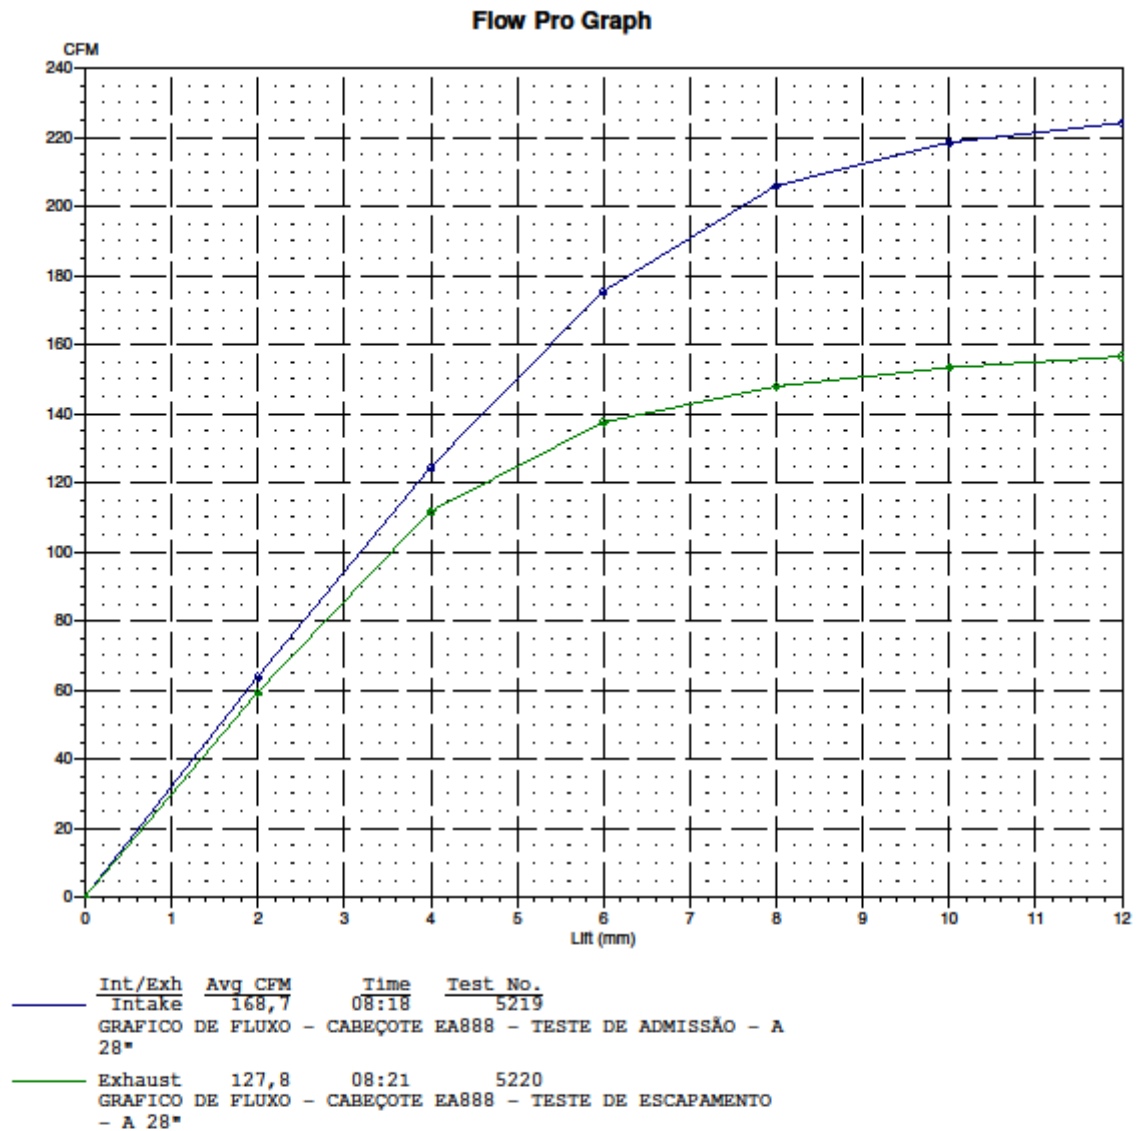


GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE EA888 - A 28"

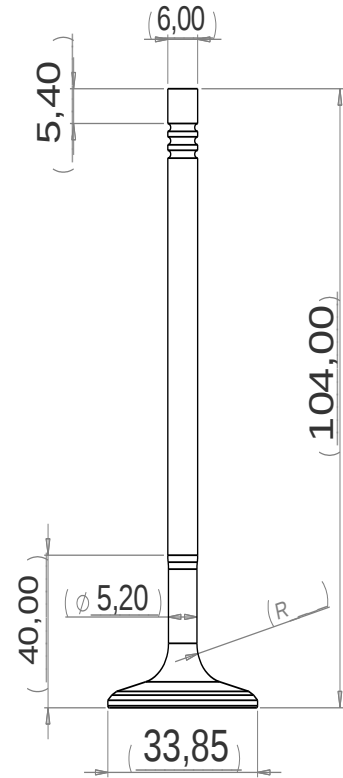

MEDIDA DAS VALVULAS

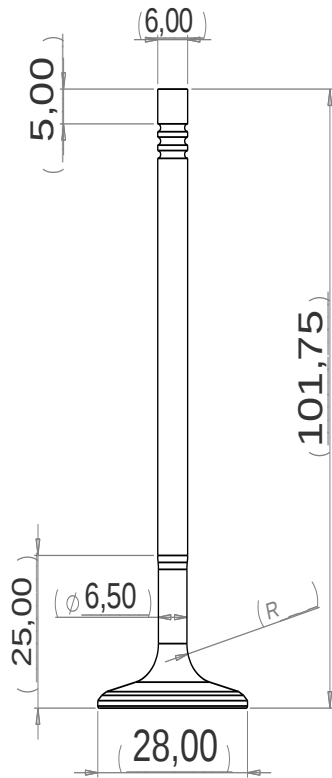

Cliente: EDUARDO JUNGES	Responsável Téc.: Anderson
Material: Inox importado	Quantidade: 8
Travas: (x) 3 Travas () 1 Trava	Cavidade: () Sim (X) Não
Programa CNC:	Data: 25/11/2024

Cliente: EDUARDO JUNGES	Responsável Téc.: Anderson
Material: Inox IMP	Quantidade: 8
Travas: () 3 Travas (X) 1 Trava	Cavidade: (X) Sim () Não
Programa CNC:	Data: 25/11/2024



CHECK LIST

CLIENTE: EDUARDO JUNGES O.S 18993

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190
ESC	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 47,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 29/10/2024 ORÇAMENTO N° 18.993
O.S.: 449.465.157.038

Cliente: EDUARDO JUNGES	
CPF/CNPJ: 98623290097	Fone: (054)9600-150! Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO			
1.148	VEDADOR 6MM	1,0	UN			
1.097	GUIA 6MM	8,0	UN			
1.185	PLAINA LATERAL	1,0	SE			
2.168	TAMPAO DE ROSCA EA888	8,0	UN			
1.659	SERVICO DE SOLDA(ELIMINAR FLAPS)	8,0	SE			
1.920	ACABAMENTO DIMPLE - 16V	1,0	SE			
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0	MO			

