



FELIPE MOREIRA BARCELLOS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report	Pg 1
------------------------------	------

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	FELIPE MOR	224,2	168,7
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - TURBO - RETRABALHADO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	FELIPE MOR	156,6	127,7
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - TURBO - RETRABALHADO - TESTE DE ESCAPE A 28".			
3	STUMPF CABEÇOTE	FELIPE MOR	152,2	108,2
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - TURBO - ORIGINAL - TESTE DE ESCAPE A 28".			
4	STUMPF CABEÇOTE	FALIFE MOR	209,7	147,9
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - TURBO - ORIGINAL - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			

	CCFM			
Lift	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
2,00	63,8	59,3	46,5	58,0
4,00	124,4	111,7	86,0	115,9
6,00	175,4	137,5	118,5	162,3
8,00	206,0	148,0	137,7	193,5
10,00	218,6	153,4	152,2	209,7
Average:	157,6	122,0	108,2	147,9



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

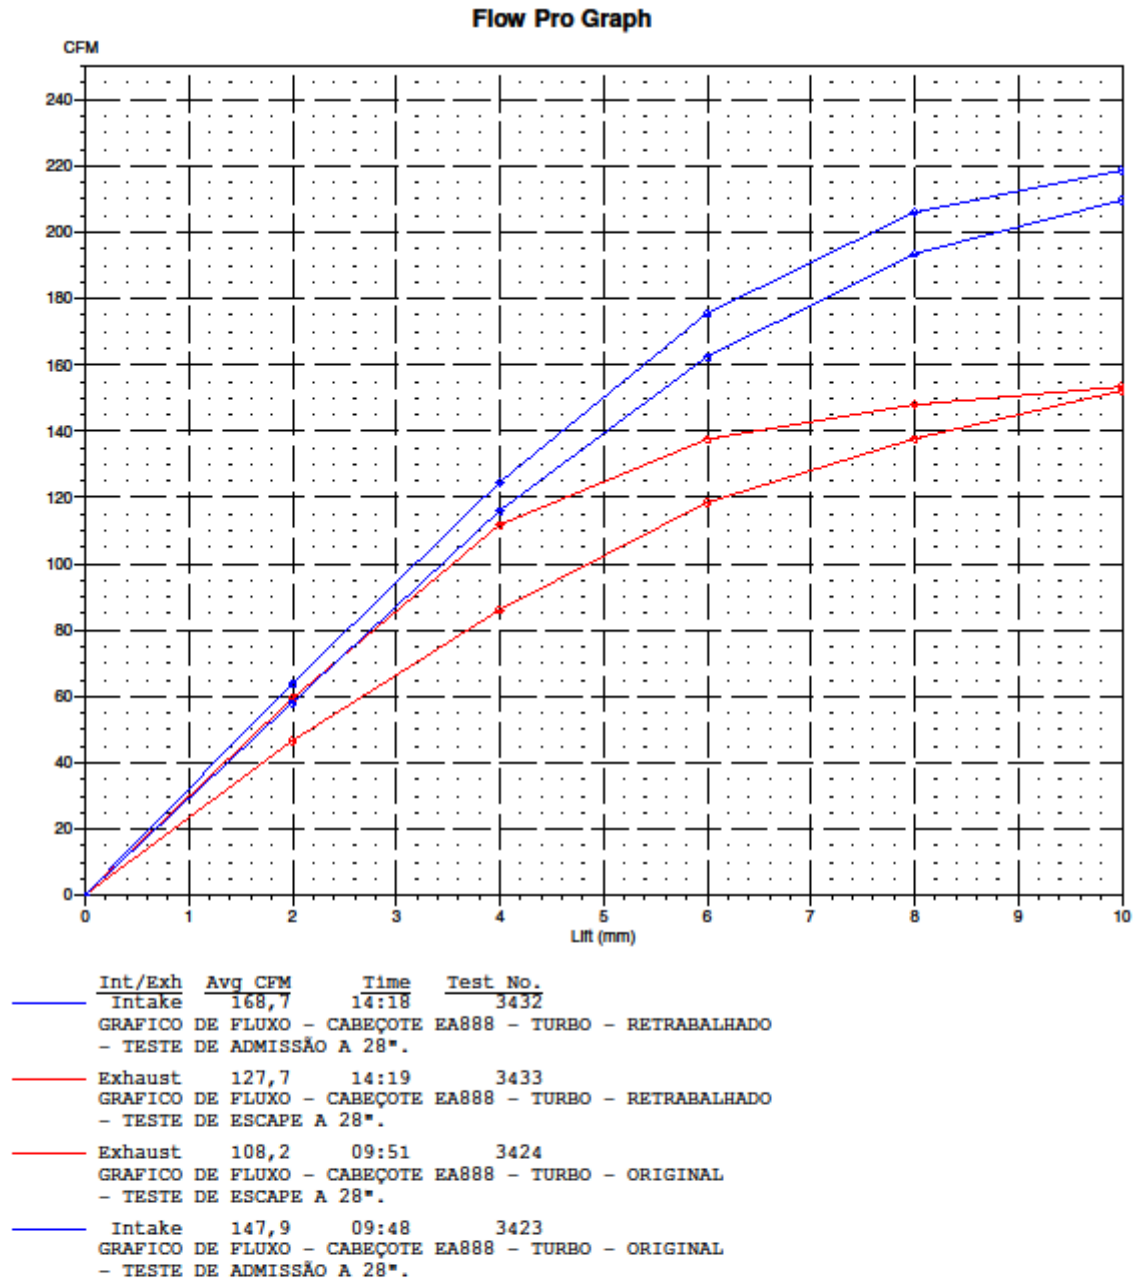


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - TURBO - FELIPE MOREIRA BARCELLOS.



CHECK LIST

CLIENTE: FELIPE MOREIRA BARCELLOS – O.S 14692

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	75/180	75/180	75/180	75/180	75/180	75/180	75/180	75/180
ESC	85/190	85/190	85/190	85/190	85/190	85/190	85/190	85/190

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 43,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 29/08/2023 ORÇAMENTO N° 14.692
O.S.: 44.457.255

Cliente: FELIPE MOREIRA BARCELLOS

CPF/CNPJ: 123.668.727-20

Fone: (021)99925-94 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.095	GUIA SOB MEDIDA 6MM	16,0	UN			
1.148	VEDADOR 6MM	16,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE			
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO			
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0	MO			
1.782	SERVICO DE FRESA- PLAINA COLETOR	1,0	SE			
1.782	SERVICO DE FRESA- FURO COLETOR	1,0	SE			
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE			

