



**FERNADO KFOURI**

**ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO**



## SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO .....	3
2. GRAFICOS DE FLUXO .....	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO .....	5
4. ORÇAMENTO.....	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 18/07/2024 .....	7
6. ORÇAMENTO REVISÃO .....	8



## TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	FERNANDO K	252,5	196,0
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 4G63 - TURBO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	FERNANDO K	219,8	174,6
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 4G63 - TURBO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	62,7	67,2
4,00	135,7	122,3
6,00	195,8	173,8
8,00	228,8	202,3
10,00	245,4	218,1
12,00	251,1	218,8
14,00	252,5	219,8
Average:	196,0	174,6



## GRAFICOS DE FLUXO A 28"

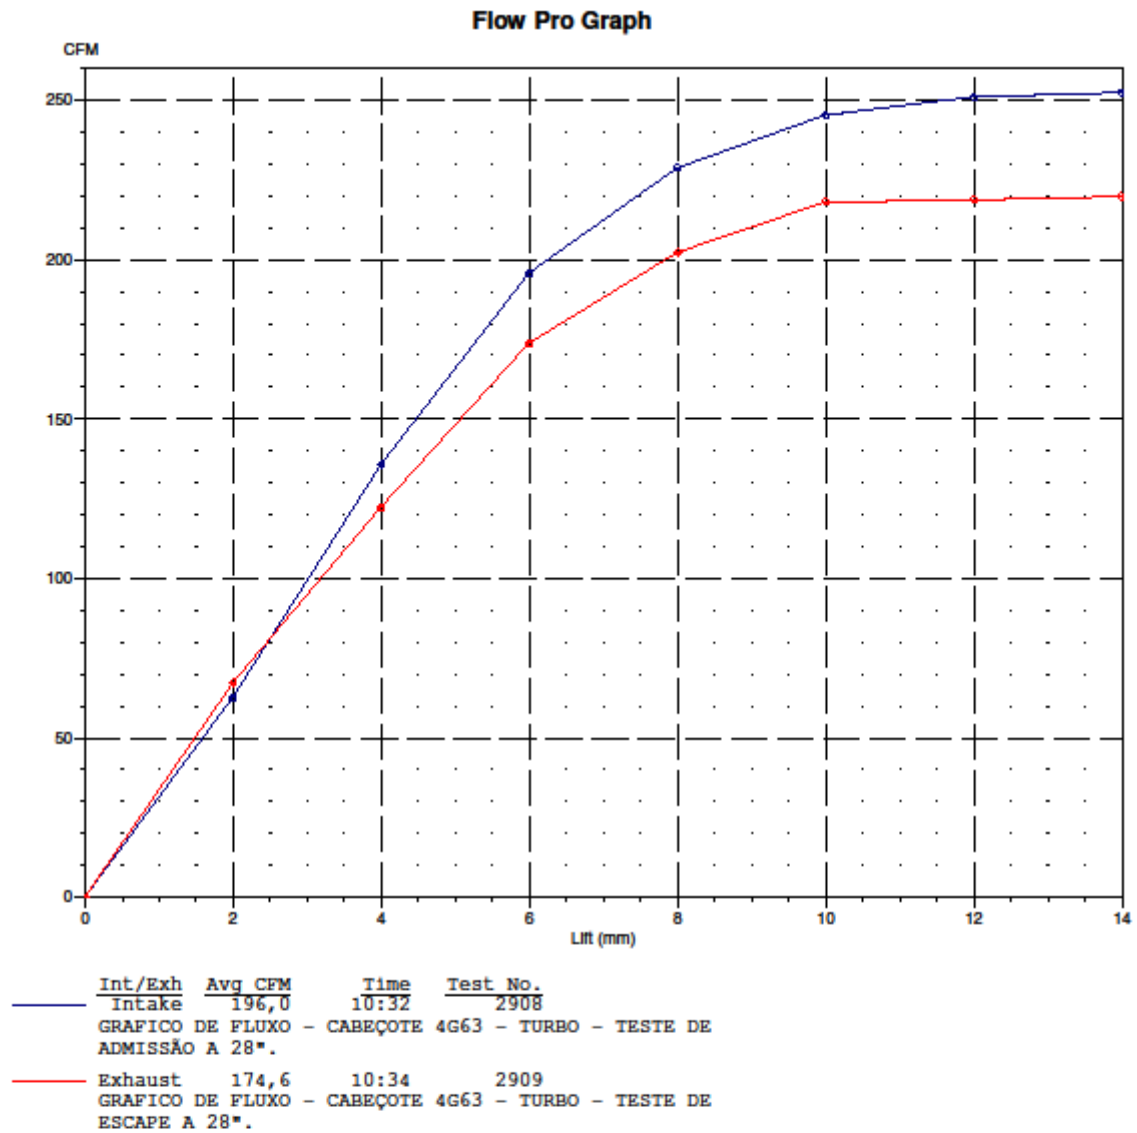


GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE 4G63 - TURBO - FERNANDO KFOURI.



## CHECK LIST

**CLIENTE:** FERNADO KFOURI – O.S 13899

**VISTORIA:** ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	80/200	80/200	80/200	80/200	80/200	80/200	80/200	80/200
ESC	80/200	80/200	80/200	80/200	80/200	80/200	80/200	80/200

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

**OBS:**      **VEDAÇÃO OK**

**VOLUME CAMARA: 47 CC**



## ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 07/06/2023

### ORÇAMENTO

Nº 13.899

O.S.: 44.455.771

Cliente: FERNADO KFOURI

CPF/CNPJ: 25823274840

Fone: (011)94035-8901 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO			
1.447	PLAINA LATERAL	2,0	SE			
1.741	SUBSTITUIR GUIA	16,0	SE			
1.920	ACABAMENTO DIMPLE - 16V	1,0	SE			
2.137	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN			
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE			
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	1,0	UN			
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	16,0	UN			
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	8,0	SE			



## CHECK LIST REVISÃO 18/07/2024

**CLIENTE:** FERNADO KFOURI – O.S 17578

**VISTORIA:** RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	78/194	78/194	78/194	78/194	78/194	78/194	78/194	78/194
ESC	78/194	78/194	78/194	78/194	78/194	78/194	78/194	78/194

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**OBS:**      **VEDAÇÃO OK**

**VOLUME CAMARA: 46,2 CC**



## ORÇAMENTO REVISÃO 18/07/2024

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 20/06/2024      ORÇAMENTO      N°      17.578  
O.S.:      44.465.156.977

Cliente: FERNANDO KFOURI	
CPF/CNPJ: 25823274840	Fone: (011)94035-8901 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.659	SERVICO DE SOLDA. DUTO ESC 1" CIL	1,0	SE			
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE			
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN			
1.845	MAO DE OBRA DE ACABAMENTO	1,0	MO			
1.579	MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM	1,0	MO			

