



GABRIEL SILVA DE MENEZES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO





SUMÁRIO

1. MEDIDA DAS VALVULAS	3
2. CHECK LIST DO PRODUTO	4
3. ORÇAMENTO.....	5



MEDIDA DAS VALVULAS

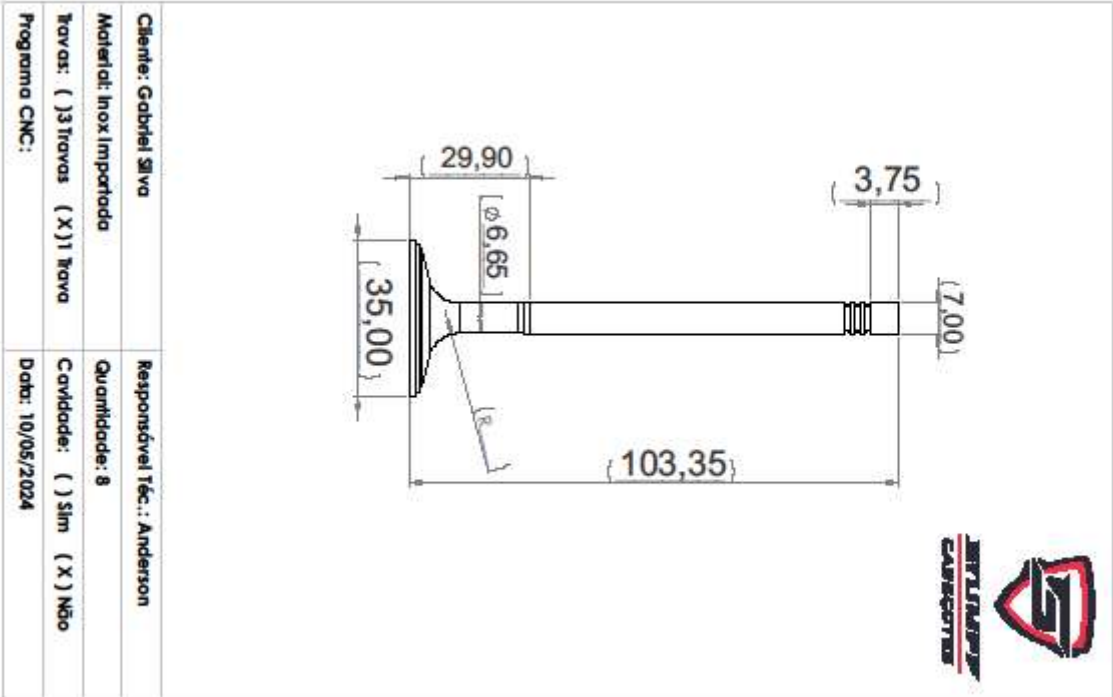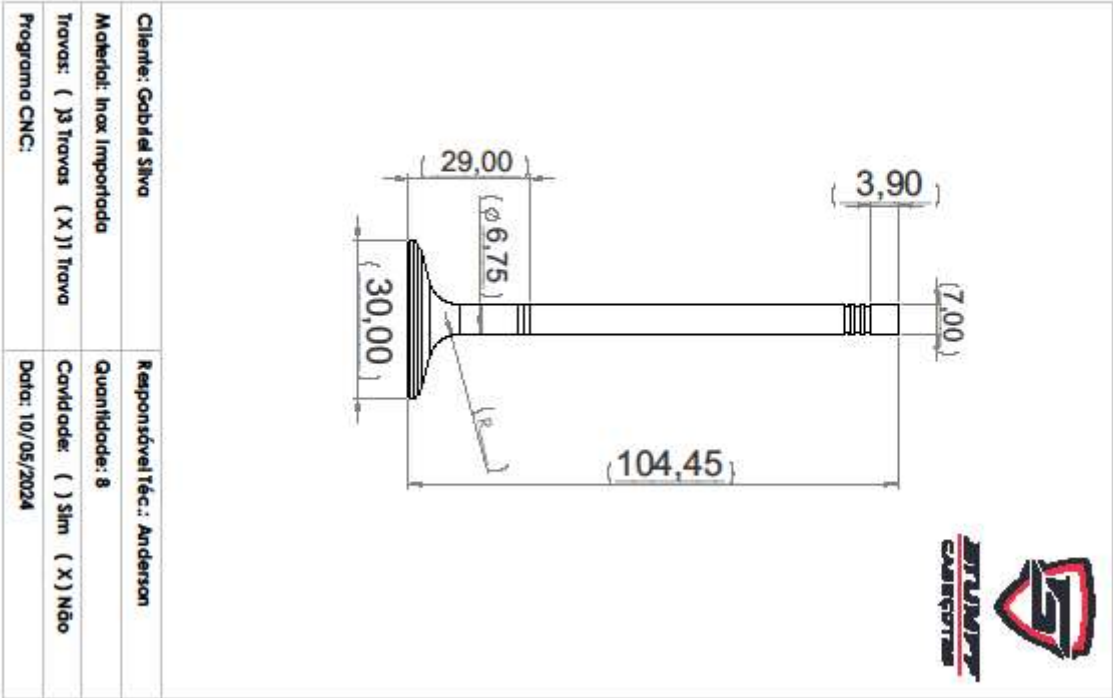

CHECK LIST

CLIENTE: GABRIEL SILVA DE MENEZES – O.S 16734

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	82/185	82/185	82/185	82/185	82/185	82/185	82/185	82/185
ESC	82/185	82/185	82/185	82/185	82/185	82/185	82/185	82/185

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 42,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 28/03/2024

ORÇAMENTO

Nº 16.734

O.S.: 44.465.156.501

Cliente: GABRIEL SILVA DE MENEZES

CPF/CNPJ: 00887436242

Fone: (011)99640-541 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.090	GUIA 7MM STD	16,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.165	PLAINA FACE	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0 SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
2.157	VALVULA INOX IMPORTADA H7	16,0 UN
1.111	MOLA LONGA	16,0 UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO 7MM	16,0 UN
1.636	TRAVA DE VALVULA - 7MM	32,0 UN
1.536	JATO DE AREIA	1,0 SE
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0 UN
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V(COM TROCA DE PEÇAS)	1,0 MO

