



IVO LEAL

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	IVO LEAL	243,4	193,9
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MAREA - TURBO - RACING PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	IVO LEAL	197,1	159,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MAREA - TURBO - RACING PRO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	103,7	82,4
4,00	162,3	130,9
6,00	199,7	167,3
8,00	220,2	185,1
10,00	234,1	191,9
12,00	243,4	197,1
Average:	193,9	159,1



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

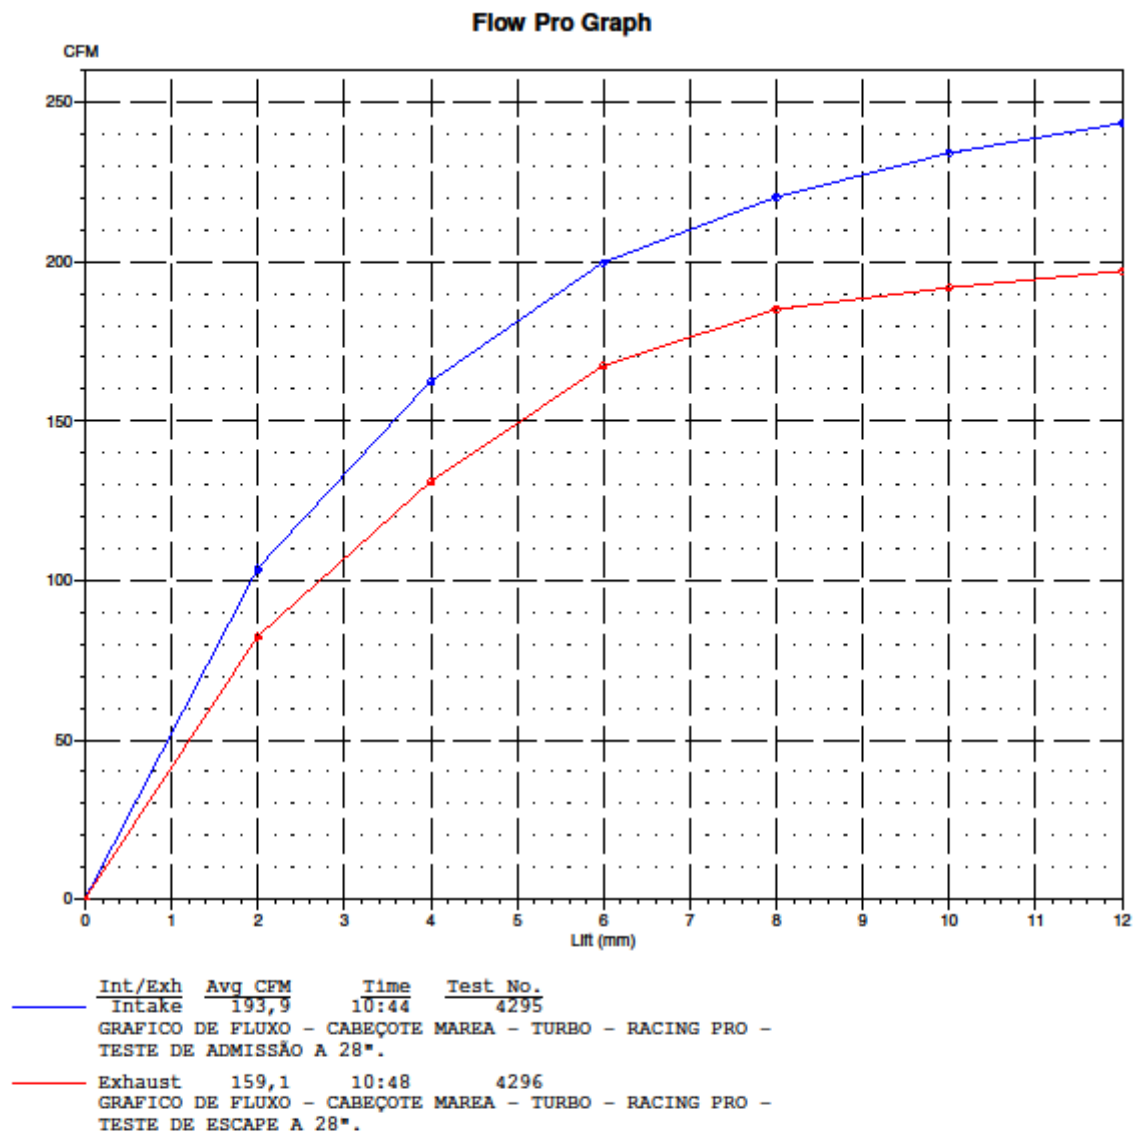


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MAREA - TURBO - RACING PRO - IVO LEAL.





Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
 (45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
 cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : IVO LEAL - O.S 15032

VISTORIA : VINICIUS

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	X	X
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	X	X

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	103/272	103/272	103/272	103/272	103/272	103/272	103/272	103/272	103/272	103/272	X	X
ESC	103/272	103/272	103/272	103/272	103/272	103/272	103/272	103/272	103/272	103/272	X	X

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 38,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 03/10/2023

ORÇAMENTO

Nº 15.032

O.S.:

Cliente: IVO LEAL

CPF/CNPJ:

Fone: (79)98197090 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.146	SEDE DE BERILIO	20,0 UN
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	20,0 UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	20,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	20,0 SE
1.659	SERVICO DE SOLDA- CAMARA COMBUSTÃO + ALOJAMENTO SEDE	1,0 SE
1.149	VEDADOR 7MM	20,0 UN
1.477	SERVICO GERAL- DLC TUCHO	20,0 UN
1.161	PLAINA FACE	1,0 SE
1.607	MAO DE OBRA REFAZER CAMARA	5,0 MO
1.516	MAO DE OBRA REVISAO 20V	1,0 MO
1.782	SERVICO DE FRESA- REFURAR ALOJAMENTO PRISIONEIR(	10,0 SE

