



JEFFERSON OLIVEIRA DE SOUZA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ORÇAMENTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	JEFFERSON	148,0	111,9
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - STREET PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	JEFFERSON	113,7	88,5
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - STREET PRO - TESTE DE ESCAPE A 28".				

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	38,7	27,8
4,00	73,4	63,6
6,00	108,7	86,8
8,00	129,1	102,8
10,00	140,1	111,3
12,00	145,1	113,2
14,00	148,0	113,7
Average:	111,9	88,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

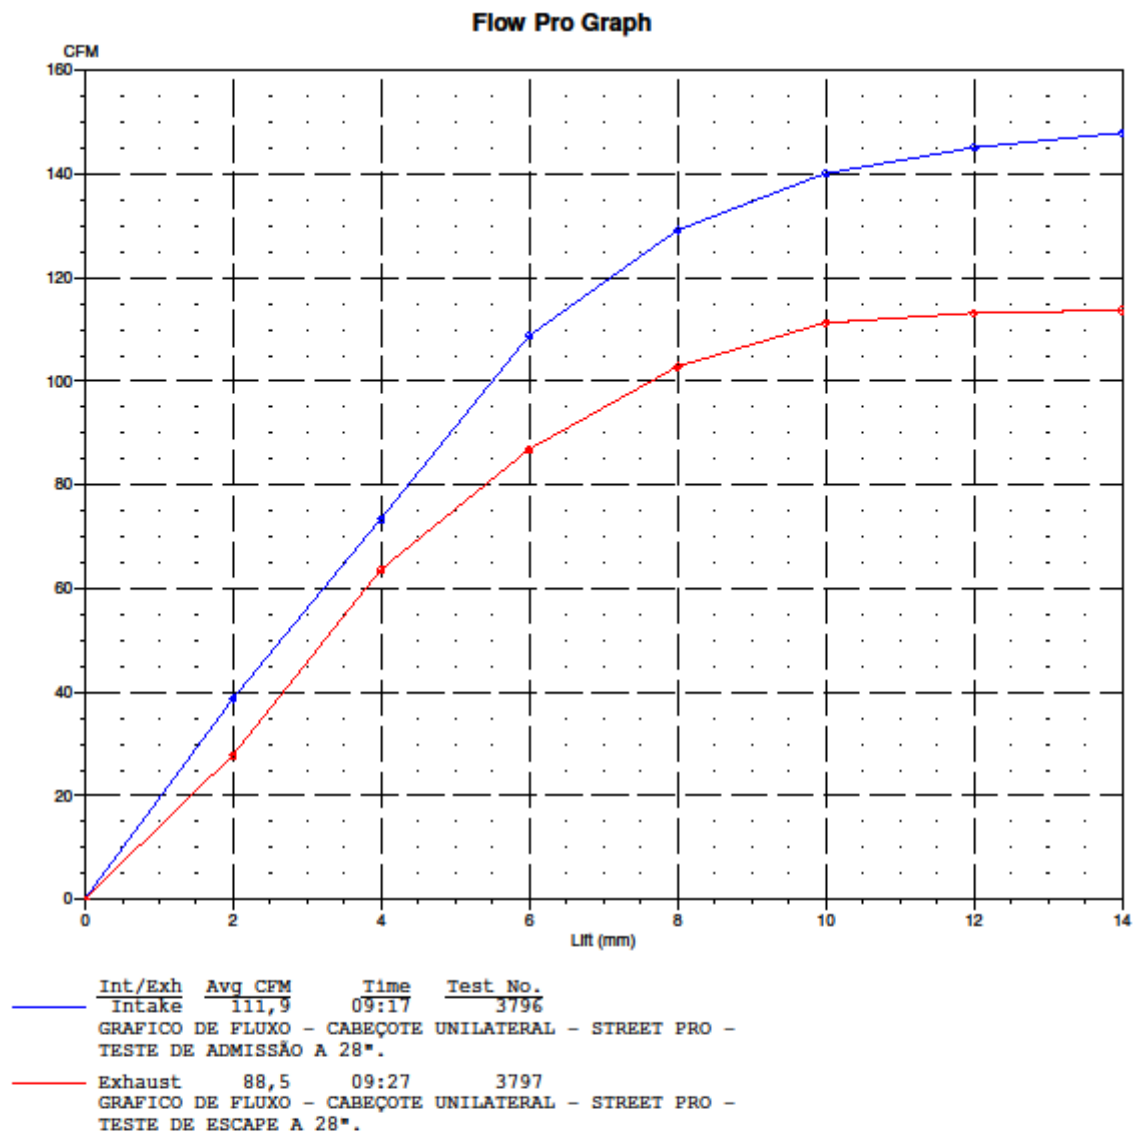


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - STREET PRO - JEFFERSON OLIVEIRA.



MEDIDA DAS VALVULAS

Flow Pro Graph

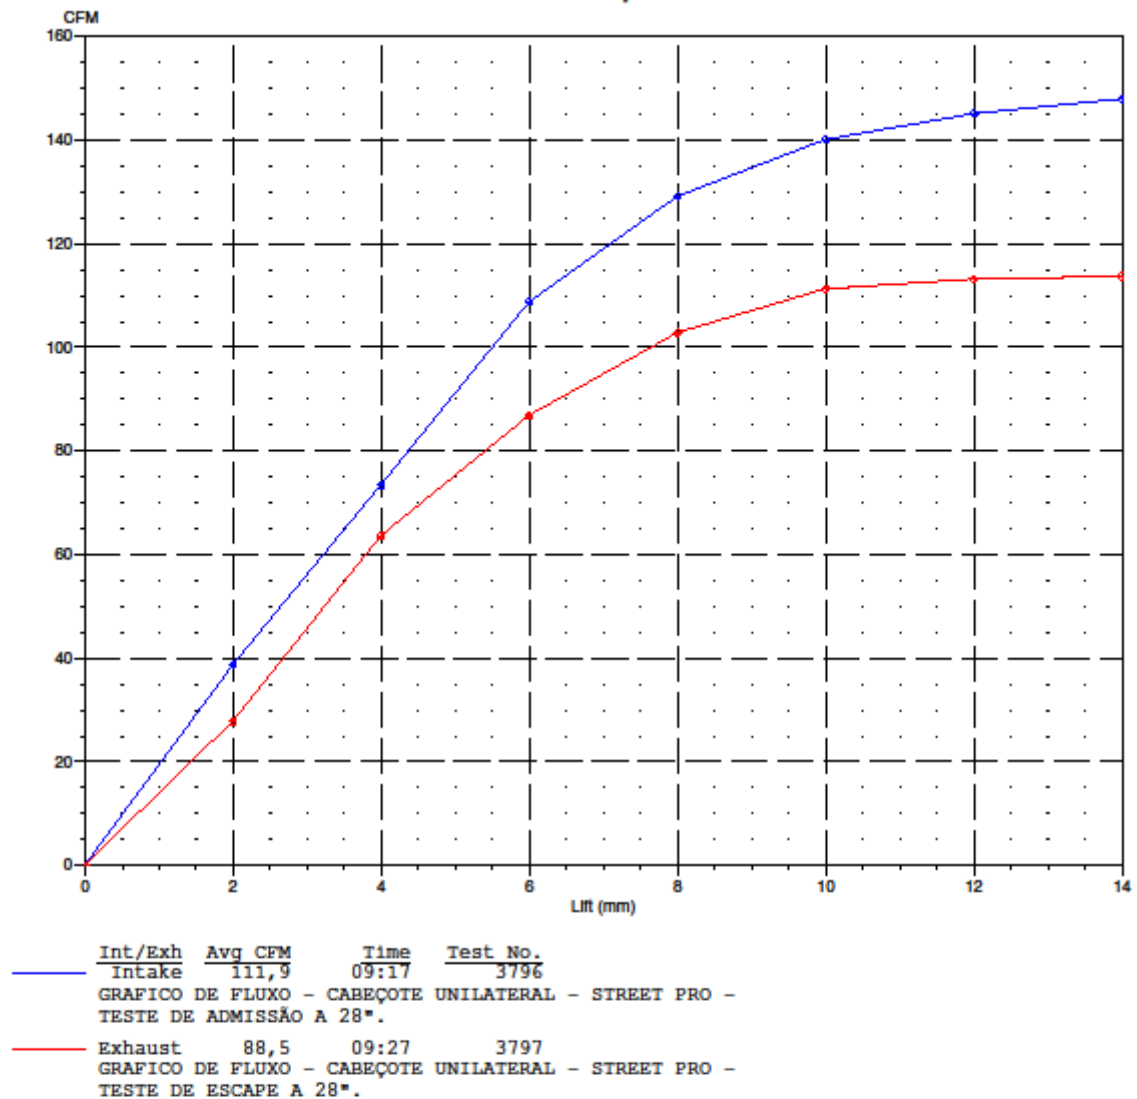


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - STREET PRO - JEFFERSON OLIVEIRA.



CHECK LIST

CLIENTE: JEFFERSON OLIVEIRA DE SOUZA – O.S 15456

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	90/298	90/298	90/298	90/298	-	-	-	-
ESC	90/298	90/298	90/298	90/298	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 28,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 20/11/2023

ORÇAMENTO

Nº 15.456

O.S.: 44.457.589

Cliente: JEFFERSON OLIVEIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 04844121598

Fone: (073)9971-100; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
1.159	PLAINA FACE	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	4,0	UN
1.002	VALVULA DE INOX NACIONAL ADM	4,0	UN
1.458	MAO DE OBRA RETRABALHO 8V	1,0	MO
2.211	TUCHO 35MM	8,0	UN
2.177	JUNTA COBRE ESCAPE	1,0	UN
1.889	MOLA INTERMEDIARIA	8,0	PC
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	8,0	UN
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	1,0	UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	8,0	UN
1.439	SELO DAGUA AP	1,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN
1.447	PLAINA LATERAL	1,0	SE
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE

