



JHOSEFER LUIZ ALVES DOS SANTOS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDAS DE VALVULAS	4
4 CHECKLIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report				Pg 1	
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	JHOSEFER LUIZ	169,8	115,2	
	TESTE CABEÇOTE 8V GM STREET - ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	CELSON GUAL	145,1	102,6	
	TESTE CABEÇOTE 8V GM STREET -ESCAPE A 28".				
Lift	CCFM No. 1	No. 2			
2,00	39,7	41,5			
4,00	76,3	65,6			
6,00	110,8	103,6			
8,00	138,1	124,6			
10,00	156,7	135,2			
12,00	169,8	145,1			
Average:	115,2	102,6			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"



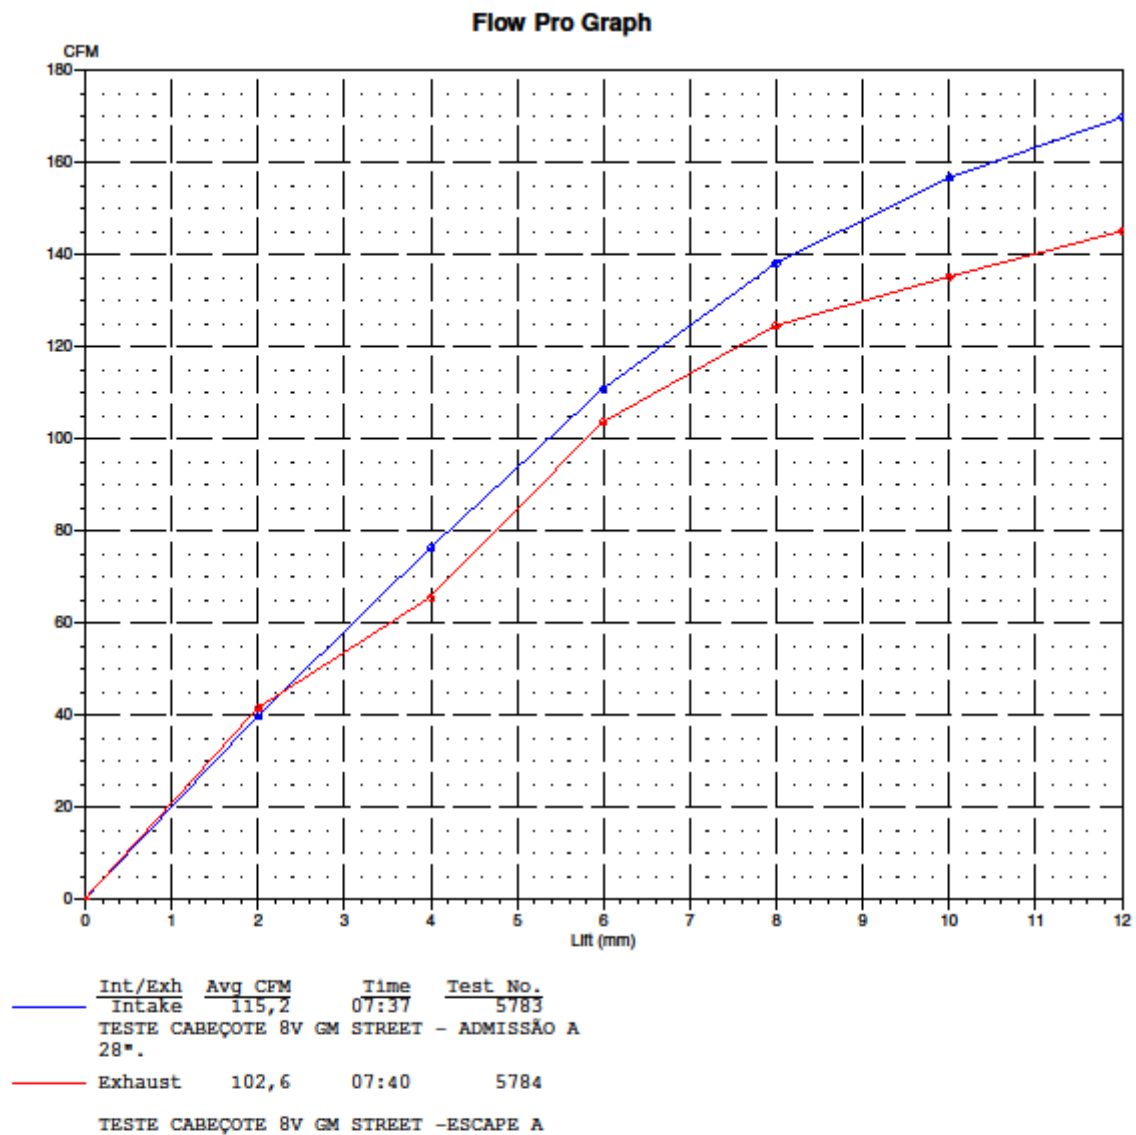


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 8V GM STREET - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"

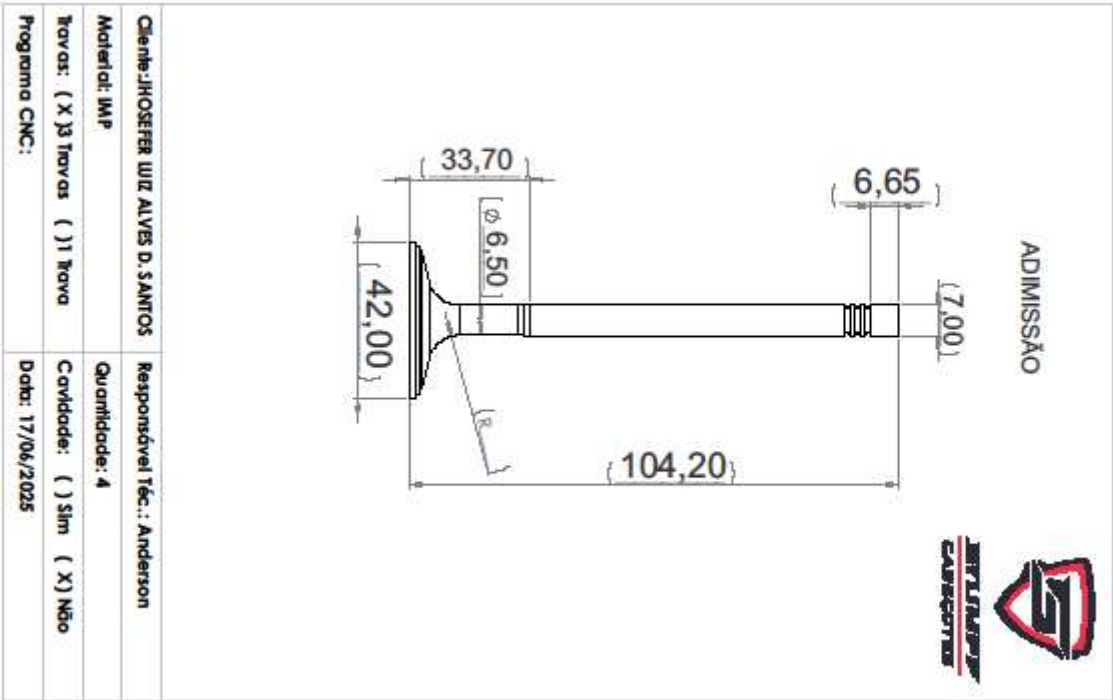

MEDIDA DE VALVULAS

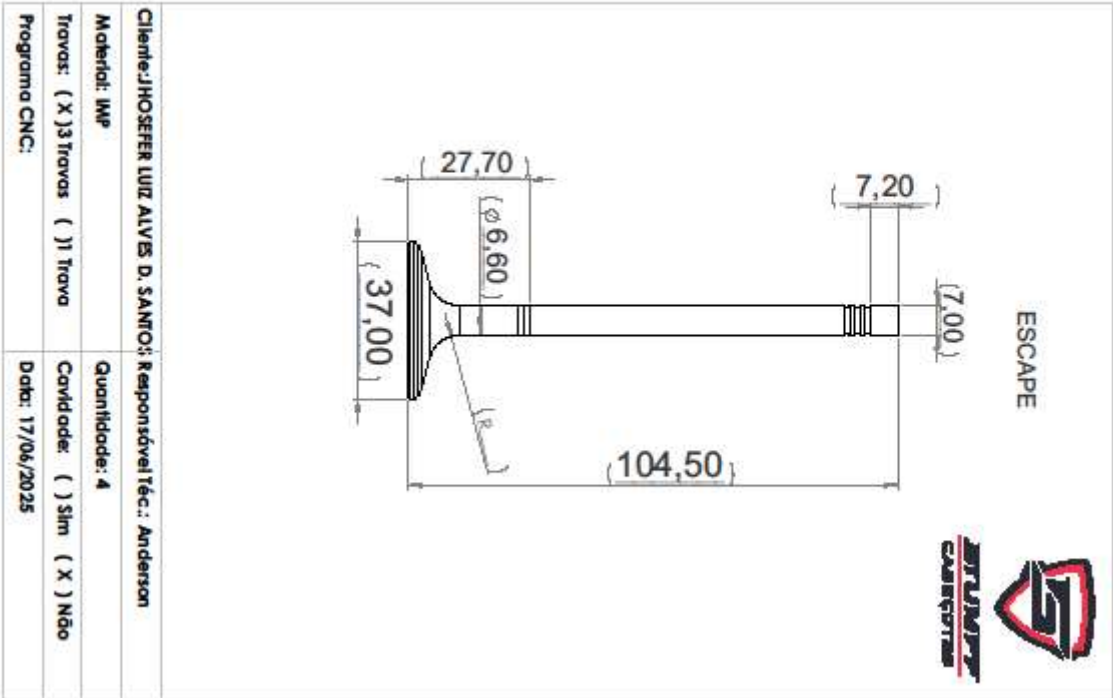

CHECK LIST

CLIENTE: JHOSEFER LUIZ ALVES DOS SANTOS – O.S 20124

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-
ESC	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	45/143	45/143	45/143	45/143	-	-	-	-
ESC	45/143	45/143	45/143	45/143	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 45,6CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 10/03/2025

ORÇAMENTO

Nº 20.124

O.S.: 44.465.157.034

Cliente: JHOSEFER LUIZ ALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 28.519.251/000170

Fone: (027)9951-0281 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.414	PLAINA FACE	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
2.018	CALCO MOLA ALUMINIO - 2MM	8,0	UN
2.185	VALVULA INOX IMP. H7 36MM	4,0	UN
2.153	VALVULA INOX IMPORTADA H7	4,0	UN
1.872	GUIA 7MM STD	8,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA. REFURAR	1,0	SE
1.444	TRAVAMENTO DE TUCHOS	1,0	MO
1.179	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.217	MAO DE OBRA RETRABALHO GM 8V	1,0	MO
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.460	SOLDA ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.690	REFAZER ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	2,0	UN
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	2,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	2,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.854	TUCHO VALVULA HIDRAULICO GM	1,0	UN
2.292	BALANCEIRO DO GM 2.0	1,0	UN
1.479	MOLA NACIONAL GM	1,0	UN
1.691	PRATO ORIGINAL. GM	1,0	UN

