



LUIZ ANTONIO TEIXEIRA BIZARRO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABECOTE	LUIZ ANTON	233,2	162,9	
	GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE UNILATERAL TURBO DE PISTA - STAGE 1 - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABECOTE	LUIZ ANTON	203,7	140,5	
	GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE UNILATERAL TURBO DE PISTA - STAGE 1 - TESTE DE ESCAPE A 28".				

CCFM		
Lift	No. 1	No. 2
2,00	51,7	45,6
4,00	101,6	83,3
6,00	144,4	116,9
8,00	177,2	152,1
10,00	209,4	184,4
12,00	222,8	197,7
14,00	233,2	203,7
Average:	162,9	140,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

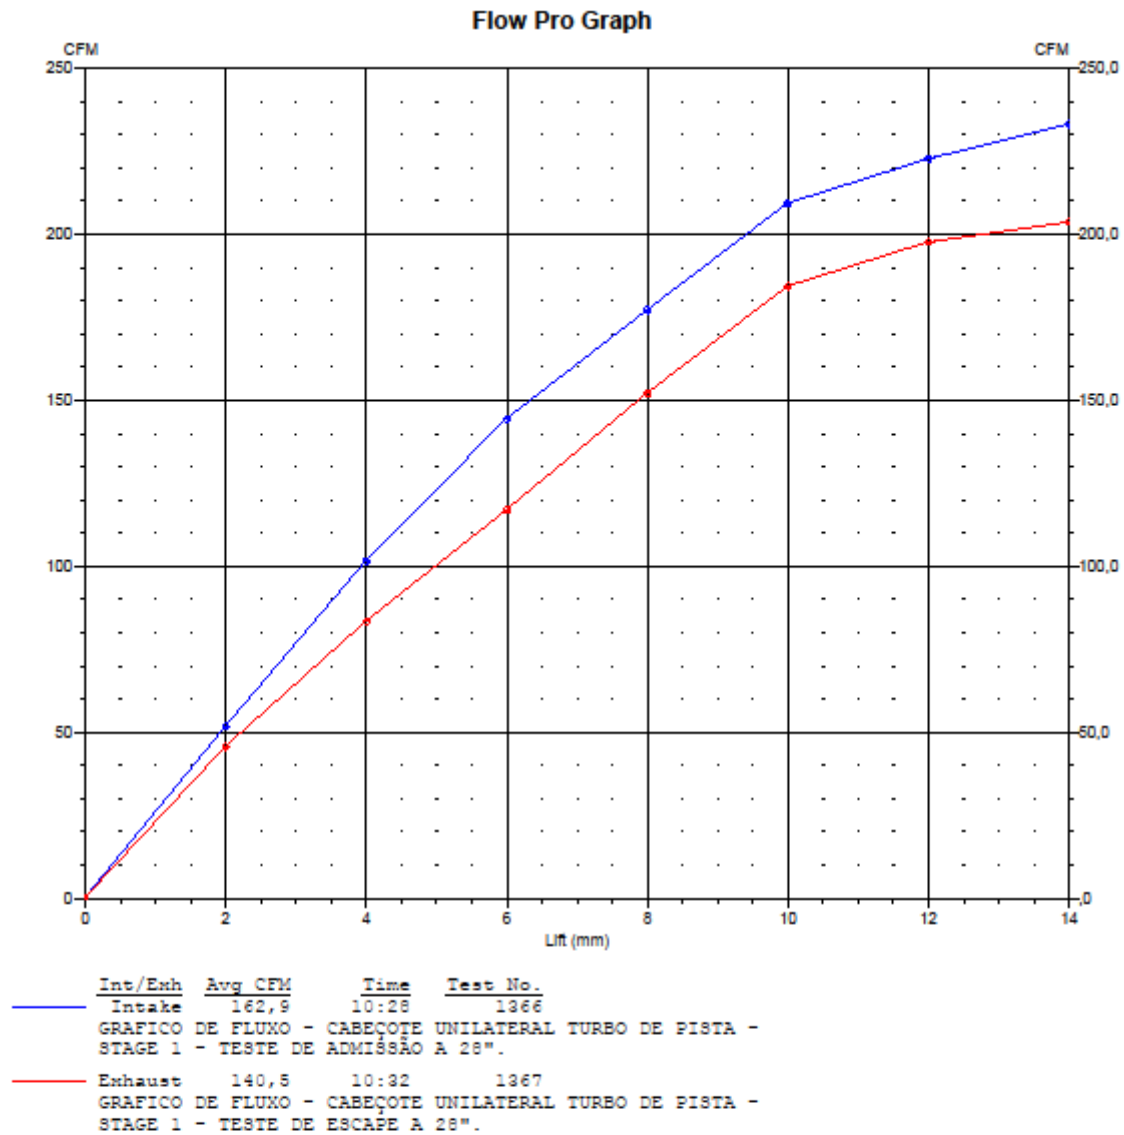


GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE UNILATERAL TURBO DE PISTA - STAGE 1 - LUIZ ANTONIO BIZARRO.



CHECK LIST

CLIENTE: LUIZ ANTONIO - 10921
VISTORIA: -

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: - CC
-------------------------------	----------------------------



ORÇAMENTO



STUMPF
CABEÇOTES

STUMPF
Tel/Fax: (45)99948-0123
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 16/05/2022

ORÇAMENTO

Nº 10.921

O.S.: 44.455.652

Cliente: LUIZ ANTONIO TEIXEIRA BIZARRO

CPF/CNPJ: 011.836.687-40

Fone: (21)32887261 Fone 2: 986861001

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário
1.147	SEDE DE ACO	8,0	UN	27,00
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	4,0	UN	78,84
1.002	VALVULA DE INOX NACIONAL ADM	4,0	UN	78,84
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN	19,44
1.664	REABRIR ALOJAMENTO DE MOLAS	8,0	SE	16,20
1.192	ABRIR ALOJAMENTO DE TUCHO	8,0	SE	32,40
1.458	MAO DE OBRA RETRABALHO 8V	1,0	MO	1.200,00
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN	10,80
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE	46,22
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE	57,78
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE	194,40
1.919	ACABAMENTO DIMPLE - 8V	1,0	SE	1.069,95
1.659	SERVICO DE SOLDA	1,0	SE	200,00
1.447	PLAINA LATERAL	1,0	SE	108,00

