



MAICON RODRIGO BENTO DE DEUS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO DO PRODUTO 07/10/2022	7
6. ORÇAMENTO REVISÃO DO PRODUTO 07/10/2022	8
7. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO DO PRODUTO 19/06/2023	9
8. ORÇAMENTO REVISÃO DO PRODUTO 19/06/2023	10



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro

Pg 1

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	From CFM
1	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE TURBO DE PISTA - STAGE TOP - TESTE DE ADMISSÃO À 28".	MAICON BENTO DE DEUS	165,0	122,0
2	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE TURBO DE PISTA - STAGE TOP - TESTE DE ESCAPE À 28".	MAICON BENTO DE DEUS	125,0	94,9

Azada	CCFM No. 1	No. 2
2,00	40,0	30,5
4,00	79,9	69,0
6,00	115,9	90,1
8,00	140,3	108,2
10,00	153,0	118,1
12,00	160,0	123,1
14,00	165,0	125,0
Average:	122,0	94,9

DADOS DE FLUXO - CABEÇOTE TURBO DE PISTA - STAGE TOP - MAICON BENTO DE DEUS.



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

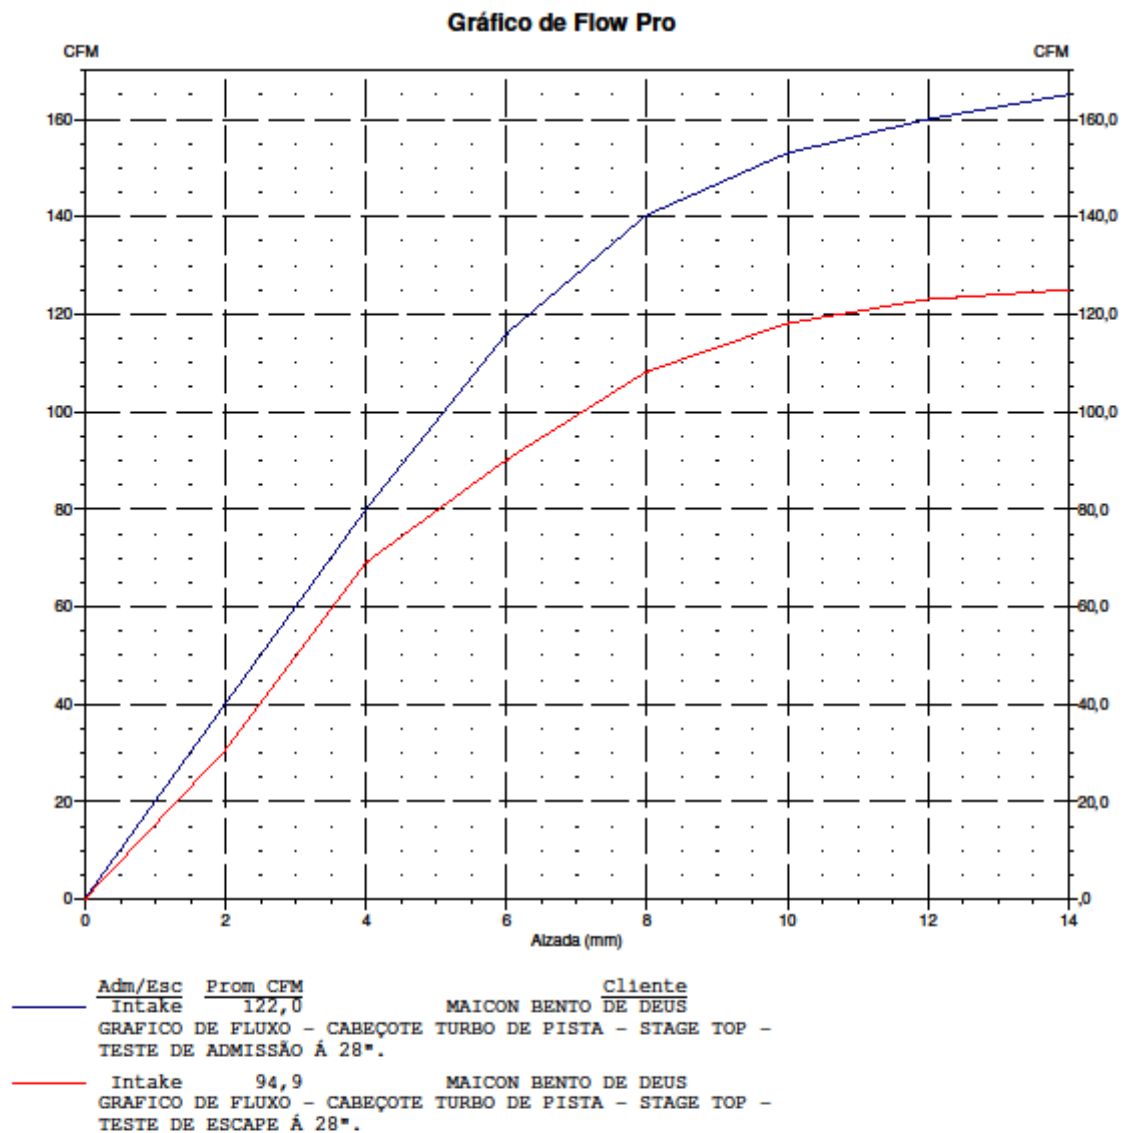


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE TURBO DE PISTA - STAGE TOP - MAICON BENTO DE DEUS.



CHECK LIST

CLIENTE: MAICON RODRIGO BENTO DE DEUS – OS 10517

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	140/290	140/290	140/290	140/290	-	-	-	-
ESC	140/290	140/290	140/290	140/290	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 33,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 28/03/2022

ORÇAMENTO

Nº 10.517

O.S.: 446.683

Cliente: MAICON RODRIGO BENTO DE DEUS

CPF/CNPJ: 03846271969

Fone:

Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN
1.146	SEDE DE BERILIO	8,0	UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0	SE
1.056	CASCO F.C. ALEMAO	1,0	UN
1.635	VALVULA DE ESCAPE HASTE 8MM	4,0	PC
1.438	GUIA PARA BLOCO	2,0	UN
1.285	ARRUELA DE COBRE PARA VELA	4,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.439	SELO D'AGUA AP	1,0	UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.458	MAO DE OBRA RETRABALHO 8V	1,0	MO
1.179	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.204	SOLDA ALOJAMENTO DE BICO	4,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	4,0	SE



CHECK LIST REVISÃO 07/10/2022

CLIENTE: MAICON RODRIGO BENTO DE DEUS – OS 10517

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	146/299	146/299	146/299	146/299	-	-	-	-
ESC	146/299	146/299	146/299	146/299	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 34,0 CC



ORÇAMENTO REVISÃO 07/10/2022

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 27/09/2022 ORÇAMENTO Nº 12.076
O.S.: 44.456.126

Cliente: MAICON RODRIGO BENTO DE DEUS		
CPF/CNPJ: 03846271969	Fone:	Fone 2:
Endereço:		
Veículo:	Placa:	

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.146	SEDE DE BERILIO	2,0	UN			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	1,0	UN			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.716	SELO DE OLEO	1,0	UN			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	2,0	SE			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	2,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			



CHECK LIST REVISÃO 19/06/2023

CLIENTE: MAICON RODRIGO BENTO DE DEUS – O.S 13768

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	137/280	137/280	137/280	137/280	-	-	-	-
ESC	137/280	137/280	137/280	137/280	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 32,8 CC



ORÇAMENTO REVISÃO 19/06/2023

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 24/05/2023 **ORÇAMENTO** Nº 13.768
O.S.:

Cliente: MAICON RODRIGO BENTO DE DEUS CPF/CNPJ: 03846271969 Fone: Fone 2:		
Endereço:		Placa:
Veículo:		

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.187	SUBSTITUIR SEDE- ESC 4	1,0	SE			
1.659	SERVICO DE SOLDA- ESC 1	1,0	SE			
1.645	MAO DE OBRA DE ACABAMENTO	1,0	SE			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	1,0	UN			
1.146	SEDE DE BERILIO	1,0	UN			
1.084	GUIA 8MM	1,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	7,0	SE			
2.155	VALVULA INOX IMPORTADA H8- 35MM	1,0	UN			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			
1.119	TUCHO 35MM	4,0	UN			

