



MALTON PORTO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	MALTON POR	186,3	128,7
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GM 8V - ASPIRADO DE PISTA COM DIMPLE - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	MALTON POR	161,0	118,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GM 8V - ASPIRADO DE PISTA COM DIMPLE - TESTE DE ESCAPE A 28".			
3	STUMPF CABEÇOTE	MALTON POR	108,0	72,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GM 8V - ASPIRADO DE PISTA COM DIMPLE - TESTE DE ADMISSÃO A 10".			
4	STUMPF CABEÇOTE	MALTON POR	98,9	72,3
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GM 8V - ASPIRADO DE PISTA COM DIMPLE - TESTE DE ESCAPE A 10".			

Lift	CCFM			
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
2,00	31,4	47,0	9,1	19,4
4,00	69,1	71,1	39,5	46,6
6,00	103,8	99,7	58,4	63,0
8,00	129,1	120,5	72,7	74,6
10,00	153,2	137,9	86,3	86,6
12,00	171,8	146,1	97,9	92,2
14,00	184,8	157,4	104,8	96,8
Average:	120,4	111,4	67,0	68,4



GRAFICOS DE FLUXO

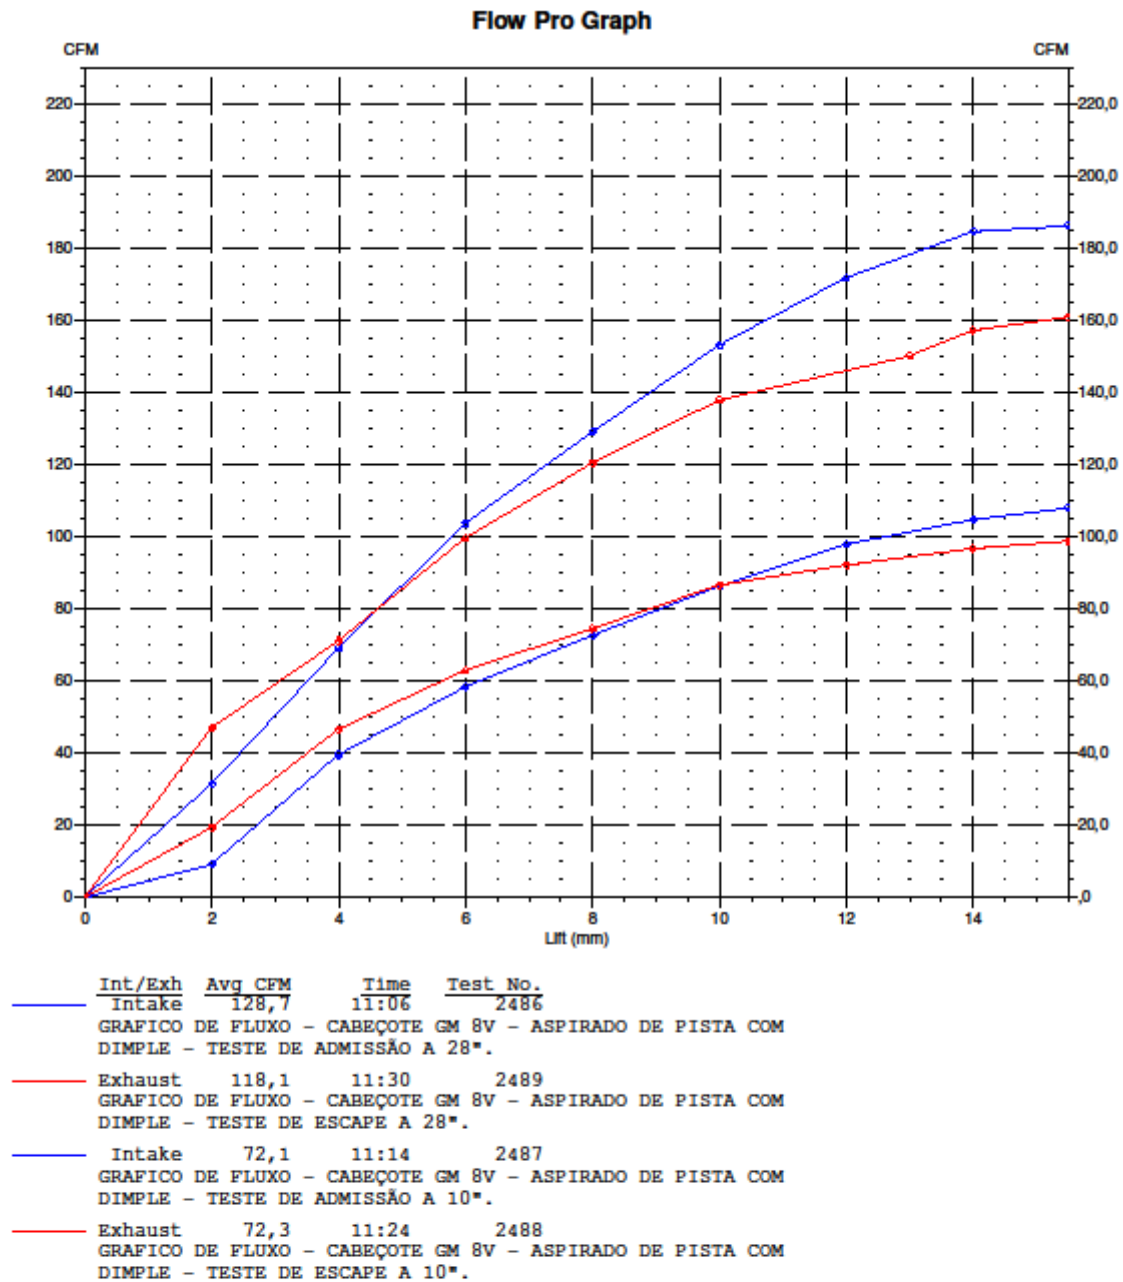


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GM 8V - ASPIRADO DE PISTA COM DIMPLE - MALTON PORTO.



CHECK LIST

CLIENTE: MALTO PORTO – O.S 11275

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	75/230	75/230	75/230	75/230	-	-	-	-
ESC	75/230	75/230	75/230	75/230	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 30,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 22/06/2022

ORÇAMENTO

Nº 11.275

O.S.: 44.456.652

Cliente: MALTON PORTO FARIAS

CPF/CNPJ: 809.255.820-34

Fone: (048)99983-57; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.543	SOLDA FACE	1,0	SE
1.970	PLAINA AVALIACAO	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.872	GUIA 7MM STD	8,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.217	MAO DE OBRA RETRABALHO GM 8V	1,0	MO
1.919	ACABAMENTO DIMPLE - 8V	1,0	SE
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0	MO
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.179	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.995	CASTELO GM 2.0	1,0	UN
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	4,0	UN
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	1,0	UN
1.197	RETRABALHO DE VALVULA	8,0	SE

