



MARCOS ELISEU MARCHETTI

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	LEANDRO SO	166,0	122,2
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP F.C MEXICO - RACING PRO -TESTE DE ADMISSÃO A 28"			
2	STUMPF CABEÇOTE	MARCOS ELI	125,1	95,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP F.C MEXICO - RACING PRO -TESTE DE ESCAPE A 28"			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	40,0	31,3
4,00	80,1	69,3
6,00	116,2	90,0
8,00	140,1	108,2
10,00	153,0	119,0
12,00	160,0	123,1
Average:	114,9	90,1



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

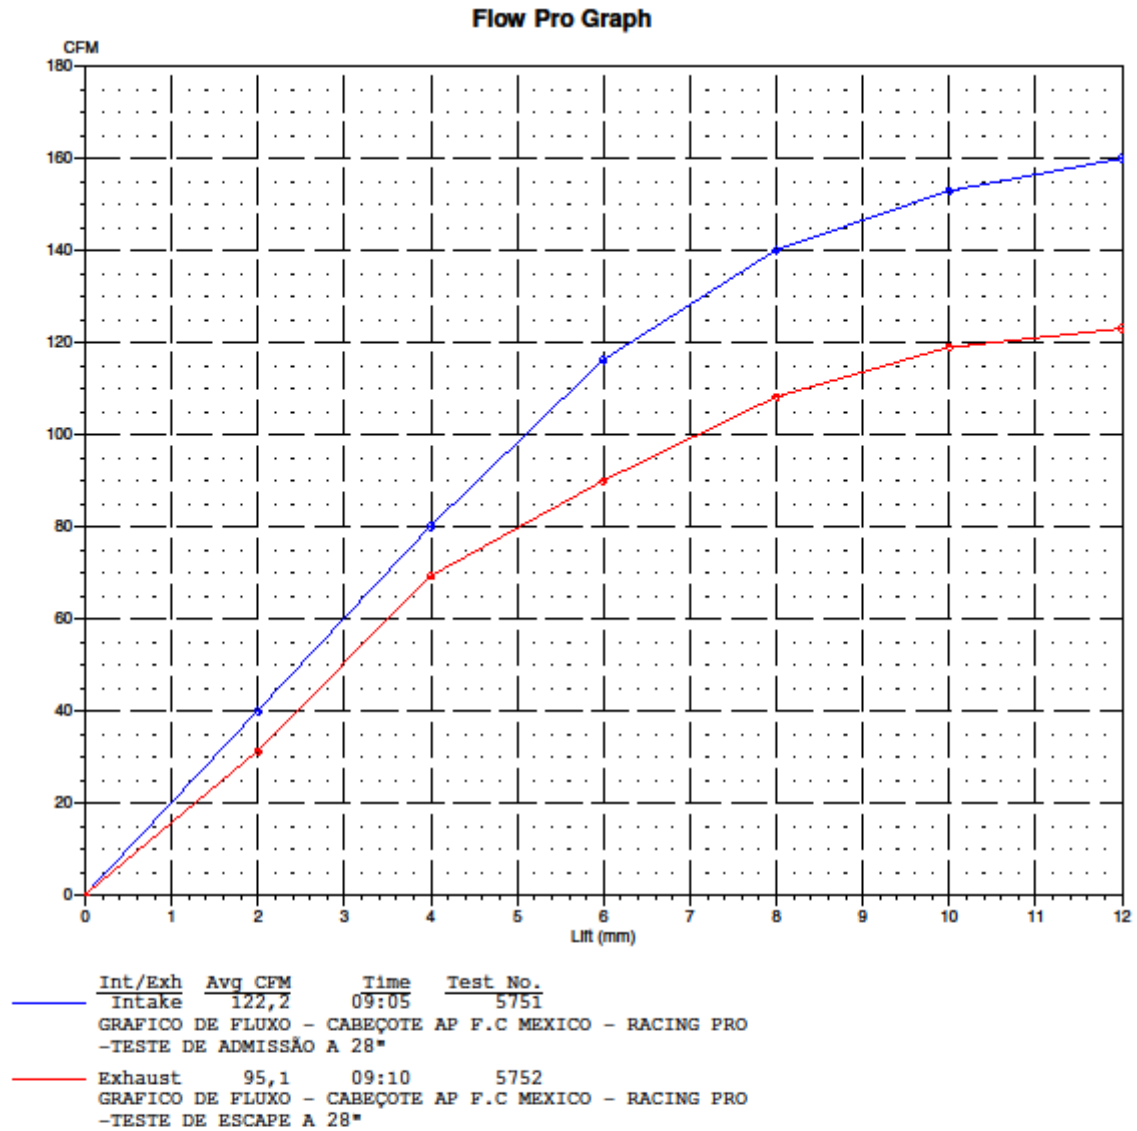


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP F.C MEXICO - RACING PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28"



CHECK LIST

CLIENTE: MARCOS ELISEU – O.S 20613
VISTORIA: VINI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	125/265	125/265	125/265	125/265	-	-	-	-
ESC	125/265	125/265	125/265	125/265	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 32,5 CC
-------------	-------------------	-------------------------------



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 30/04/2025 **ORÇAMENTO** N° 20.613
O.S.:

Cliente: MARCOS ELISEU MARCHETTI	
CPF/CNPJ: 017905140-70	Fone: (054)9949-368 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.146	SEDE DE BERILIO	2,0	UN
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	2,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	2,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.090	GUIA 7MM STD	2,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0	UN
2.204	TUCHO 37MM	8,0	UN
2.185	VALVULA INOX IMP. H7 38MM	4,0	UN
2.153	VALVULA INOX IMPORTADA H7	4,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN
1.203	SOLDA ALOJAMENTO DE SEDE- E CAMARA E ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.815	RETRABALHO CAMARA CNC	1,0	MO
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.782	SERVICO DE FRESA- ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO
1.111	MOLA LONGA	8,0	UN

