



PAULO ABRANTES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	PAULO ABRA	240,3	180,9	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V - TURBO - RACING - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	PAULO ABRA	217,5	157,1	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V - TURBO - RACING - TESTE DE ESCAPE A 28".				
Lift	CCFM No. 1	No. 2			
2,00	78,1	65,6			
4,00	139,4	113,1			
6,00	180,6	149,1			
8,00	215,6	188,5			
10,00	231,2	208,5			
12,00	240,3	217,5			
Average:	180,9	157,1			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

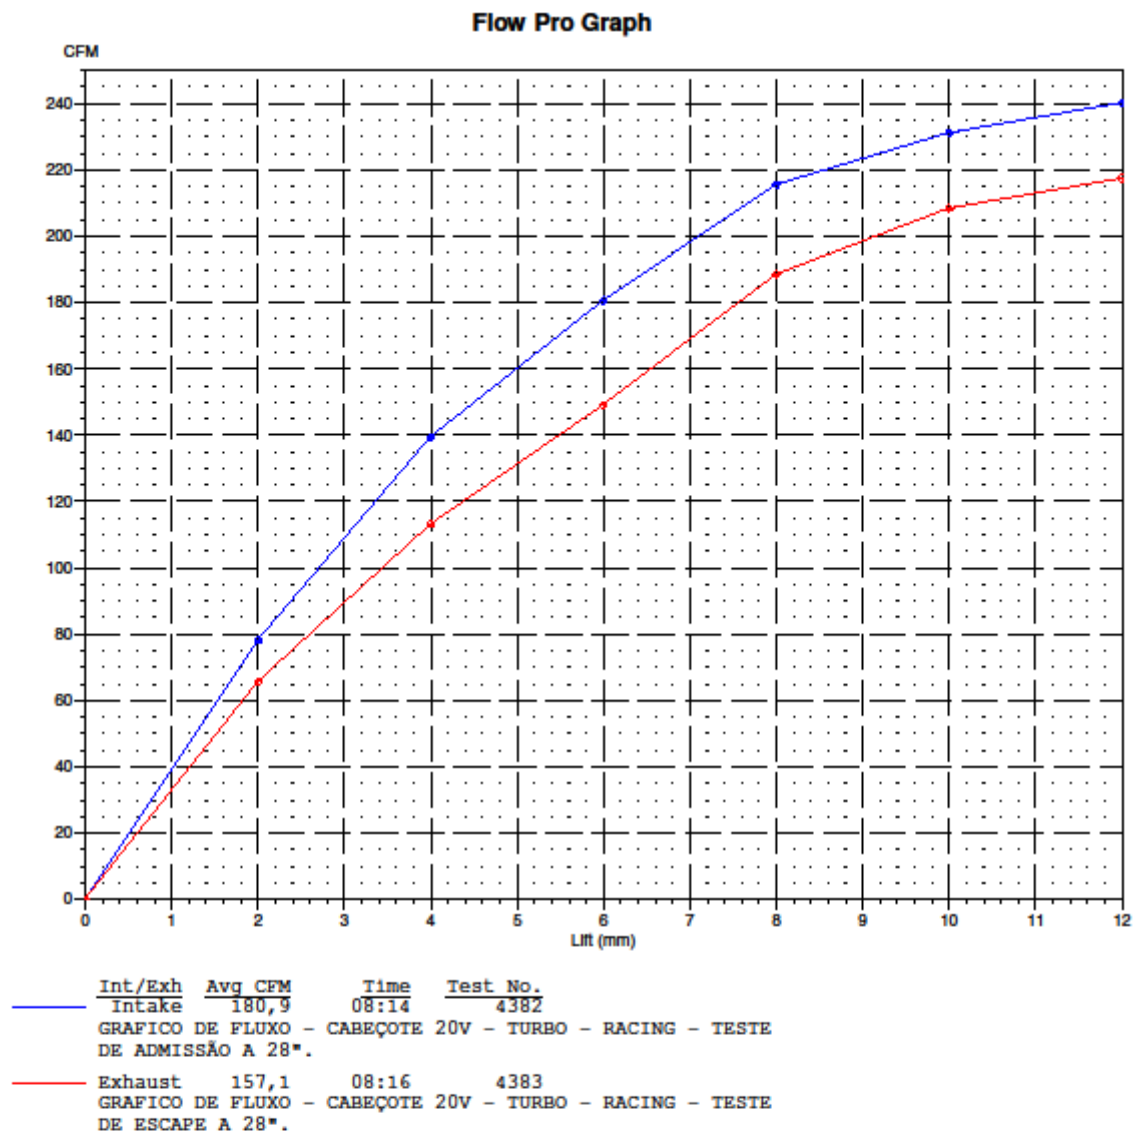


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V - TURBO - RACING - PAULO ABRANTES.





Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
 (45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
 cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : DIEGO DE FALCHI RODRIGUES - O.S 15785

VISTORIA : RONALDO

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ESC	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	X	X	X	X

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	47/110	47/110	47/110	47/110	47/110	47/110	47/110	47/110	47/110	47/110	47/110	47/110
ESC	75/180	75/180	75/180	75/180	75/180	75/180	75/180	75/180	X	X	X	X

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 42,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 04/03/2024

ORÇAMENTO

Nº 16.420

O.S.: 444.556.524

Cliente: PAULO ABRANTES

CPF/CNPJ: 151.853.818-50

Fone: (055)9912-0851 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇO

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.659	SERVICO DE SOLDA. MANGAL, MANDRILHAR MANGAL, TROCAR 3 CAPAS	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	20,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	20,0	SE
1.161	PLAINA FACE	1,0	SE
1.215	MAO DE OBRA RETRABALHO 20V	1,0	MO
1.097	GUIA 6MM	20,0	UN
1.148	VEDADOR 6MM	20,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	12,0	UN
2.039	BUCHA DE ROSCA 14 X 1,5	1,0	UN

