



RUBENSON LEVI MULLER - ME

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	RUBENSON L	166,0	122,2
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V F.C MEXICO - STREET PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28"			
2	STUMPF CABEÇOTE	RUBENSON L	125,1	95,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V F.C MEXICO - STREET PRO - TESTE DE ESCAPE A 28"			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	40,0	31,3
4,00	80,1	69,3
6,00	116,2	90,0
8,00	140,1	108,2
10,00	153,0	119,0
12,00	160,0	123,1
Average:	114,9	90,2



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

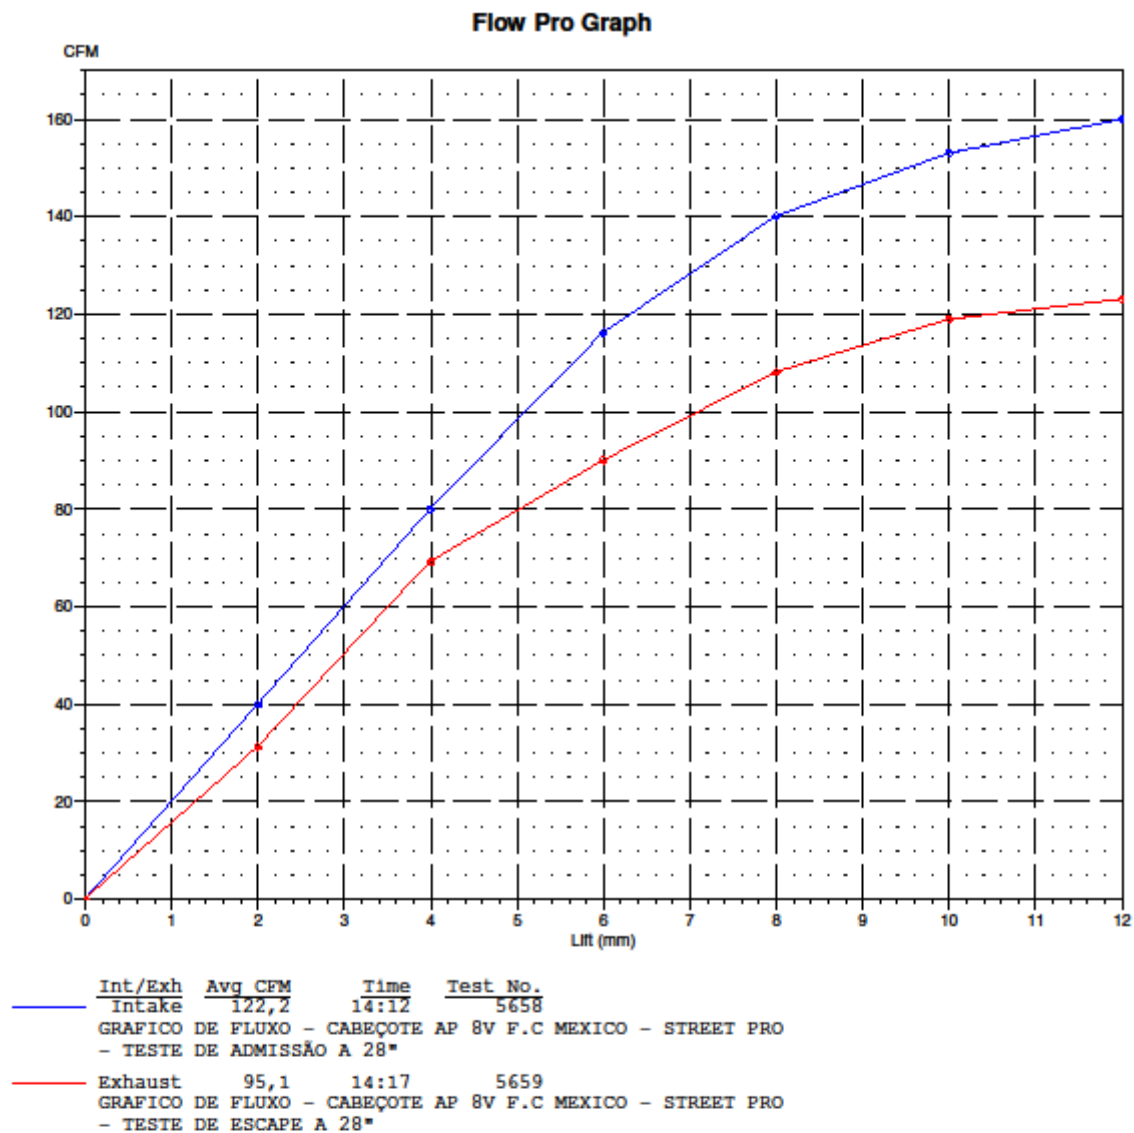


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V F.C MEXICO - STREET PRO - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



CHECK LIST

CLIENTE: RUBENSON LEVI MULLER – ME – O.S 20366

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	92/190	92/190	92/190	92/190	-	-	-	-
ESC	92/190	92/190	92/190	92/190	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 32,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 03/04/2025 **ORÇAMENTO** N° 20.366
O.S.: 44.456.470

Cliente: RUBENSON LEVI MULLER - ME	
CPF/CNPJ: 13.937.210/0001-52	Fone: (049)9999-748 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	8,0 UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.159	PLAINA FACE	1,0 SE
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0 SE
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0 UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.179	PLAINA LATERAL	2,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.270	BUCHA DE REFORCO DO ESCAPE	2,0 UN
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0 UN
1.111	MOLA LONGA	8,0 UN
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0 MO
1.870	GUIA 8MM STD CURTO	8,0 UN
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0 SE
1.919	ACABAMENTO DIMPLE - 8V	1,0 SE
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0 SE
1.939	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE	4,0 UN
1.944	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO	4,0 UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
2.211	TUCHO 35MM	8,0 UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0 UN
1.439	SELO DAGUA AP	1,0 UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0 UN
2.554	KIT INSTALACAO	1,0 4
2.658	JUNTA.ADMISSAO AP8V F.C	1,0 UN

