



SANTIAGO DA SILVA VIANA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEQOTE	SANTIAGO V	79,8	57,8	
2	STUMPF CABEQOTE	SANTIAGO V	137,8	98,2	
3	STUMPF CABEQOTE	SANTIAGO V	93,4	64,0	
4	STUMPF CABEQOTE	SANTIAGO V	157,0	112,9	

Lift	CCFM No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
1,90	8,0	23,9	9,7	30,8
3,80	35,6	64,2	38,2	66,8
5,70	55,0	85,4	58,8	100,8
7,60	67,8	110,0	72,8	128,6
9,50	78,5	129,5	84,8	149,3
11,40	79,8	137,0	90,6	156,9
13,30	79,7	137,8	93,4	157,0
Average:	57,8	98,2	64,0	112,9



GRAFICOS DE FLUXO

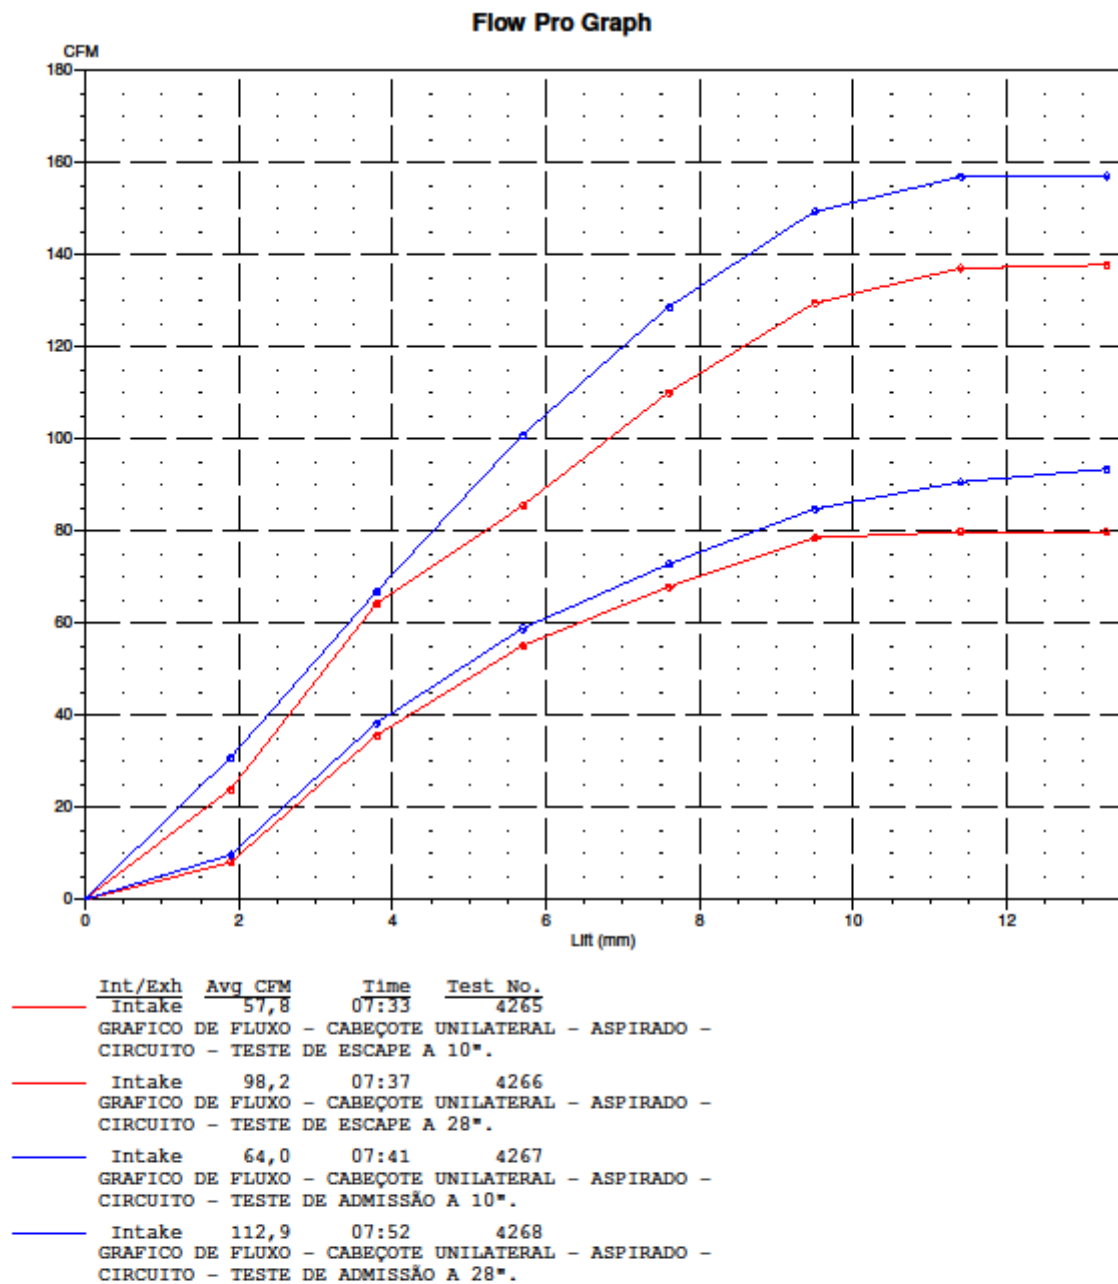


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - ASPIRADO - CIRCUITO - SANTIAGO VIANA.



CHECK LIST

CLIENTE: SANTIAGO DA SILVA VIANA – O.S 16116

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	120/290	120/290	120/290	120/290	-	-	-	-
ESC	120/290	120/290	120/290	120/290	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 20,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 02/02/2024

ORÇAMENTO

Nº

16.116

O.S.:

Cliente: SANTIAGO DA SILVA VIANA

CPF/CNPJ:

Fone: (549)3757-439 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.049	CASCO AP ZERO	1,0	UN			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.659	SERVICO DE SOLDA- CÂMARA DE COMBUSTÃO	1,0	SE			
1.981	GUIA 8MM	8,0	UN			
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0	MO			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE			
1.146	SEDE DE BERILIO	8,0	UN			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.179	PLAINA LATERAL	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
2.211	TUCHO 35MM	8,0	UN			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN			
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	4,0	UN			
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0	MO			
1.200	Retrabalho de PistãoSERVIÇO DE FRESA EM PISTÃO	4,0	SE			
1.667	POLIA COM REGULAGEM	1,0	PC			

