



SERGIO MALTEZO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	SERGIO MAL	240,3	180,9	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V ASPIRADO DE RUA - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	SERGIO MAL	217,5	157,1	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V ASPIRADO DE RUA - TESTE DE ESCAPE A 28".				
Lift	CCFM No. 1	No. 2			
2,00	78,1	65,6			
4,00	139,4	113,1			
6,00	180,6	149,1			
8,00	215,6	188,5			
10,00	231,4	208,5			
12,00	240,3	217,5			
Average:	180,9	157,1			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

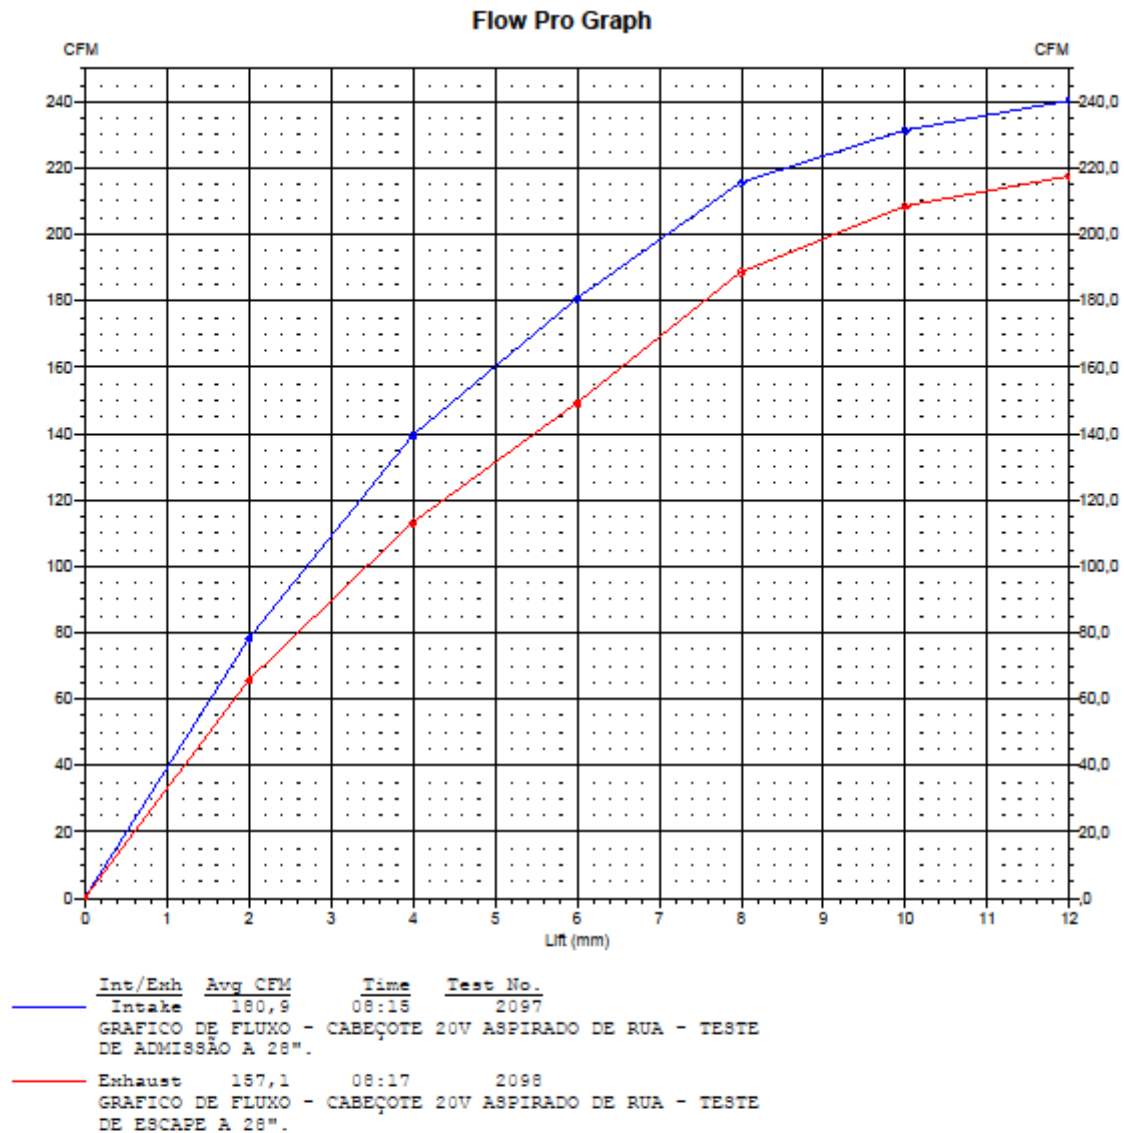


GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE 20V ASPIRADO DE RUA - SERGIO MALTEZO.





Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
 (45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
 cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : SERGIO MALTEZO - O.S 12325

VISTORIA : OSNI

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	50/110	50/110	50/110	50/110	50/110	50/110	50/110	50/110	50/110	50/110	50/110	50/110
ESC	80/185	80/185	80/185	80/185	80/185	80/185	80/185	80/185	X	X	X	X

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 42,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 26/10/2022

ORÇAMENTO

Nº 12.325

O.S.: 44.456.268

Cliente: SERGIO MALTEZO

CPF/CNPJ: 028.448.249-18

Fone: (041)98408-46; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	4,0 UN
1.148	VEDADOR 6MM	20,0 UN
1.097	GUIA 6MM	20,0 UN
1.844	COMANDO- ASPIRADO ORIGINAL	2,0 UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	20,0 SE
1.896	RETENTOR DO COMANDO	2,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	20,0 SE
1.446	PLAINA FACE	1,0 SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	20,0 SE
1.215	MAO DE OBRA RETRABALHO 20V	1,0 MO
1.202	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0 SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0 SE
1.265	ADAPTAR TENSOR HIDRAULICO 20V	1,0 SE
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0 MO
1.181	PLAINA LATERAL	2,0 SE

