



JAUDACIR DOS SANTOS BERTOLDO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO MELHORIA	3
2. GRAFICOS DE FLUXO MELHORIA	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 23/02/2024	7
6. ORÇAMENTO REVISÃO 23/02/2024	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	SERGIO MAL	154,5	114,3
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP UNILATERAL - DIPRIMA - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	SERGIO MAL	116,2	88,5
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP UNILATERAL - DIPRIMA - TESTE DE ESCAPE A 28".			
3	STUMPF CABEÇOTE	SERGIO MAL	126,1	97,6
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP UNILATERAL - STUMPF - TESTE DE ESCAPE A 28".			
4	STUMPF CABEÇOTE	SERGIO MAL	169,8	124,5
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP UNILATERAL - STUMPF - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			

CCFM				
Lift	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
2,00	45,9	29,6	37,8	55,1
4,00	79,0	66,2	74,4	88,2
6,00	101,4	85,2	93,4	111,0
8,00	124,5	99,9	109,7	132,9
10,00	148,6	108,9	118,7	152,5
12,00	169,8	119,5	129,3	162,3
14,00	184,5	116,2	126,1	169,8
Average:	114,3	88,5	97,6	124,5



GRAFICOS DE FLUXO

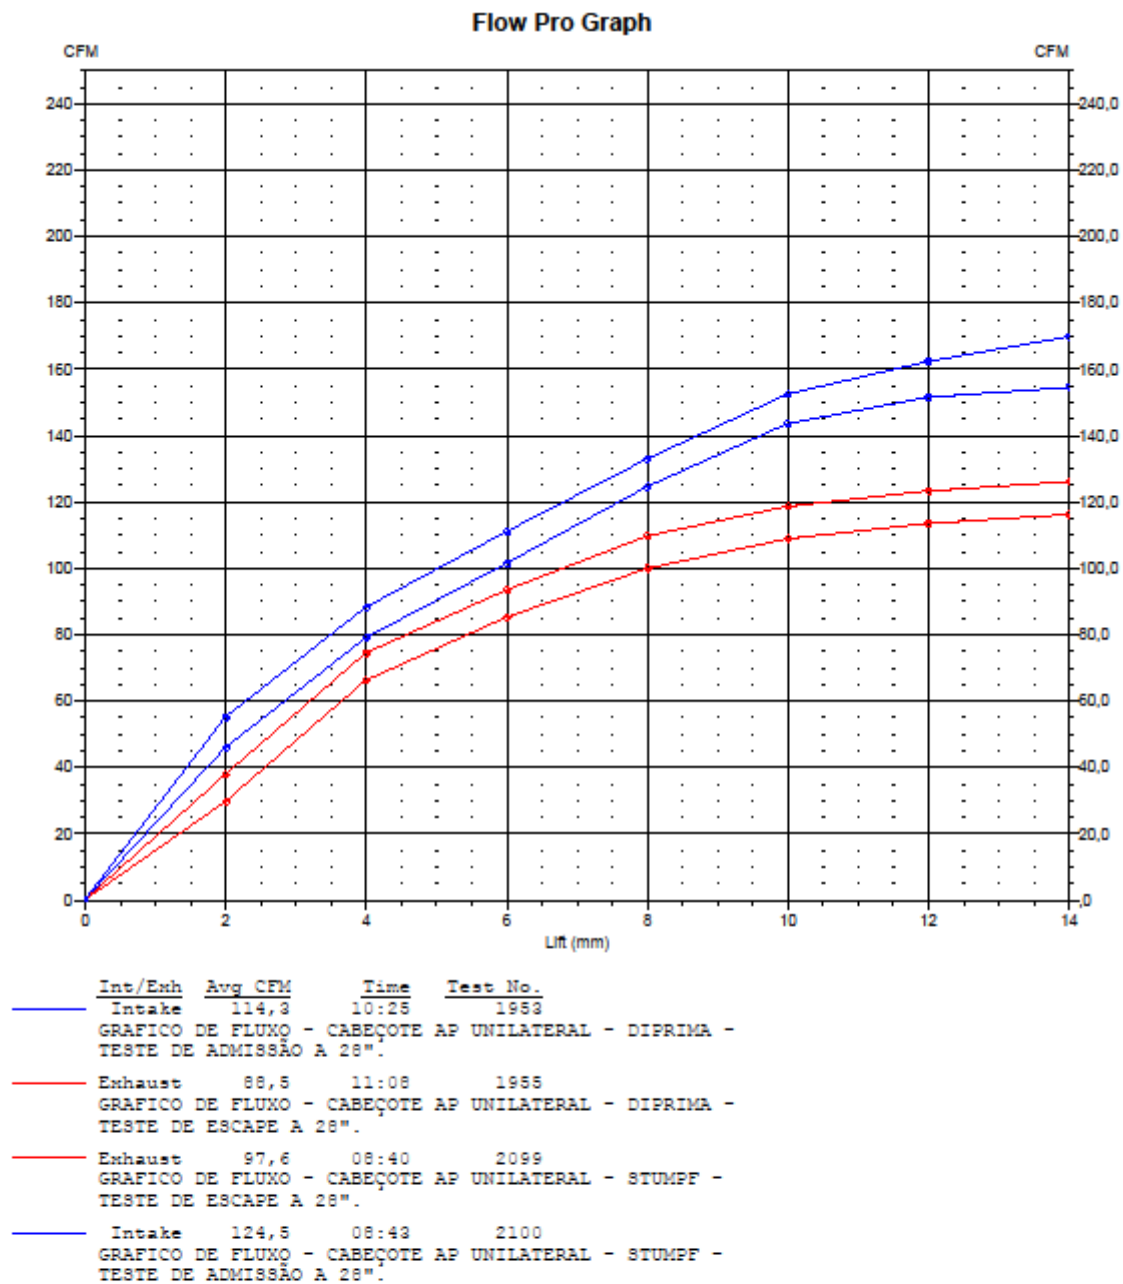


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP UNILATERAL - SERGIO MALTEZO.



CHECK LIST

CLIENTE: SERGIO MALTEZO – O.S 12524

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	125/273	125/273	125/273	125/273	-	-	-	-
ESC	125/273	125/273	125/273	125/273	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 39 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
CNPJ: 33826228000194	
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 30/11/2022

ORÇAMENTO

Nº 12.524

O.S.:

Cliente: SERGIO MALTEZO

CPF/CNPJ: 026.446.249-16

Fone: (041)98408-46; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0 UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	5,0 SE
1.091	GUIA 7MM	8,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0 SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0 SE
1.715	AJUSTE DE MANCAL	1,0 SE
1.563	MAO DE OBRA DE MELHORIA	1,0 MO



CHECK LIST REVISÃO 23/02/2024

CLIENTE: JAUDACIR DOS SANTOS BERTOLDO – O.S 16179

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	125/275	125/275	125/275	125/275	-	-	-	-
ESC	125/275	125/275	125/275	125/275	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 38 CC



ORÇAMENTO REVISÃO 23/02/2024

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 07/02/2024 ORÇAMENTO N° 16.179
O.S.:

Cliente: JAUDACIR DOS SANTOS BERTOLDO	
CPF/CNPJ: 84324252904	Fone: (041)9577-7771 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	1,0	UN			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	1,0	UN			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE			
1.859	SERVICO DE SOLDA. E ACABAMENTO	1,0	SE			
1.882	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			

