




STEFAN FLEJS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

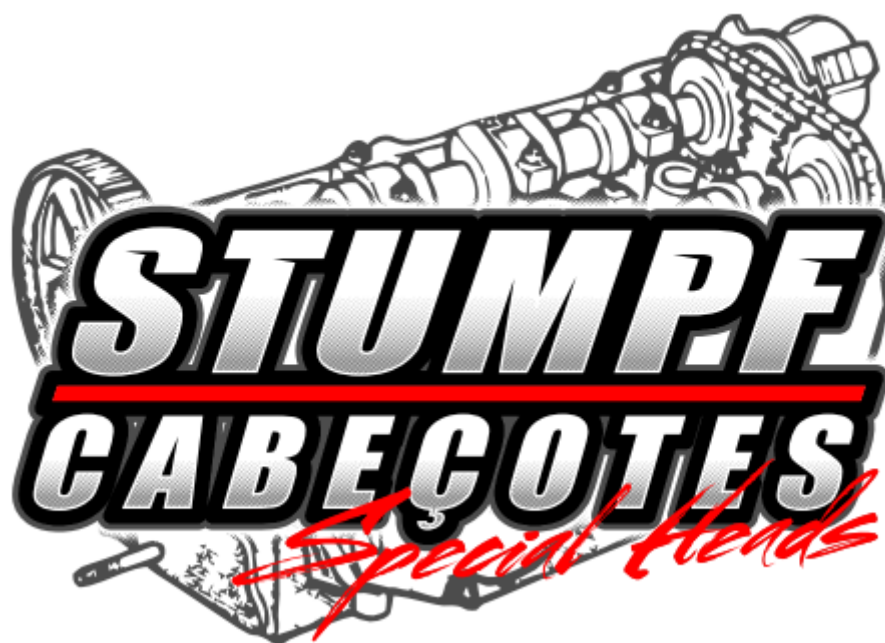

SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	STEFAN FLE	236,6	179,1	
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V TURBO DE RUA - STAGE 2 - TESTE DE ADMISSÃO A 28".					
2	STUMPF CABEÇOTE	STEFAN FLE	197,1	147,4	
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V TURBO DE RUA - STAGE 2 - TESTE DE ESCAPE A 28".					
Lift	CCFM				
	No. 1	No. 2			
2,00	80,8	67,2			
4,00	145,9	119,0			
6,00	201,2	162,3			
8,00	231,0	191,4			
10,00	236,6	197,1			
Average:	179,1	147,4			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

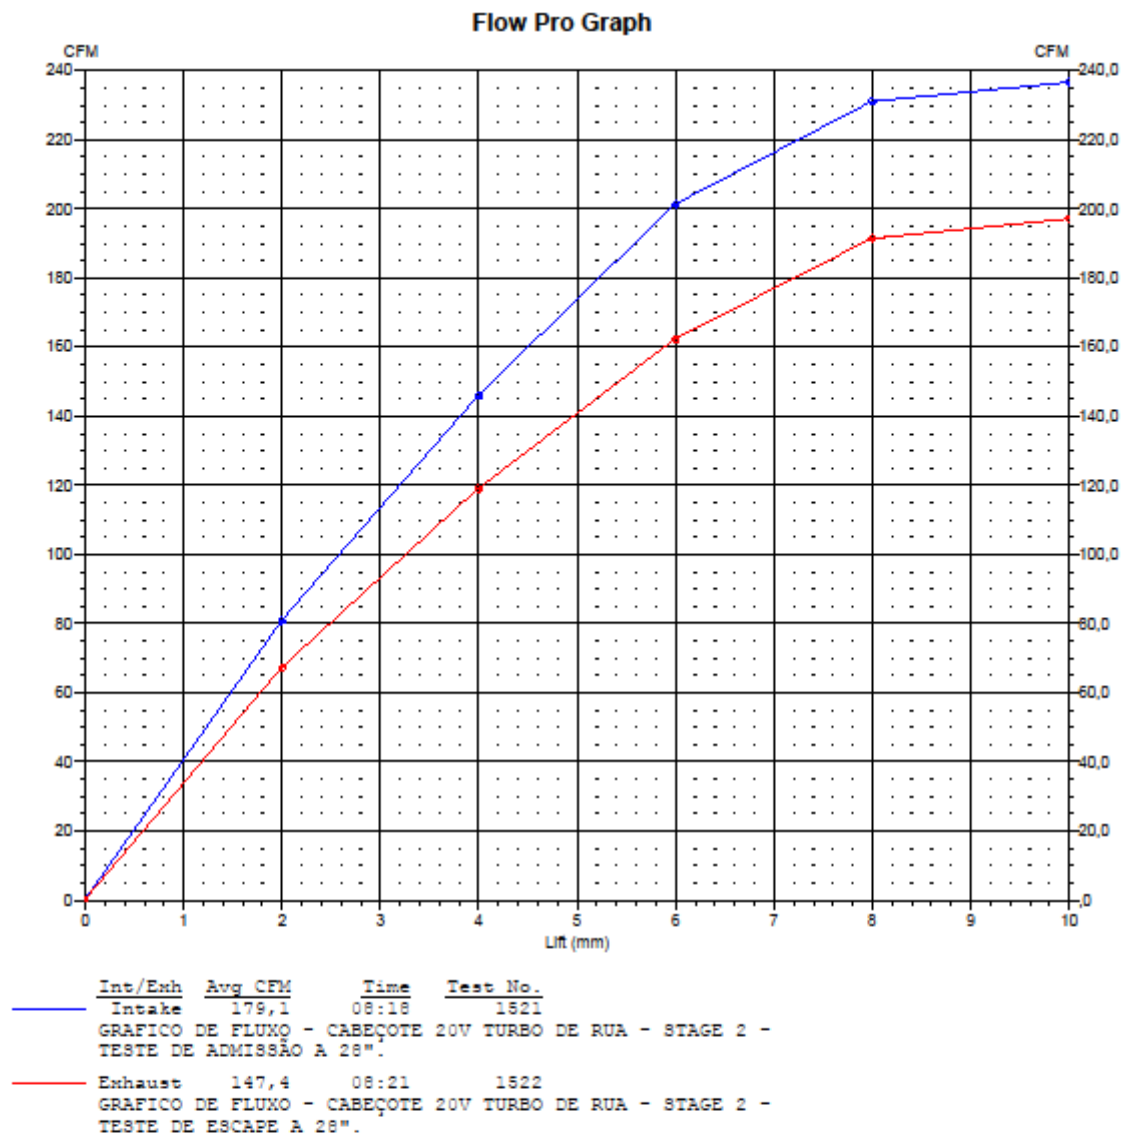


GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE 20V TURBO DE RUA - STAGE 2 - STEFAN FLEJ3.





Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
 (45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
 cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : STEFAN FLEJS

VISTORIA : OSNI

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	X	X	X	X

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	70/120	70/120	70/120	70/120	70/120	70/120	70/120	70/120	70/120	70/120	70/120	70/120
ESC	70/120	70/120	70/120	70/120	70/120	70/120	70/120	70/120	X	X	X	X

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 4,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 27/04/2022

ORÇAMENTO

Nº 10.774

O.S.: 44.446.769

Cliente: **STEFAN FLEJS**

CPF/CNPJ: 049.245.349-78

Fone: (041)99912-84; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.148	VEDADOR 6MM	20,0 UN
1.008	VALVULA DE INOX HASTE 6MM	20,0 UN
1.113	MOLA 20V ADM	12,0 UN
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	2,0 UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	20,0 SE
1.696	RETENTOR DO COMANDO	2,0 UN
1.439	SELO D'AGUA AP	1,0 UN
2.028	PARAFUSO ALLEN S/CABECA 5 X 6	3,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	2,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	20,0 SE
1.161	PLAINA FACE	1,0 SE
1.215	MAO DE OBRA RETRABALHO 20V	1,0 MO
1.715	AJUSTE DE MANCAL	2,0 SE
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0 MO

OBSERVAÇÕES: 20v TURBO RUA - STAGE 2

