



STEFAN FLEJS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	STEFAN FLE	240,0	180,0	
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V TURBO DE RUA - STAGE 2 - TESTE DE ADMISSÃO A 28".					
2	STUMPF CABEÇOTE	STEFAN FLE	200,0	148,5	
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V TURBO DE RUA - STAGE 2 - TESTE DE ESCAPE A 28".					
Lift	CCFM No. 1	No. 2			
2,00	80,8	67,2			
4,00	145,9	119,0			
6,00	201,2	162,3			
8,00	232,2	194,2			
10,00	240,0	200,0			
Average:	180,0	148,5			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

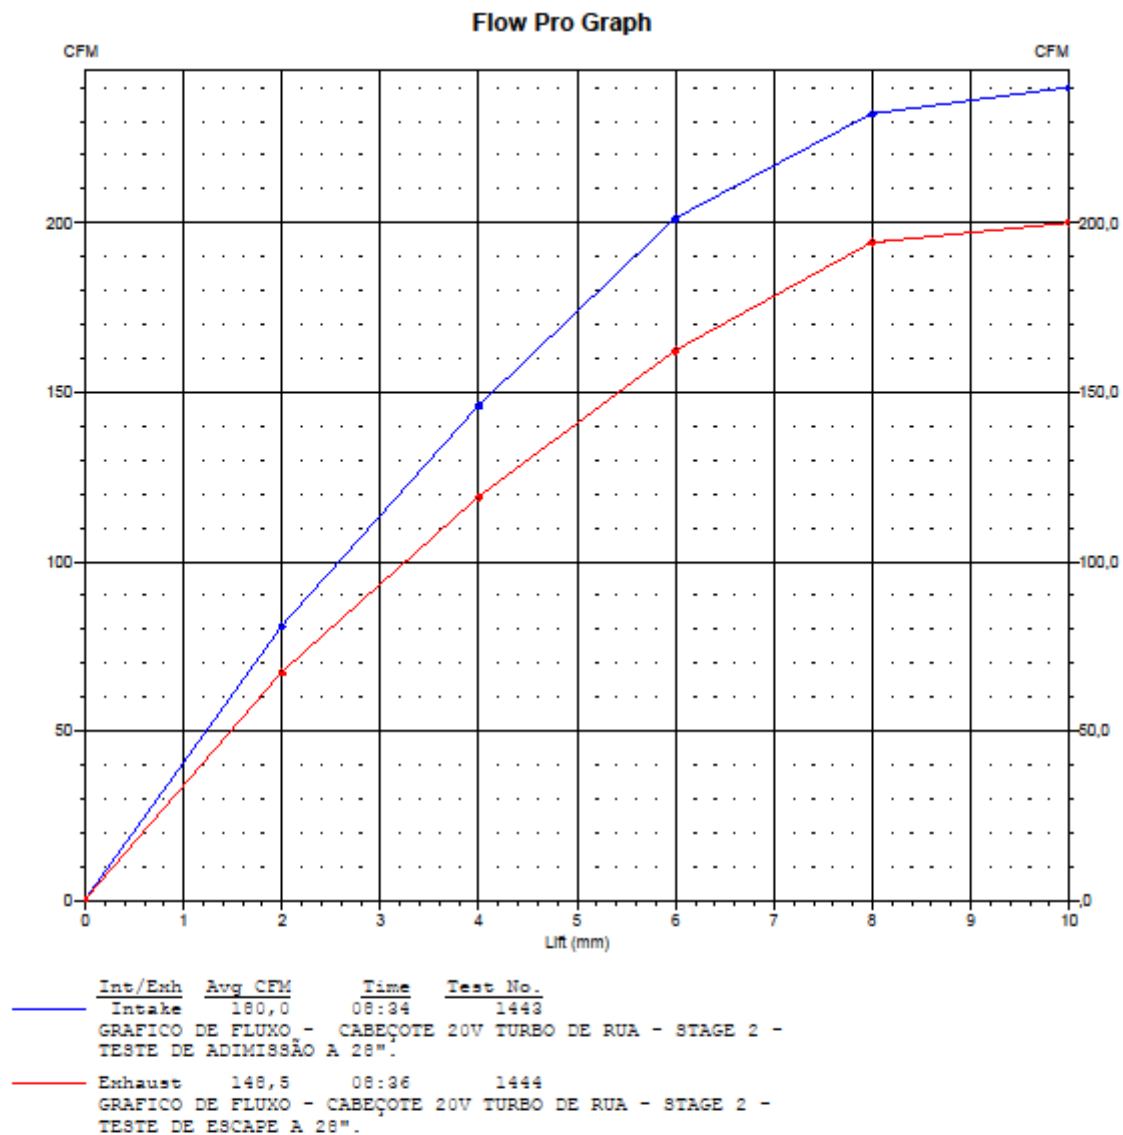


GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE 20V TURBO DE RUA - STAGE 2 - STEFAN FLEJ3.





Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
(45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : STEFAN FLEJS - OS 10846

VISTORIA : ANDERSON

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190
ESC	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	X	X	X	X

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 44,8 CC

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



ORÇAMENTO



STUMPF
CABEÇOTES

STUMPF
Tel/Fax: (45)99948-0123
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 05/05/2022

ORÇAMENTO

Nº 10.846

O.S.: 44.455.719

Cliente: **STEFAN FLEJS**

CPF/CNPJ: 049.245.349-78

Fone: (041)99912-64; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário
1.148	VEDADOR 6MM	20,0	UN	9,73
1.096	GUIA 6MM STD	20,0	UN	22,44
1.778	HELICOIDE 10MM	1,0	UN	25,00
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE	37,52
1.186	RETIFICA DE SEDE	20,0	SE	43,02
1.161	PLAINA FACE	1,0	SE	149,52
1.215	MAO DE OBRA RETRABALHO 20V	1,0	MO	4.840,15
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE	27,72
1.188	RETIFICA DE VALVULA	20,0	SE	24,71
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE	129,24
1.921	ACABAMENTO DIMPLE - 20V	1,0	SE	0,00

OBSERVAÇÕES: 20v TURBO RUA - STAGE 2

