



STEFAN FLEJS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	STEFAN FLE	227,2	167,4	
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AUDI 5C - TURBO DE RUA - TESTE DE ADMISSÃO A 28".					
2	STUMPF CABEÇOTE	STEFAN FLE	197,5	143,2	
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AUDI 5C - TURBO DE RUA - TESTE DE ESCAPE A 28".					
Lift	CCFM No. 1	No. 2			
2,00	60,7	57,0			
4,00	116,8	104,2			
6,00	163,7	142,6			
8,00	209,5	168,8			
10,00	226,5	188,9			
12,00	227,2	197,5			
Average:	167,4	143,2			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

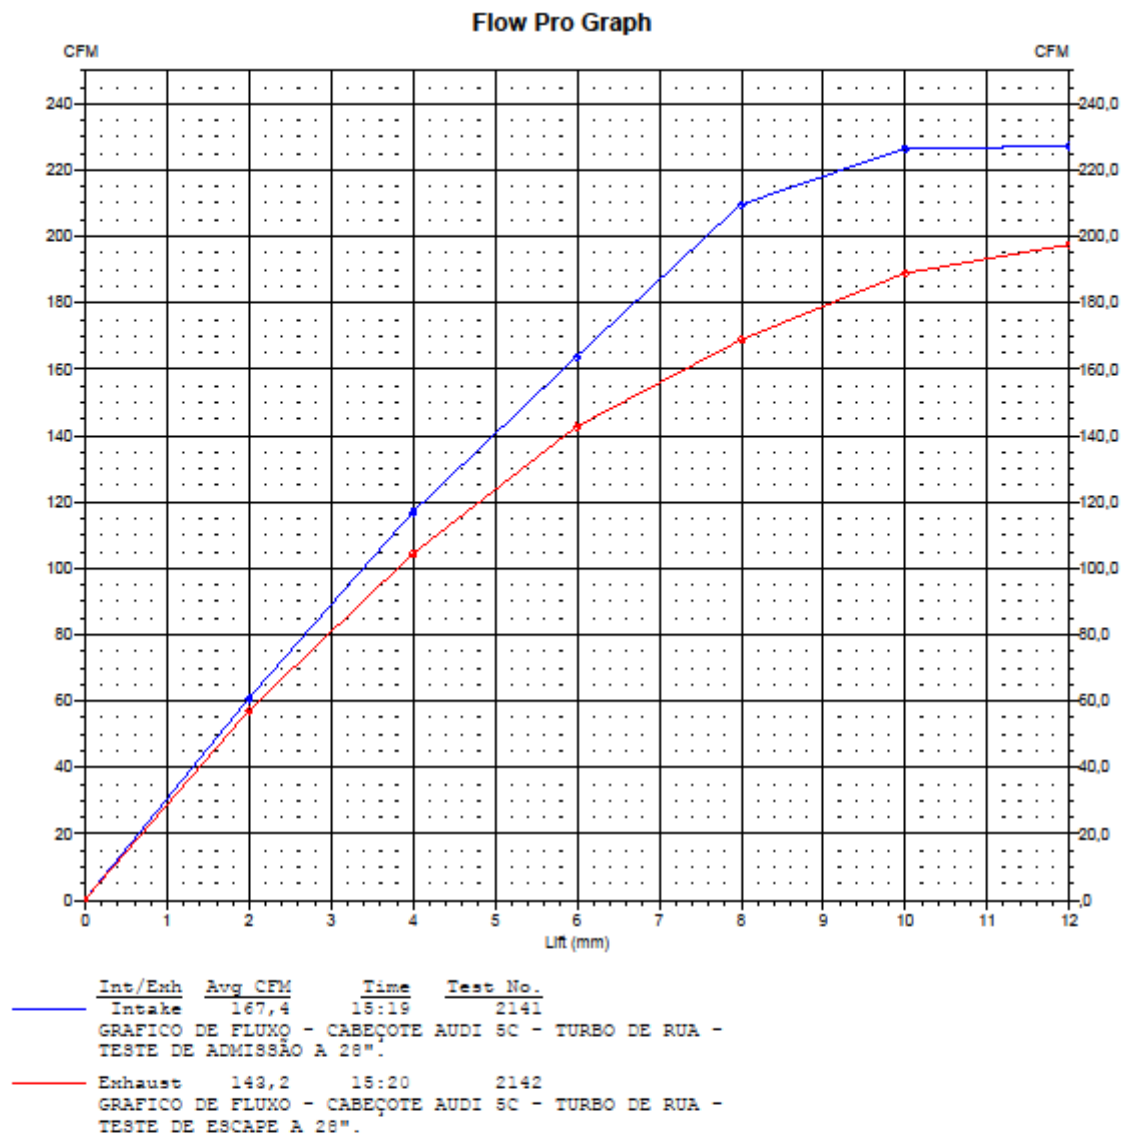


GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE AUDI SC - TURBO DE RUA - STEFAN FLEJS.





Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
 (45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
 cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : STEFAN FLEJS - O.S 12538

VISTORIA : OSNI

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	X	X
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	X	X

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	85/188	85/188	85/188	85/188	85/188	85/188	85/188	85/188	85/188	85/188	X	X
ESC	85/188	85/188	85/188	85/188	85/188	85/188	85/188	85/188	85/188	85/188	X	X

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 46,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	
CNPJ: 33826228000194	

Data: 01/12/2022

ORÇAMENTO

Nº 12.538

O.S.:

Cliente: STEFAN FLEJS

CPF/CNPJ: 049.245.349-78

Fone: (041)99912-64; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.090	GUIA 7MM STD	20,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	20,0	UN
1.833	VALVULA DE ADMISSAO HASTE 7MM	1,0	PC
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	5,0	UN
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	2,0	UN
1.439	SELO D'AGUA AP	2,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	20,0	SE
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	10,0	UN
1.188	RETIFICA DE VALVULA	19,0	SE
1.161	PLAINA FACE	1,0	SE
1.215	MAO DE OBRA RETRABALHO 20V	1,0	MO
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	20,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO- CNC	1,0	MO

