



THIAGO PEREIRA DA SILVA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ORÇAMENTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report	Pg 1
------------------------------	------

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	THIAGO PER	148,0	111,9
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE APSV UNILATERAL - TURBO - STREET PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	THIAGO PER	113,7	88,5
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE APSV UNILATERAL - TURBO - STREET PRO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	38,7	27,8
4,00	73,4	63,6
6,00	108,7	86,8
8,00	129,1	102,8
10,00	140,1	111,3
12,00	145,1	113,2
14,00	148,0	113,7
Average:	111,9	88,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

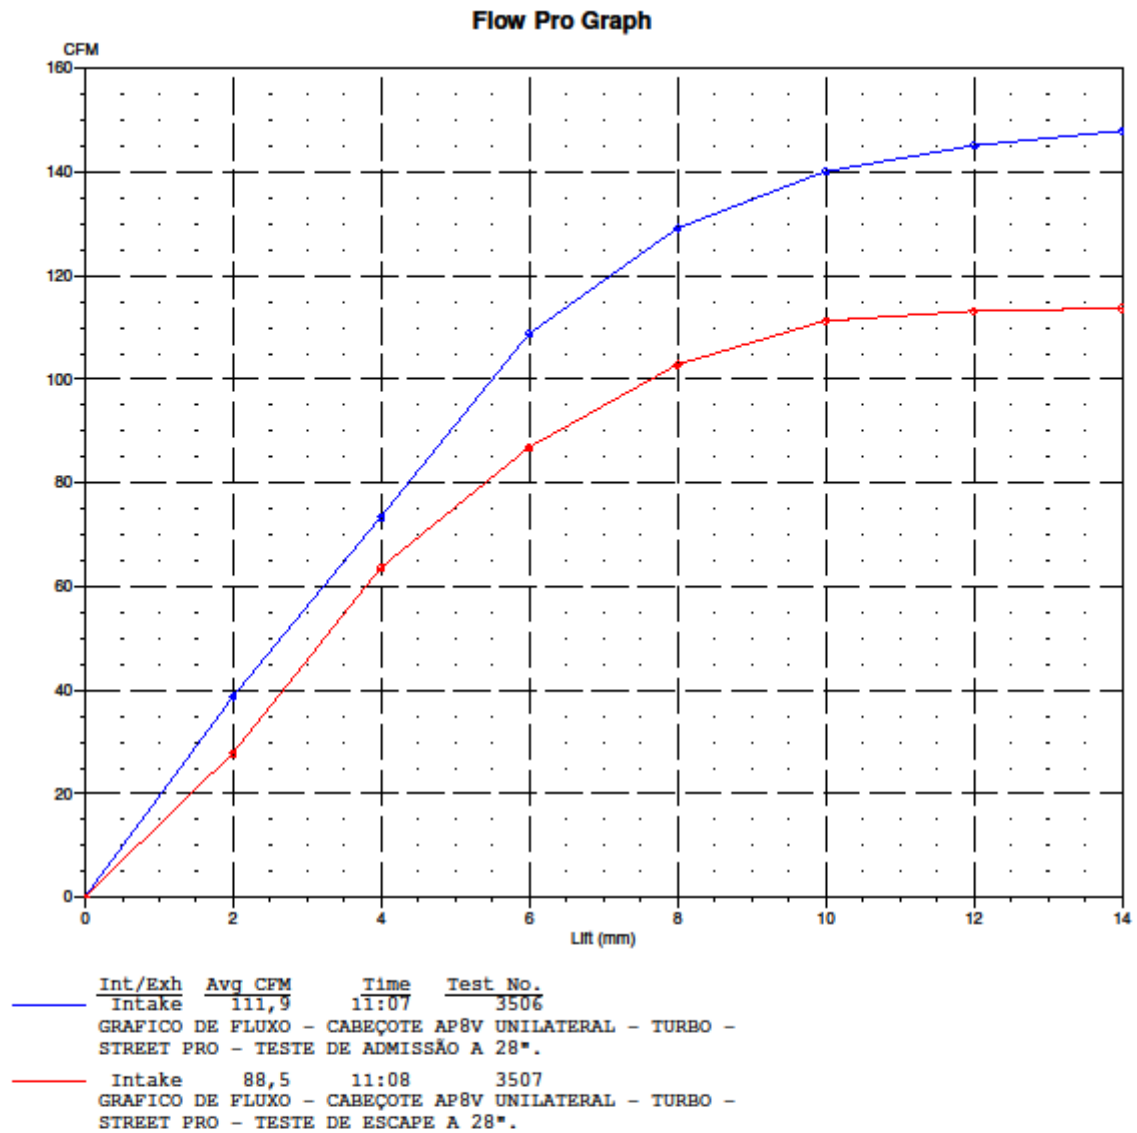


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP8V UNILATERAL - TURBO - STREET PRO - THIAGO PEREIRA DA SILVA.



MEDIDA DAS VALVULAS

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670 E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com CNPJ: 33826228000194

Data: 18/09/2023 **ORÇAMENTO** N° 14.882
 O.S.: 44.457.341

Cliente: THIAGO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 092.093.509-52 Fone: (045)9947-238; Fone 2:	
Endereço:	Placa:
Veículo:	

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.085	GUIA 8MM	8,0	UN			
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	4,0	UN			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0	UN			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0	SE			
1.882	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.939	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE	4,0	UN			
1.944	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO	4,0	UN			
1.458	MAO DE OBRA RETRABALHO 8V	1,0	MO			
2.211	TUCHO 35MM	8,0	UN			
1.179	PLAINA LATERAL	1,0	SE			
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0	SE			
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	8,0	UN			
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE			



CHECK LIST

CLIENTE: LUAN DE LIMA FORNAZARE – O.S 14493

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	70/183	70/183	70/183	70/183	-	-	-	-
ESC	70/183	70/183	70/183	70/183	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 32 CC



ORÇAMENTO

