



ALISSON RAPOZO MAIELLO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6

TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”



Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
STUMPF CABECOTE	TIAGO KFOU	157,0	112,5
GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE 8V STREET - TESTE			
ADMISSAO A28"			

Lift	CCFM
2,00	39,5
4,00	76,6
6,00	109,8
8,00	137,2
10,00	154,8
12,00	157,0
Average:	112,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

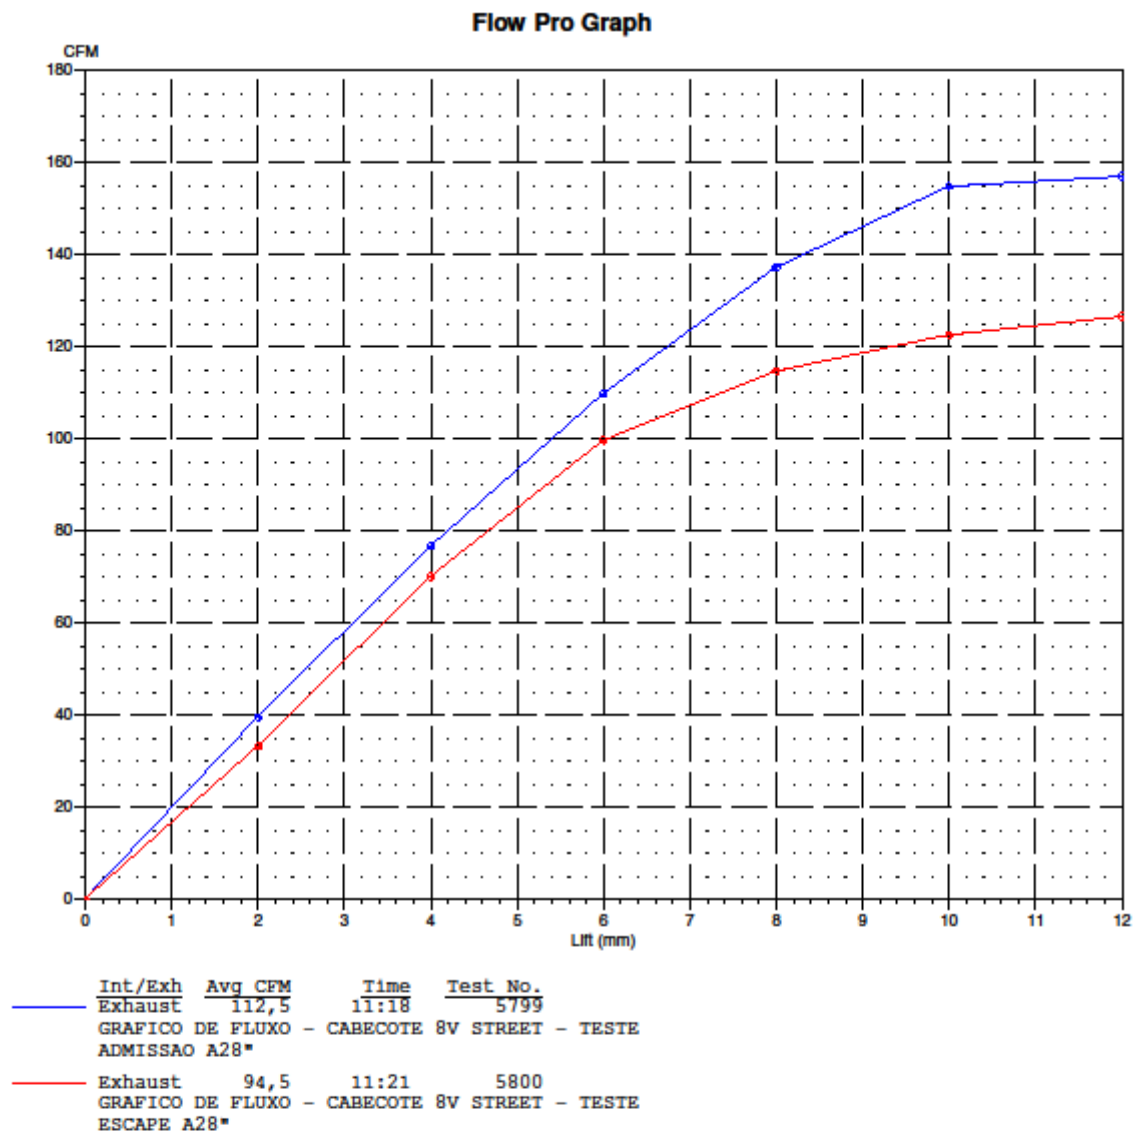


GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE 8V STREET - TESTE - ADMISSAO - ESCAPE A28"



CHECK LIST

CLIENTE: TIAGO KFOURI MOREIRA FERREIRA – O.S 20902
VISTORIA:

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	80/200	80/200	80/200	80/200	-	-	-	-
ESC	80/200	80/200	80/200	80/200	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	-	-	-	-
ESC	√	√	√	√	-	-	-	-

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 28,5 CC
-------------	-------------------	-------------------------------

ORCAMENTO





STUMPF
Tel/Fax: (45)99948-0123
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 29/05/2025

ORÇAMENTO

Nº

20.902

O.S.:

Cliente: TIAGO KFOURI MOREIRA FERREIRA

CPF/CNPJ: 315.672.228-62

Fone: (119)5947-7094 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.179	PLAINA LATERAL	2,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE			
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0	UN			
1.939	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE	4,0	UN			
1.944	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO	4,0	UN			
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.111	MOLA LONGA	8,0	UN			
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN			
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	16,0	UN			
2.211	TUCHO 35MM	8,0	UN			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.056	CASCO F.C. ALEMAO	1,0	UN			
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0	MO			
2.554	KIT INSTALACAO	1,0	4			



