



TIAGO LOPES DAVILA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	TIAGO DAVI	232,1	171,0
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GT116V - STREET - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	TIAGO DAVI	205,9	153,2
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GT116V - STREET - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	57,0	55,6
4,00	112,4	107,6
6,00	156,9	143,5
8,00	187,2	165,9
10,00	221,4	192,7
12,00	230,1	201,5
14,00	232,1	205,9
Average:	171,0	153,2



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

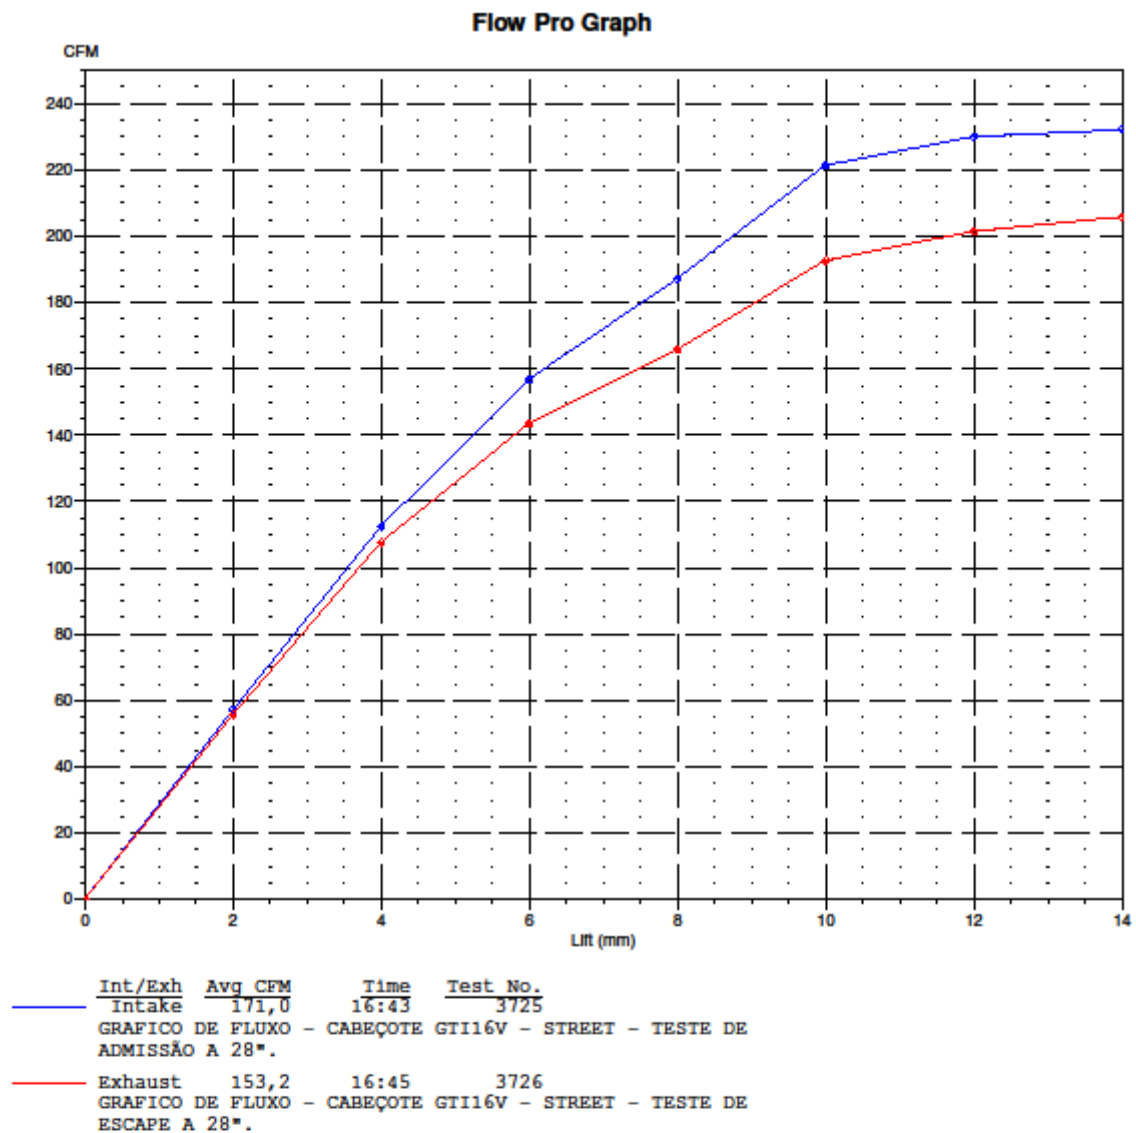


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI16V - STREET - TIAGO DAVILA.



CHECK LIST

CLIENTE: TIAGO LOPES DAVILA – O.S 15528

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	103/235	103/235	103/235	103/235	103/235	103/235	103/235	103/235
ESC	103/235	103/235	103/235	103/235	103/235	103/235	103/235	103/235

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 48,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 09/08/2023

ORÇAMENTO

Nº 14.528

O.S.: 44.457.214

Cliente: TIAGO LOPES DAVILA

CPF/CNPJ: 054474519-14

Fone: (048)9626-8041 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.198	RETRABALHO DE COMANDO	2,0	SE
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	16,0	UN
1.110	MOLA CURTA	16,0	UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO 7MM	16,0	UN
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V(STREET PRO 16V)	1,0	MO
1.090	GUIA 7MM STD	16,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.444	TRAVAMENTO DE TUCHOS	1,0	MO
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.160	PLAINA FACE	1,0	SE
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	12,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	12,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	12,0	UN
1.659	SERVICO DE SOLDA	1,0	SE
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	1,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0	UN

