



VINICIUS LOPES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Report

Pg 1

Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
STUMPF CABEÇOTE	LJR AUTOMA	166,0	122,2
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE SV STREET TURBO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			

Lift	CCFM
2,00	40,0
4,00	80,1
6,00	116,2
8,00	140,1
10,00	153,0
12,00	160,0
14,00	166,0
Average:	122,2



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

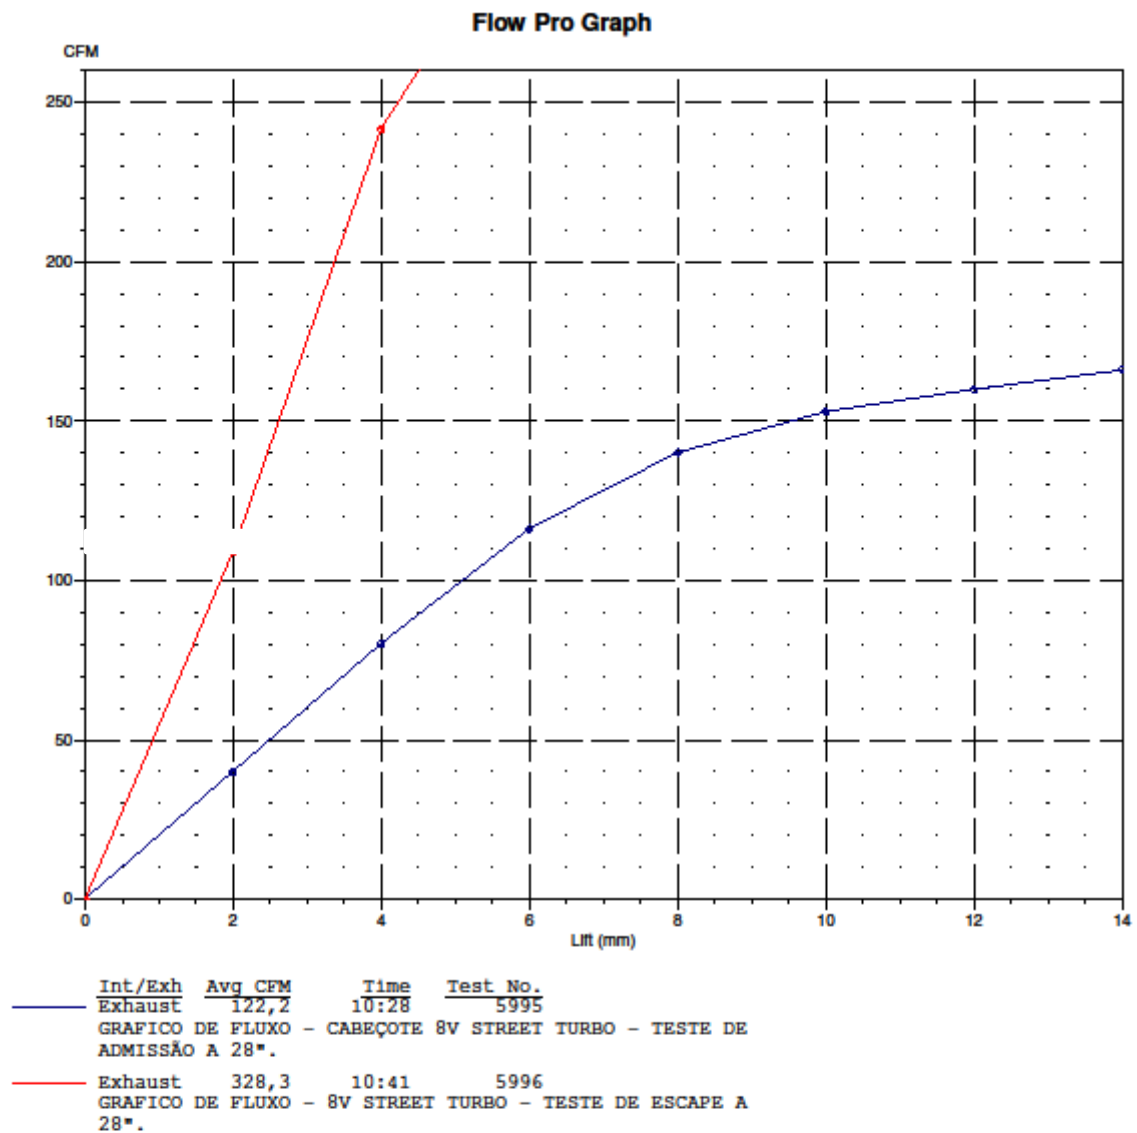


GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE 8V RACING PRO TURBO - TESTE DE ADMISSÃO A 28"



CHECK LIST

CLIENTE: VINICIUS LOPES OS 22029
VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	105	105	105	105	-	-	-	-
ESC	206	206	206	206	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

--



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 08/09/2025

ORÇAMENTO

Nº

22.029

O.S.:

Cliente: VINICIUS LOPES DIAS

CPF/CNPJ: 085.733.258-99

Fone: (031)8218-504; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0	SE
1.458	MAO DE OBRA RETRABALHO 8V	1,0	MO
1.067	COMANDO NACIONAL	1,0	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA- NAO TRINCADO	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE
1.090	GUIA 7MM STD	8,0	UN
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0	UN
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE
1.460	SOLDA ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.690	REFAZER ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.659	SERVICO DE SOLDA- E ACABAMENTO	1,0	SE
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN

