



MARCOS LUCIO/AGRÍCOLA SIMABA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report	Pg 1
------------------------------	------

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	AGRICOLA S	285,3	220,0
	GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE SUBARU - ASPIRADO DE RUA/PISTA - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	AGRICOLA S	241,6	187,4
	GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE SUBARU - ASPIRADO DE RUA/PISTA - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	73,5	68,3
4,00	148,1	135,2
6,00	214,1	189,6
8,00	257,2	213,1
10,00	277,8	228,5
12,00	284,0	235,3
14,00	285,3	241,6
Average:	220,0	187,4



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

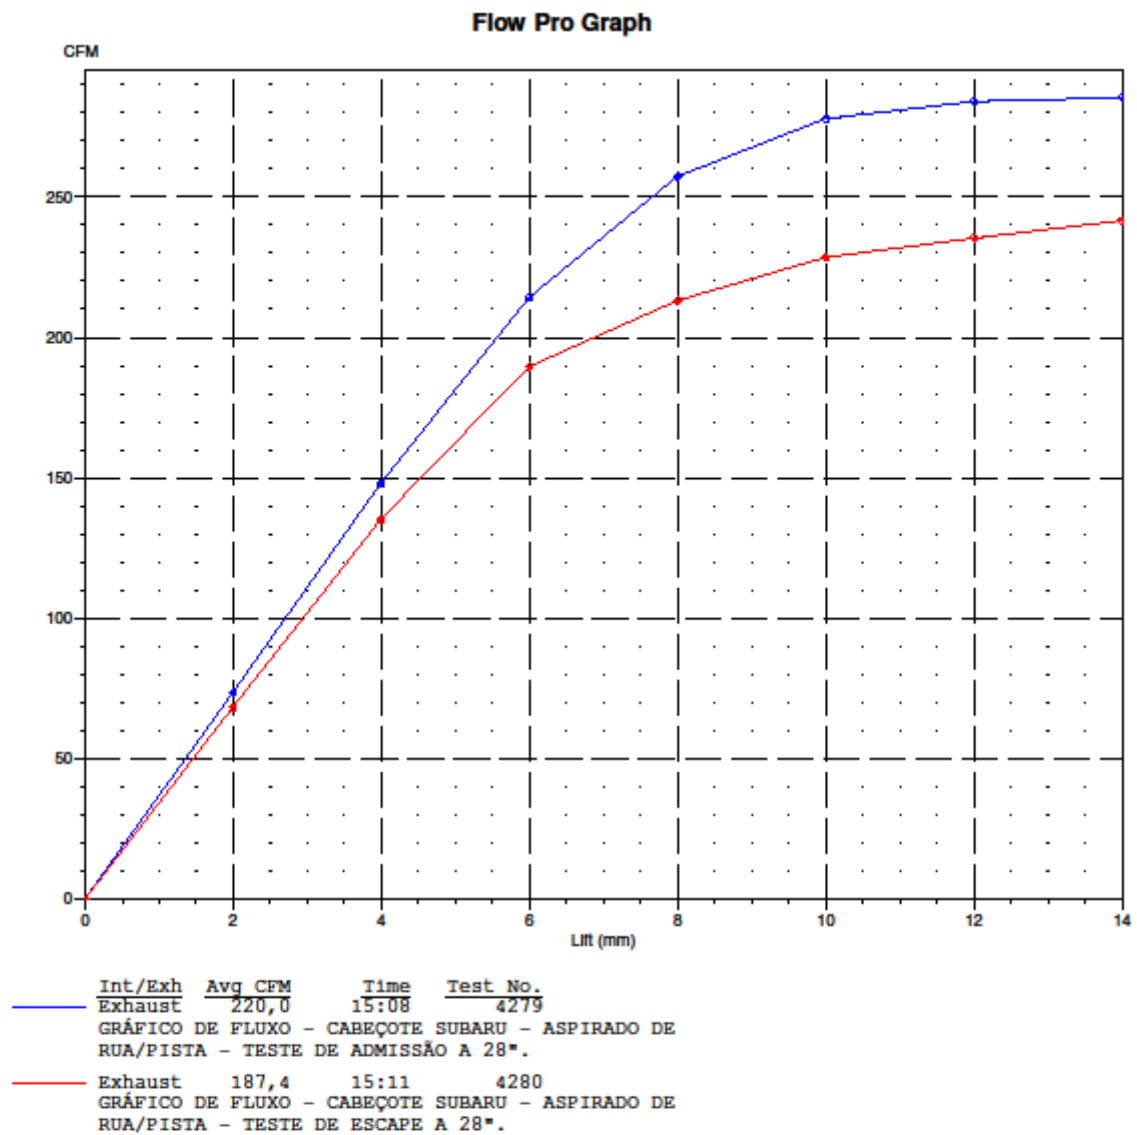


GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE SUBARU.



CHECK LIST

CLIENTE: MARCOS LUCIO/AGRICOLA SIMABA – O.S. 16155

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ESC	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	46/125	46/125	46/125	46/125	46/125	46/125	46/125	46/125
ESC	46/125	46/125	46/125	46/125	46/125	46/125	46/125	46/125

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 46,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 05/02/2024

ORÇAMENTO

Nº

16.155

O.S.:

Cliente: AGRICOLA SIMABA LTDA ME.

CPF/CNPJ: 04.815.160/0001-40

Fone: (077)9947-0726

Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.097	GUIA 8MM	16,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0	SE
1.148	VEDADOR 6MM	16,0	UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	4,0	UN
1.682	PLAINA FACE 8V	2,0	SE
1.477	SERVICO GERAL, PEÇAS (RETIFICA)	1,0	UN
1.544	PLAINA FACE NO BLOCO	2,0	SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.557	BUCHA DE ROSCA - 10X8	1,0	SE

