



ALEXANDRE RESAGUE

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro	Pg 2
------------------------------------	------

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	From CFM
1	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FLUXO CRUZADO TURBO DE PISTA - STAGE TOP - TESTE DE ADMISSÃO A 28".	ALEXANDRE RESAGUE	165,0	122,1
2	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FLUXO CRUZADO TURBO DE PISTA - STAGE TOP - TESTE DE ESCAPE À 28".	ALEXANDRE RESAGUE	125,0	94,9

Azada	CCFM No. 1	No. 2
2,00	40,2	30,6
4,00	80,0	69,0
6,00	116,0	90,1
8,00	140,3	108,2
10,00	153,2	118,2
12,00	160,0	123,0
14,00	165,0	125,0
Average:	122,1	94,9

DADOS DE FLUXO - CABEÇOTE FLUXO CRUZADO TURBO DE PISTA - STAGE TOP - ALEXANDRE RESAGUE.



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

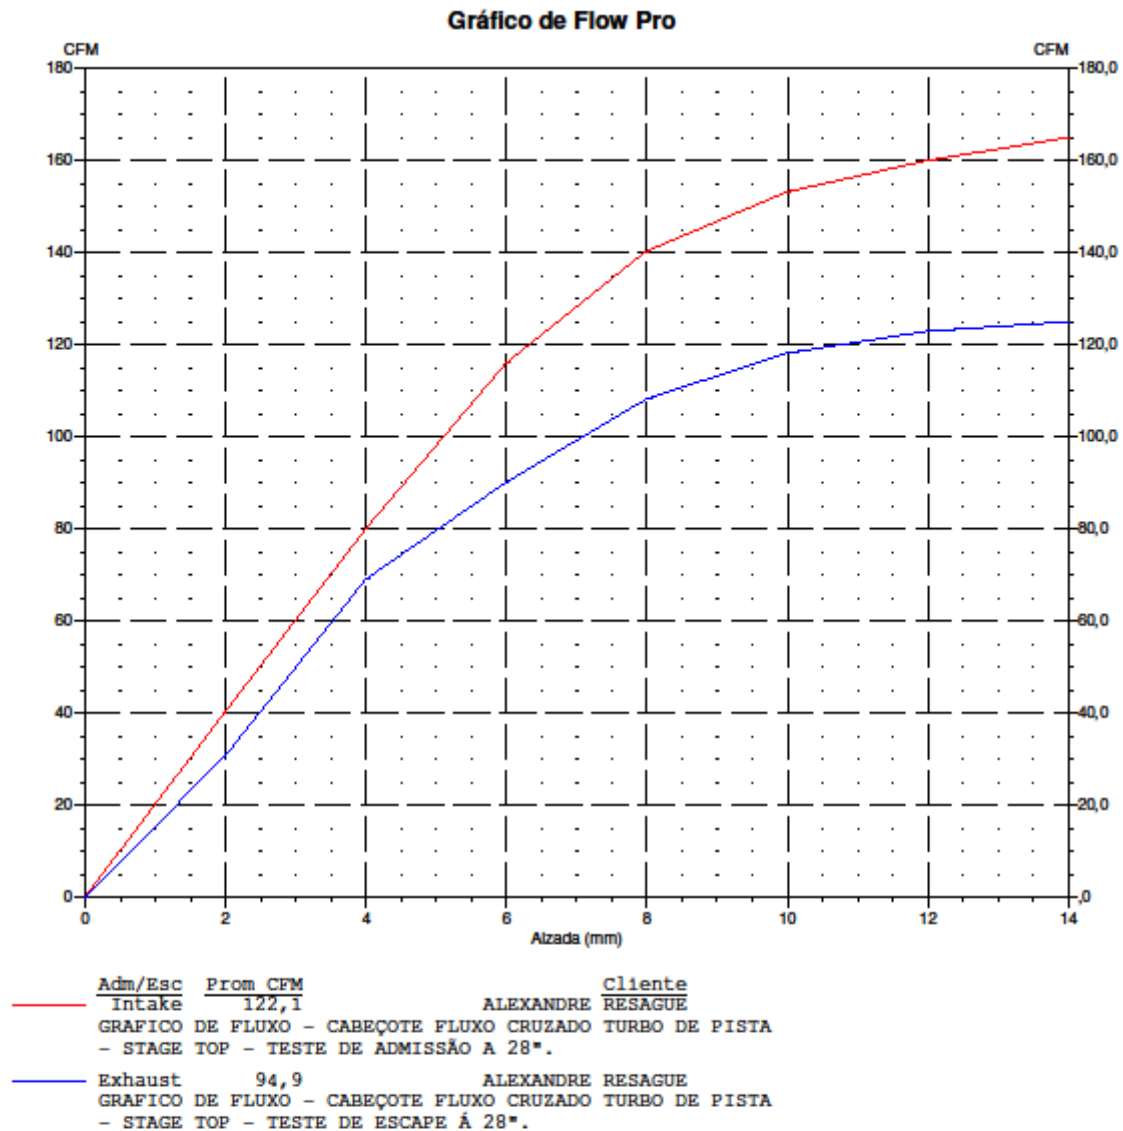


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FLUXO CRUZADO TURBO DE PISTA - STAGE TOP - ALEXANDRE RESAGUE



CHECK LIST

CLIENTE: ALEXANDRE RESAGUE – OS 9966

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	95/195	95/195	95/195	95/195	-	-	-	-
ESC	95/195	95/195	95/195	95/195	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 33,2 CC



ORÇAMENTO

STUMPF	
Tel/Fax: (45)99948-0123	
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 15/12/2021 ORÇAMENTO Nº 9.966
O.S.: 3.351

Cliente: ALEXANDRE RESAGUE	Fone:	Fone 2:
CPF/CNPJ: 306.639.838-27		
Endereço:		
Veículo:		Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN	28,75
1.270	BUCHA DE REFORÇO DO ESCAPE	2,0	SE	16,05
1.438	GUIA PARA BLOCO	2,0	UN	16,05
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN	8,03
1.056	CASCO F.C. ALEMAO	1,0	UN	1.177,01
1.146	SEDE DE BERILIO	8,0	UN	160,50
1.085	GUIA 8MM	8,0	UN	21,20
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	8,0	PC	25,00
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE	128,42
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE	37,45
1.159	Plaina Face	1,0	SE	112,37
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE	26,75
1.179	PLAINA LATERAL	2,0	SE	112,36
1.258	Mandrilhar Mancais 8v	1,0	SE	192,62
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0	MO	2.782,24
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE	32,10
1.202	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0	SE	235,42
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0	MO	428,00
1.192	ABRIR ALOJAMENTO DE TUCHO	8,0	SE	32,10
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN	10,70

