



ANTONIO ALBERTO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO.....	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO

FLOW PRO Compare Data Report	Pg 1
------------------------------	------

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEQOTE	ANTONIO AL	91,9	66,3
	TESTE CABEQOTE FLUXO CRUZADO ANTONIO ALBERTO - ADM A 10".			
2	STUMPF CABEQOTE	ANTONIO AL	156,9	116,7
	TESTE CABEQOTE FLUXO CRUZADO ANTONIO ALBERTO - ADM A 28".			
3	STUMPF CABEQOTE	ANTONIO AL	70,9	54,5
	TESTE CABEQOTE FLUXO CRUZADO ANTONIO ALBERTO - ESC A 10".			
4	STUMPF CABEQOTE	ANTONIO AL	116,1	84,2
	TESTE CABEQOTE FLUXO CRUZADO ANTONIO ALBERTO - ESC A 28".			

Lift	CCFM			
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
2,00	12,8	36,3	9,1	15,0
4,00	43,0	73,9	41,9	59,9
6,00	63,4	110,3	56,2	79,4
8,00	77,9	134,8	64,6	97,4
10,00	85,6	149,3	68,4	107,8
12,00	89,5	155,1	70,9	113,9
14,00	91,9	156,9	70,4	116,1
-	-	116,7	54,5	84,2



GRAFICOS DE FLUXO

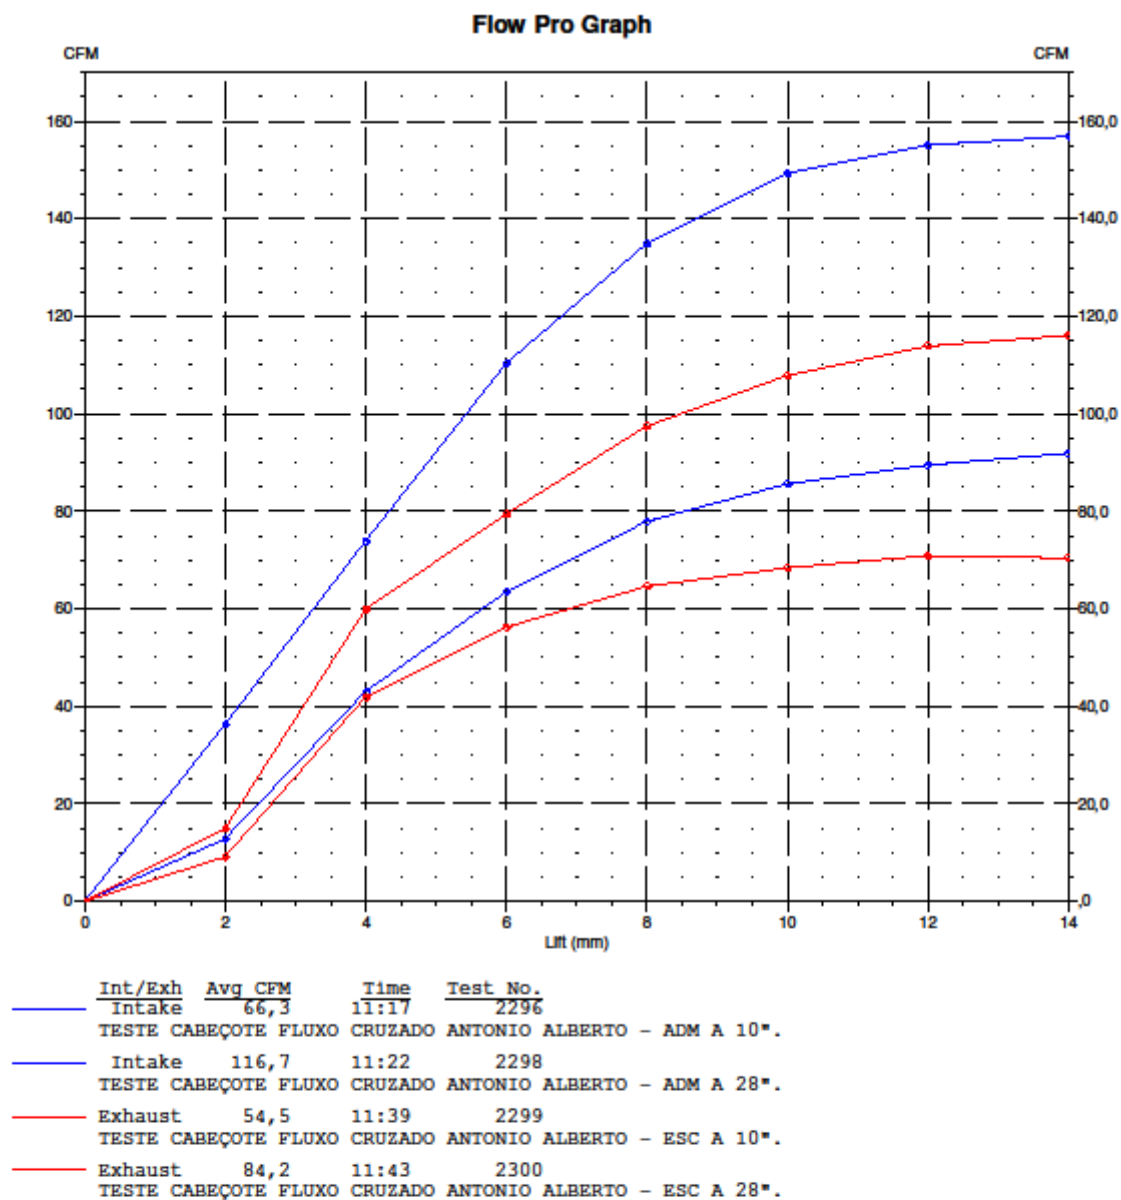


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MEXICO FLUXO CRUZADO - ASPIRADO RUA - ANTONIO ALBERTO.



CHECK LIST

CLIENTE: EMERSON LIMA – OS 11910
VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	75/190	75/190	75/190	75/190	-	-	-	-
ESC	75/190	75/190	75/190	75/190	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 33,2 CC
-------------	-------------------	-------------------------------



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 04/01/2023

ORÇAMENTO

Nº 12.714

O.S.: 44.455.610

Cliente: ANTONIO ALBERTO MACHADO CONTO

CPF/CNPJ: 648.010.049-20

Fone: (045)9919-0001 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.277	PRISIONEIRO DA TAMPA DE VALVULA	8,0 UN
1.276	PRISIONEIRO DE ESCAPE	8,0 UN
1.090	GUIA 7MM STD	8,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
1.147	SEDE DE ACO	8,0 UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0 UN
1.782	SERVICO DE FRESA- ROSCA NIPLE COLETOR	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.159	PLAINA FACE	1,0 SE
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0 SE
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0 MO
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.477	SERVICO GERAL- TRATAMENTO DLC COMANDO	1,0 UN
1.477	SERVICO GERAL- TRATAMENTO TUCHO	1,0 UN
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0 MO
1.477	SERVICO GERAL- TRATAMENTO DLC PINO BIELA	4,0 UN

