



CHRISTIAN MATTIVE

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



## SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28” .....	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28” .....	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO .....	5
4. ORÇAMENTO.....	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO REVISAO .....	7
6. ORÇAMENTO REVISAO.....	8



## TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro					Pg 1
No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	Prom CFM	
1	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TESTE DE ADMISSÃO À 28".	CHRISTIAN MATTIVE TURISMO NACIONAL -	152,5	101,9	
2	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TESTE DE ESCAPE À 28".	CHRISTIAN MATTIVE TURISMO NACIONAL -	119,5	85,6	

Azada	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	31,8	29,7
4,00	66,6	65,7
6,00	99,1	83,6
8,00	122,7	101,7
10,00	138,8	113,4
12,00	152,5	119,5
Average:	101,9	85,6

DADOS DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TURISMO NACIONAL ARGENTINO - CHRISTIAN MATTIVE.



# GRAFICOS DE FLUXO A 28"

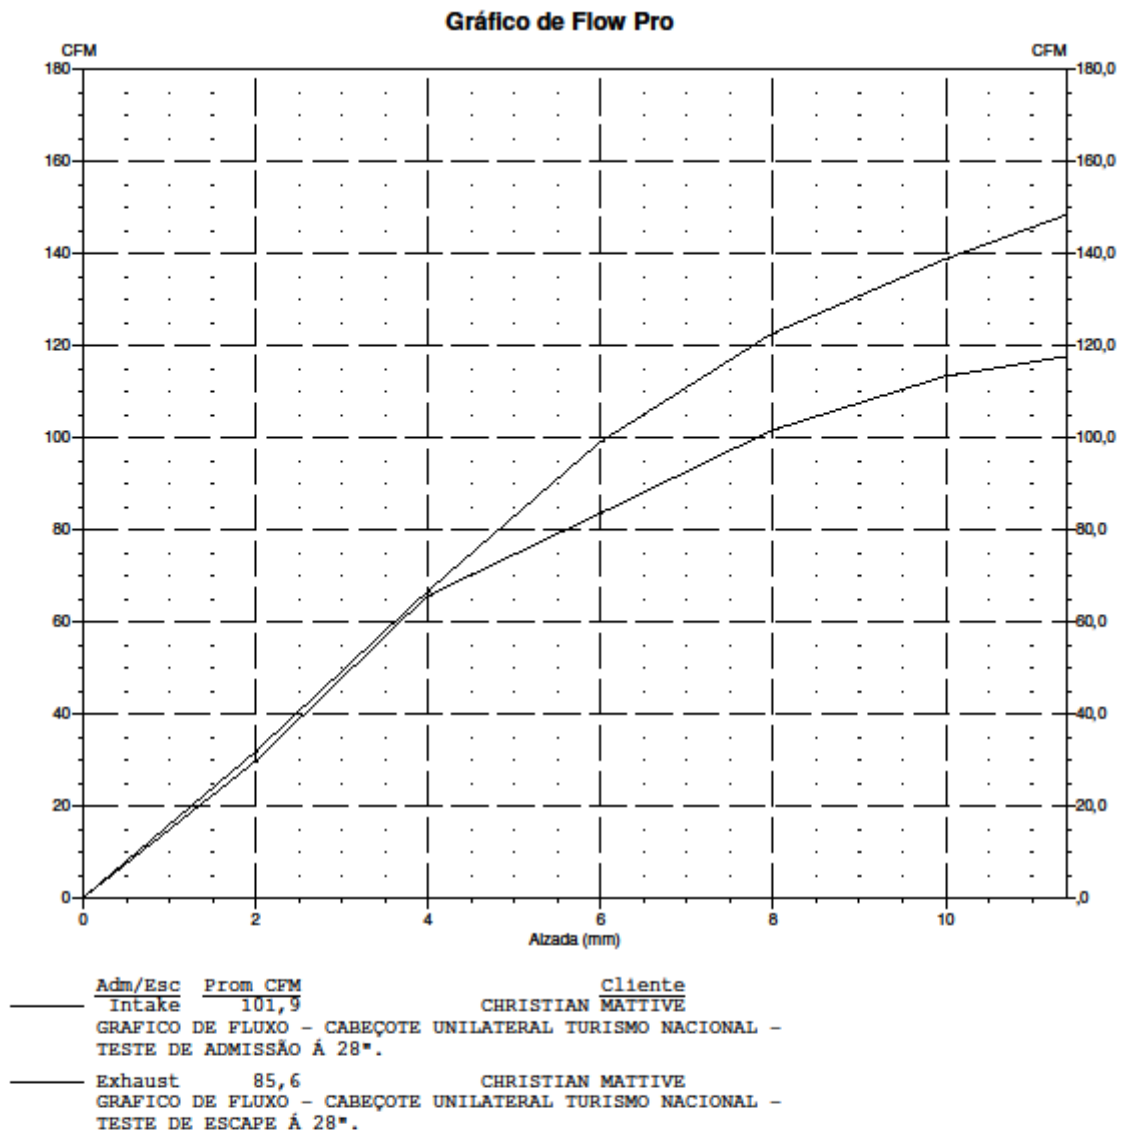


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TURISMO NACIONAL ARGENTINO - CHRISTIAN MATTIVE.



## CHECK LIST

**CLIENTE:** CHRISTIAN MATTIVE – OS 10627

**VISTORIA:** OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	120/276	120/276	120/276	120/276	-	-	-	-
ESC	120/276	120/276	120/276	120/276	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	-	-	-	-
ESC	√	√	√	√	-	-	-	-

**OBS:**      VEDAÇÃO OK

**VOLUME CAMARA:** 29,2 CC



## ORÇAMENTO

	<b>STUMPF</b>	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 12/04/2022

### ORÇAMENTO

Nº 10.627

O.S.: 54

Cliente: CHRISTIAN MATTIVE

CPF/CNPJ:

Fone:

Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.631	MOLA RACING LONGA	8,0 PC
1.029	PRATO DE ALUMINIO	8,0 UN
1.048	CASCO AP	1,0 UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0 UN
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	2,0 UN
1.084	GUIA 8MM	8,0 UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0 UN
1.119	TUCHO 35MM 6,5MM	8,0 UN
1.002	VALVULA DE INOX NACIONAL ADM	4,0 UN
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	4,0 UN
1.439	SELO D'AGUA AP	1,0 UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0 MO
1.159	PLAINA FACE	1,0 SE



## CHECK LIST REVISAO

**CLIENTE:** CHRISTIAN MATTIVE – OS 20959

**VISTORIA:** RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	118/283	118/283	118/283	118/283	-	-	-	-
ESC	118/283	118/283	118/283	118/283	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	-	-	-	-
ESC	√	√	√	√	-	-	-	-

**OBS:**      VEDAÇÃO OK

**VOLUME CAMARA:** 29,0CC



## ORCAMENTO REVISAO 13/06/2025

	<b>STUMPF</b>		
	Tel/Fax: (45)99948-0123		
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR		
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194	
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com			

Data: 04/06/2025

### ORCAMENTO

Nº

20.964

O.S.:

Cliente: CHRISTIAN MATTIVE

CPF/CNPJ:

Fone:

Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.659	SERVICO DE SOLDA. E ACABAMENTO	1,0	SE
1.192	ABRIR ALOJAMENTO DE TUCHO	8,0	SE
2.708	TUCHO 35,3MM	8,0	UN
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	2,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	8,0	UN
1.256	ADAPTAR K-LINE	8,0	SE

