



DIEGO RIBEIRO - HUGO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 03/05/2024	7
6. ORÇAMENTO REVISÃO 03/05/2024	8
7. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 22/10/2024	9
8. ORÇAMENTO REVISÃO 22/10/2024	10



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 10"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	DIEGO RIBE	85,0	60,7
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - ASPIRADO - MARCAS - TESTE DE ADMISSÃO A 10".				
2	STUMPF CABEÇOTE	DIEGO RIBE	60,0	43,1
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - ASPIRADO - MARCAS - TESTE DE ESCAPE A 10".				

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	20,1	14,8
4,00	40,5	29,5
6,00	55,5	39,3
8,00	66,5	47,2
10,00	76,3	53,1
12,00	81,3	57,9
14,00	85,0	60,0
Average:	60,7	43,1



GRAFICOS DE FLUXO A 10"

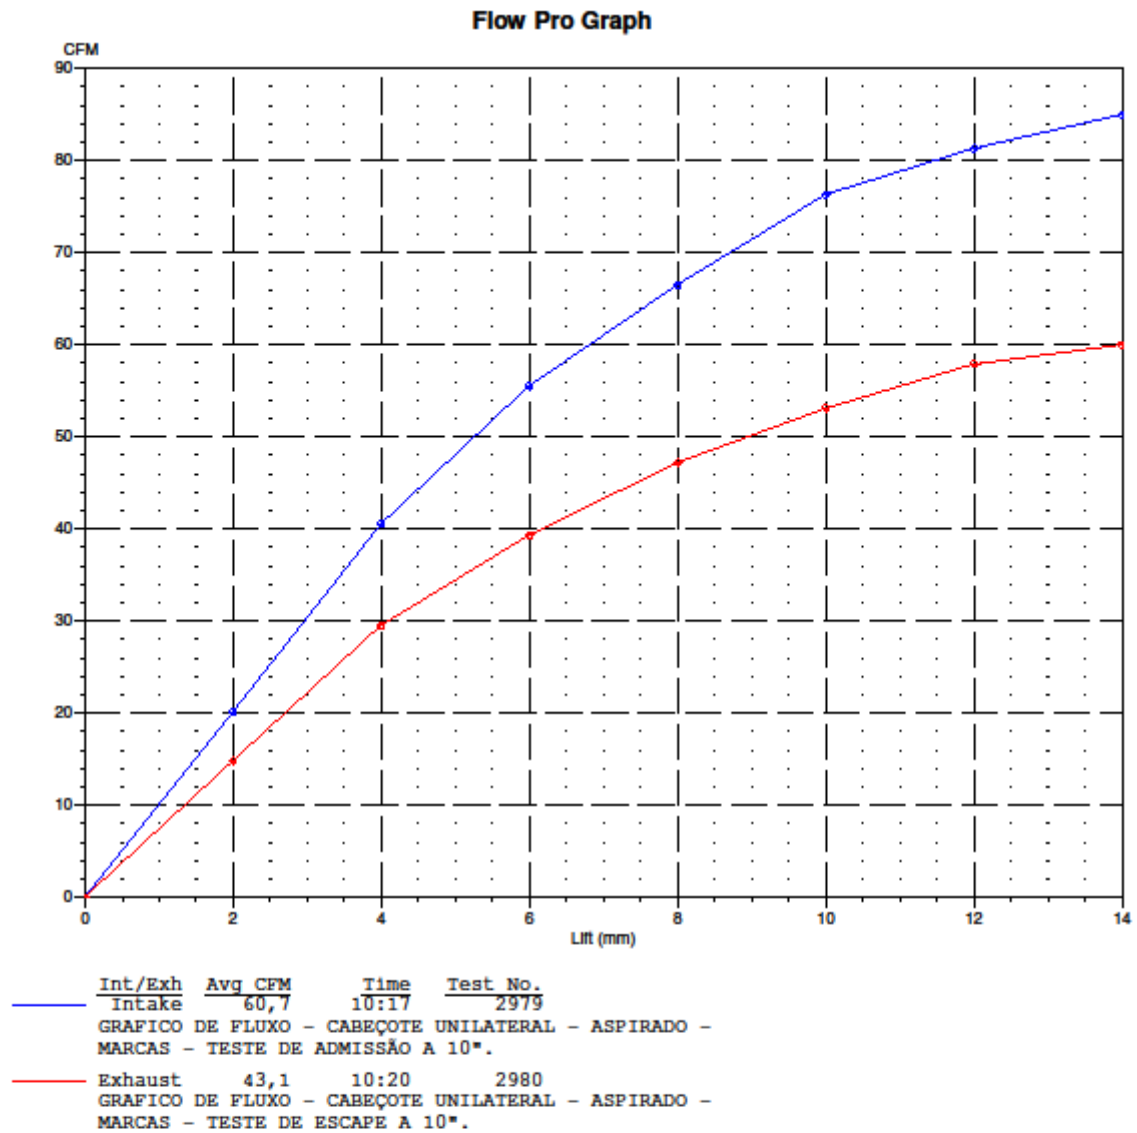


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - ASPIRADO - MARCAS - DIEGO RIBEIRO.



CHECK LIST

CLIENTE: DIEGO RIBEIRO – HUGO – O.S 14245

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	58/134	58/134	58/134	58/134	-	-	-	-
ESC	58/134	58/134	58/134	58/134	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 23 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 17/07/2023 ORÇAMENTO N° 14.245
O.S.: 4.444.766

Cliente: DIEGO RIBEIRO	
CPF/CNPJ: 04615688919	Fone: (077)99173-71! Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN			
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.090	GUIA 7MM STD	8,0	UN			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.179	PLAINA LATERAL	1,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE			
1.222	MAO DE OBRA RETRABALHO MARCAS 8V	1,0	MO			
1.277	PRISIONEIRO DA TAMPA DE VALVULA	8,0	UN			
1.276	PRISIONEIRO DE ESCAPE	8,0	UN			
1.166	REBAIXAR CABECOTE AP	1,0	SE			
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN			
1.434	CALCO DE TUCHO EM ACO	8,0	UN			
1.659	SERVICO DE SOLDA- ORELHA SUPORTE DO ALTERNADOR	1,0	SE			



CHECK LIST REVISÃO 03/05/2024

CLIENTE: DIEGO RIBEIRO – HUGO – O.S 16963

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	57/132	57/132	57/132	57/132	-	-	-	-
ESC	57/132	57/132	57/132	57/132	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 23 CC



ORÇAMENTO REVISÃO 03/05/2024

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 24/04/2024

ORÇAMENTO

Nº 16.963

O.S.: 44.465.156.631

Cliente: DIEGO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 04615688919

Fone: (077)99173-71! Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.025	VALVULA ORIGINAL. ESC	4,0	UN			
1.025	VALVULA ORIGINAL. ADM	1,0	UN			
1.145	TUCHO ORIGINAL HIDRAULICO	8,0	UN			
1.256	ADAPTAR K-LINE	8,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	3,0	SE			
1.543	SOLDA FACE	1,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	7,0	UN			
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	1,0	UN			



CHECK LIST REVISÃO 22/10/2024

CLIENTE: DIEGO RIBEIRO – HUGO – O.S 18806

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	55/128	55/128	55/128	55/128	-	-	-	-
ESC	55/128	55/128	55/128	55/128	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 22 CC



ORÇAMENTO REVISÃO 22/10/2024

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 07/10/2024

ORÇAMENTO

Nº

18.806

O.S.:

Cliente: DIEGO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 04615688919

Fone: (077)99173-71! Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.659	SERVICO DE SOLDA. E ACABAMENTO	1,0	SE			
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	4,0	UN			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0	UN			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0	SE			
1.090	GUIA 7MM STD	4,0	UN			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			
1.256	ADAPTAR K-LINE	4,0	SE			

