



GUSTAVO PADILHA NOVELLI

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 31/10/2024	7
6. ORÇAMENTO REVISÃO 31/10/2024	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	GUSTAVO PA	156,9	116,5
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V F.C. - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	GUSTAVO PA	132,1	99,4
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V F.C. - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	37,8	34,7
4,00	75,2	67,8
6,00	109,8	92,4
8,00	133,7	114,0
10,00	151,4	124,9
12,00	153,9	130,0
14,00	156,9	132,1
Average:	117,0	99,4



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

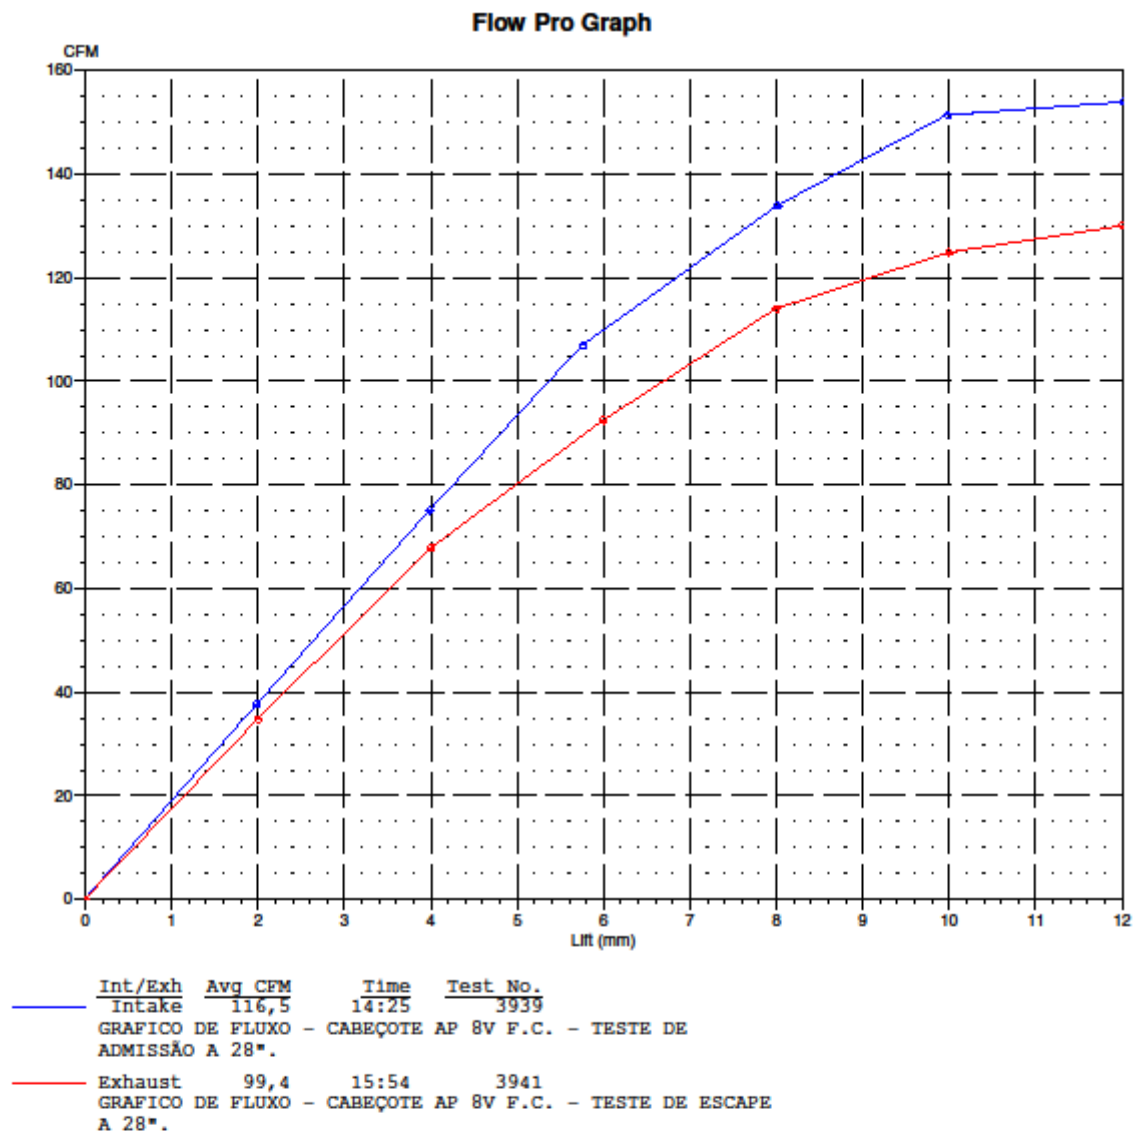


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V F.C. - GUSTAVO PADILHA.



CHECK LIST

CLIENTE: GUSTAVO PADILHA NOVELLI – O.S 15755

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	130/260	130/260	130/260	130/260	-	-	-	-
ESC	130/260	130/260	130/260	130/260	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 31,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 20/12/2023

ORÇAMENTO

Nº 15.755

O.S.: 44.457.790

Cliente: GUSTAVO PADILHA NOVELLI

CPF/CNPJ: 002.652.790-11

Fone: (054)99805-59 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.146	SEDE DE BERILIO	8,0	UN
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE
1.615	RETRABALHO CAMARA CNC	1,0	MO
1.659	SERVICO DE SOLDA- DUTOS	1,0	SE
1.090	GUIA 7MM STD- ADM	4,0	UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO 7MM	8,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE
1.111	MOLA LONGA	8,0	UN
1.203	SOLDA ALOJAMENTO DE SEDE	1,0	SE
1.477	SERVICO GERAL - SERVIÇO DE ROSCA	1,0	UN
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN
1.439	SELO D'AGUA AP	1,0	UN
1.447	PLAINA LATERAL	1,0	SE
1.477	SERVICO GERAL- REFAZER ROSCA ADMISSÃO	2,0	UN



CHECK LIST REVISÃO 31/10/2024

CLIENTE: GUSTAVO PADILHA NOVELLI – O.S 18768

VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	116/246	116/246	116/246	116/246	-	-	-	-
ESC	116/246	116/246	116/246	116/246	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 30,4 CC



ORÇAMENTO REVISÃO 31/10/2024

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194 E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 02/10/2024 **ORÇAMENTO** Nº 18.768
O.S.:

Cliente: GUSTAVO PADILHA NOVELLI CPF/CNPJ: 002.652.790-11 Fone: (054)99605-59 Fone 2:	
Endereço:	Placa:
Veículo:	

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.090	GUIA 7MM STD	8,0	UN			
1.543	SOLDA FACE. TRINCO	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	4,0	SE			
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE			
1.882	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN			
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			
2.185	VALVULA INOX IMP. H7 38MM	3,0	UN			
2.153	VALVULA INOX IMPORTADA H7	1,0	UN			
1.278	ROSCA HELICOIDE 8MM	2,0	UN			

