



GUSTAVO VALE NICACIO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS 17/01/2024.....	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 17/01/2024	6
5. ORÇAMENTO REVISÃO 17/01/2024	7



CHECK LIST

CLIENTE: GUSTAVO VALE NICACIO – O.S 14707

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	124/250	124/250	124/250	124/250	-	-	-	-
ESC	124/250	124/250	124/250	124/250	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 33,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 30/08/2023

ORÇAMENTO

Nº

14.707

O.S.:

Cliente: GUSTAVO VALE NICACIO

CPF/CNPJ: 088.885.176-97

Fone: (031)9910-4871 Fone 2:

Endereço:

Veículo:



Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0 SE
1.938	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO	4,0 UN
1.948	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE	4,0 UN
1.085	GUIA 8MM	8,0 UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	2,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	2,0 UN
1.146	SEDE DE BERILIO	2,0 UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.859	SERVICO DE SOLDA- 2º CIL	1,0 SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0 SE
1.150	VEDADOR 8MM	8,0 UN
1.645	MAO DE OBRA DE ACABAMENTO- 2º CIL	1,0 SE
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0 MO
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0 UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0 UN
1.439	SELO DAGUA AP	1,0 UN
1.715	AJUSTE DE MANCAL	1,0 SE
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	8,0 SE
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	8,0 UN



MEDIDA DAS VALVULAS

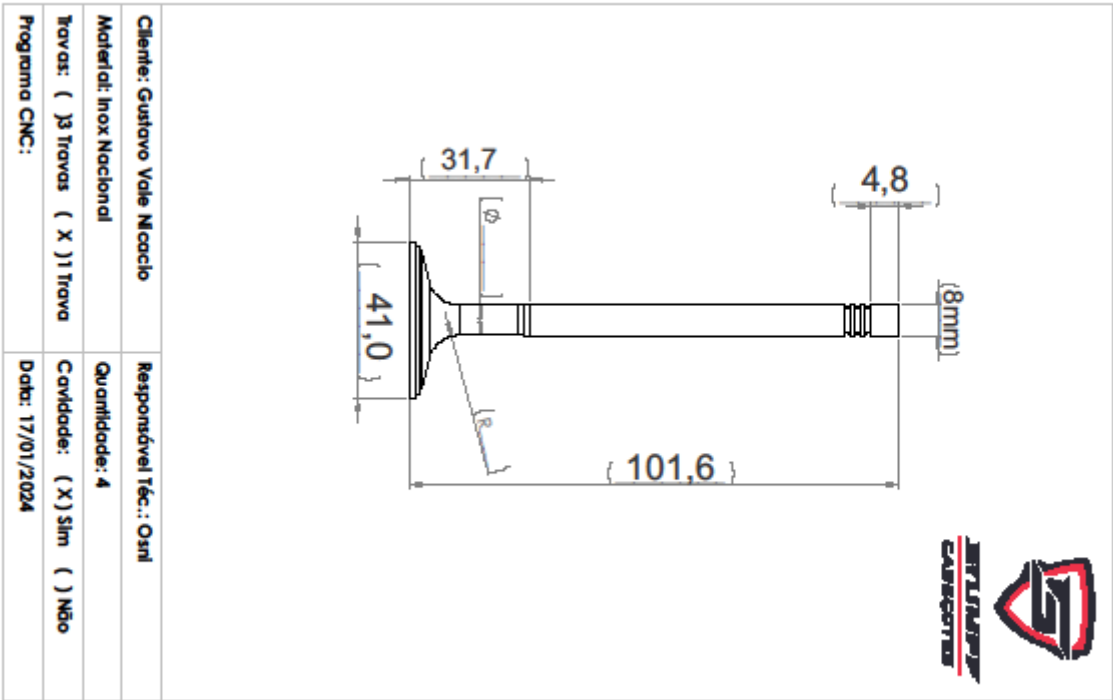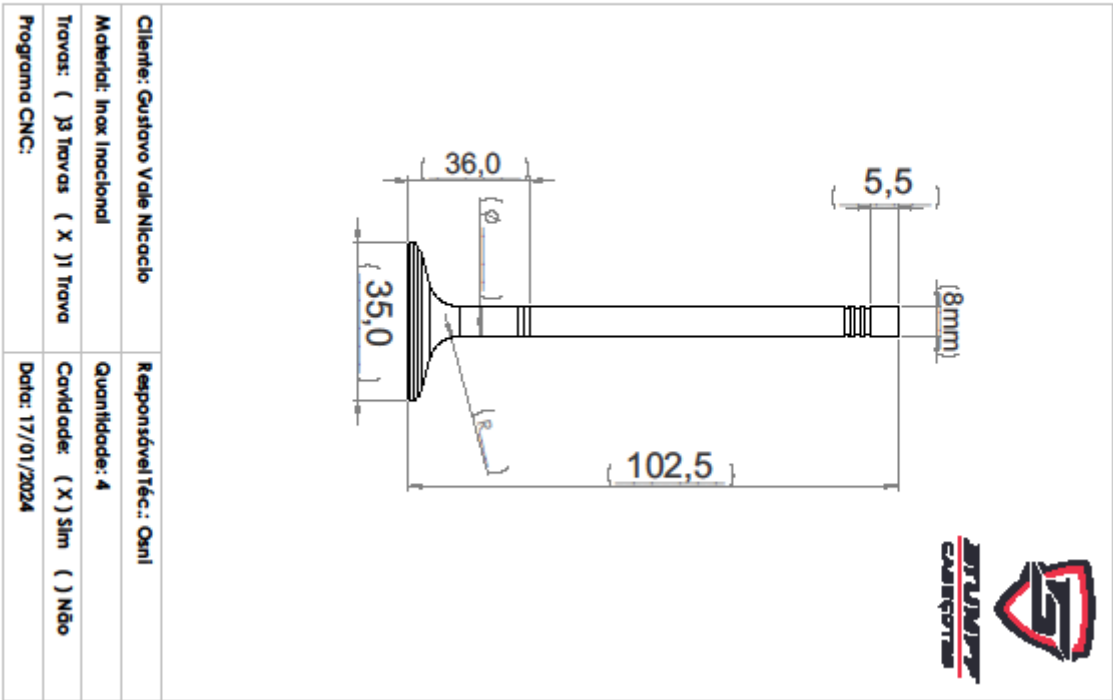

CHECK LIST REVISÃO 17/01/2024

CLIENTE: GUSTAVO VALE NICACIO – O.S 15798

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	125/250	125/250	125/250	125/250	-	-	-	-
ESC	125/250	125/250	125/250	125/250	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 33,6 CC



ORÇAMENTO REVISÃO 17/01/2024

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 04/01/2024

ORÇAMENTO

Nº 15.798

O.S.:

Cliente: GUSTAVO VALE NICACIO

CPF/CNPJ: 098.885.178-97

Fone: (031)9910-4671 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.659	SERVICO DE SOLDA	1,0	SE			
1.645	MAO DE OBRA DE ACABAMENTO	1,0	SE			
1.615	RETRABALHO CAMARA CNC	1,0	MO			
1.146	SEDE DE BERILIO	3,0	UN			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	3,0	UN			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	3,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	7,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			
1.939	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE	1,0	UN			

