



JEFERSON IAREKE

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 09/03/2023	7
6. ORÇAMENTO REVISÃO 09/03/2023	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	JEFERSON I	156,5	122,5	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FLUXO CRUZADO - TURBO DE PISTA - STAGE TOP - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	JEFERSON I	124,2	93,9	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FLUXO CRUZADO - TURBO DE PISTA - STAGE TOP - TESTE DE ESCAPE A 28".				

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	43,1	26,2
4,00	81,9	71,8
6,00	121,1	90,4
8,00	145,4	107,5
10,00	154,1	115,7
11,20	155,0	119,1
12,00	155,6	121,4
14,00	156,5	124,2
Average:	126,6	97,0



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

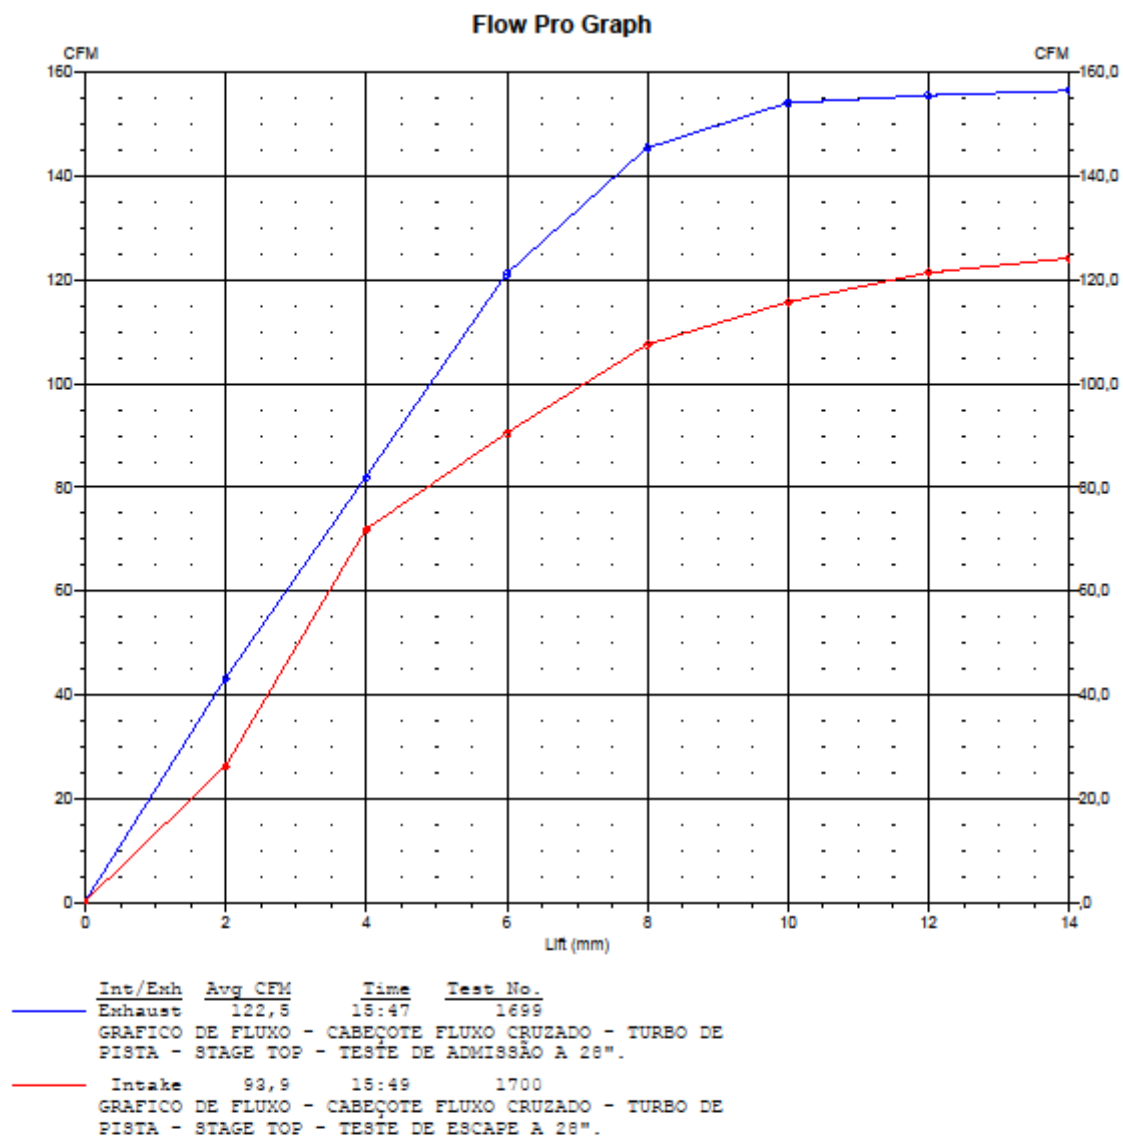


GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE FLUXO CRUZADO - TURBO DE PISTA - STAGE TOP - JEFERSON IAREKE



CHECK LIST

CLIENTE: JEFERSON IAREKE – OS 12067

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	135/290	135/290	135/290	135/290	-	-	-	-
ESC	135/290	135/290	135/290	135/290	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 33,0 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 26/09/2022

ORÇAMENTO

Nº 12.067

O.S.: 4.445.636

Cliente: JEFERSON IAREKE

CPF/CNPJ: 041.156.419.87

Fone:

Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.146	SEDE DE BERILIO	8,0 UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0 UN
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0 SE
1.084	GUIA 8MM	8,0 UN
1.056	CASCO F.C. ALEMAO	1,0 UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	4,0 SE
1.947	CALCO DE ACO 0,5MM	7,0 UN
1.121	TUCHO 37MM	8,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0 MO
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0 SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0 SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0 SE
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0 SE
1.919	ACABAMENTO DIMPLE - 8V	1,0 SE
1.192	ABRIR ALOJAMENTO DE TUCHO	8,0 SE



CHECK LIST REVISÃO

CLIENTE: JEFERSON IAREKE – O.S 13111

VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	128/279	128/279	128/279	128/279	-	-	-	-
ESC	128/279	128/279	128/279	128/279	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 32,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 07/03/2023 **ORÇAMENTO** N° **13.111**
O.S.: **44.456.603**

Cliente: JEFERSON IAREKE		
CPF/CNPJ: 041.158.419.67	Fone:	Fone 2:
Endereço:		
Veículo:		Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.452	CABECOTE REVISAO AP8V	1,0	SE			
1.941	VALVULA ESC INOX IMPORTADA H8- 35,5MM CILINDRO 1	1,0	UN			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.527	TUCHO IMPORTADO	4,0	UN			
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	1,0	UN			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE- NEWAY	8,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	7,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			

