



LEONARDO VIVIAN

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7
6. ORÇAMENTO.....	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1	
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM		
1	STUMPF CABEÇOTE	LEONARDO V	232,1	171,0		
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - ASPIRADO - RACING - TESTE DE ADMISSÃO A 28".					
2	STUMPF CABEÇOTE	LEONARDO V	205,9	153,2		
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - ASPIRADO - RACING - TESTE DE ESCAPE A 28".					

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	57,0	55,6
4,00	112,4	107,6
6,00	156,9	143,5
8,00	187,2	165,9
10,00	221,4	192,7
12,00	230,1	201,5
14,00	232,1	205,9
Average:	171,0	153,2



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

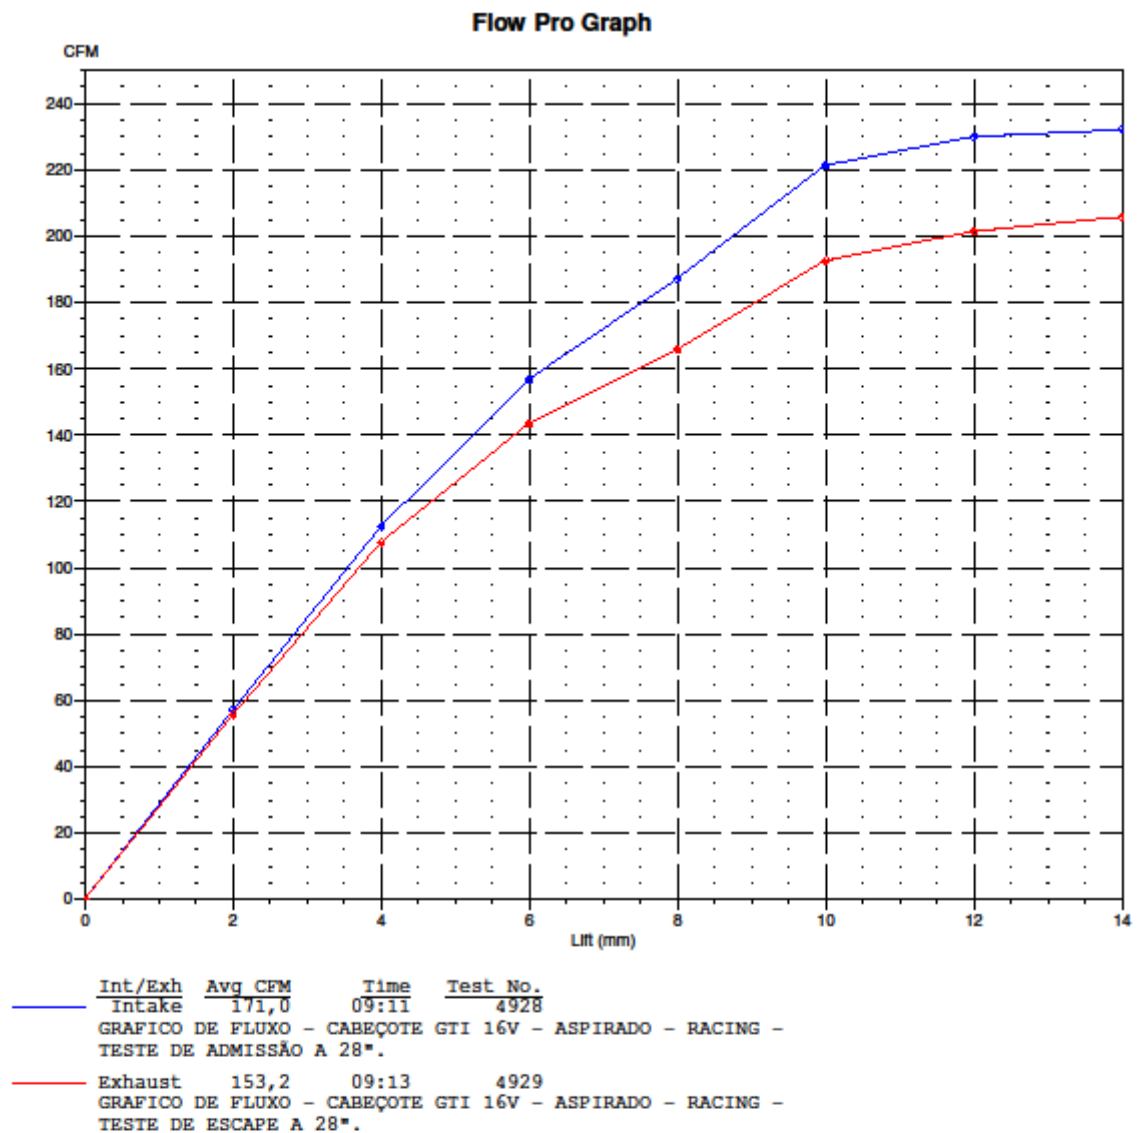


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - ASPIRADO - RACING - LEONARDO VIVIAN.



TABELA COM DADOS DO COMANDO


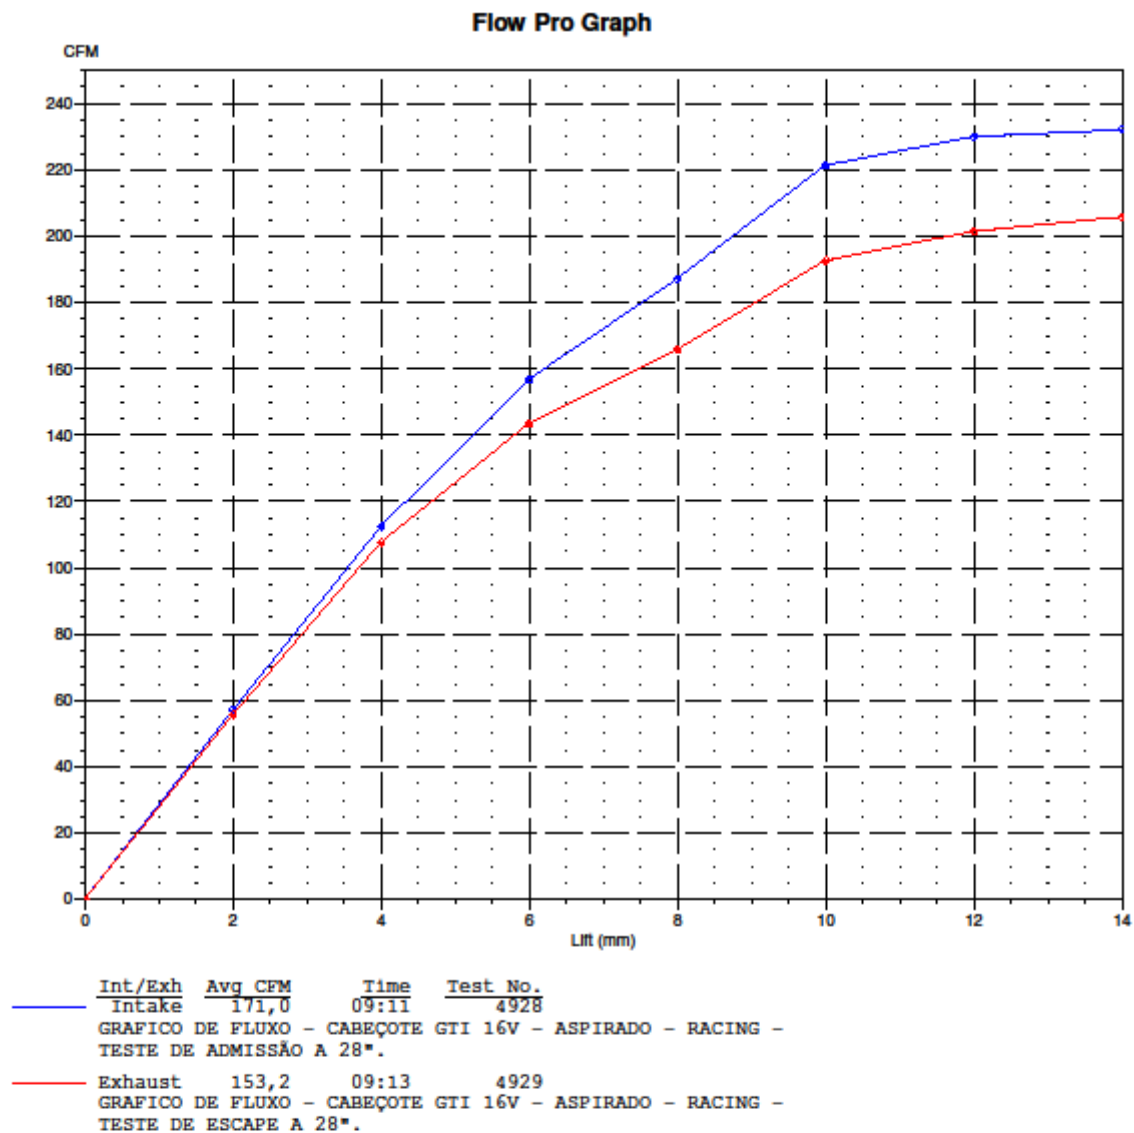


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - ASPIRADO - RACING - LEONARDO VIVIAN.



GRAFICOS DO COMANDO

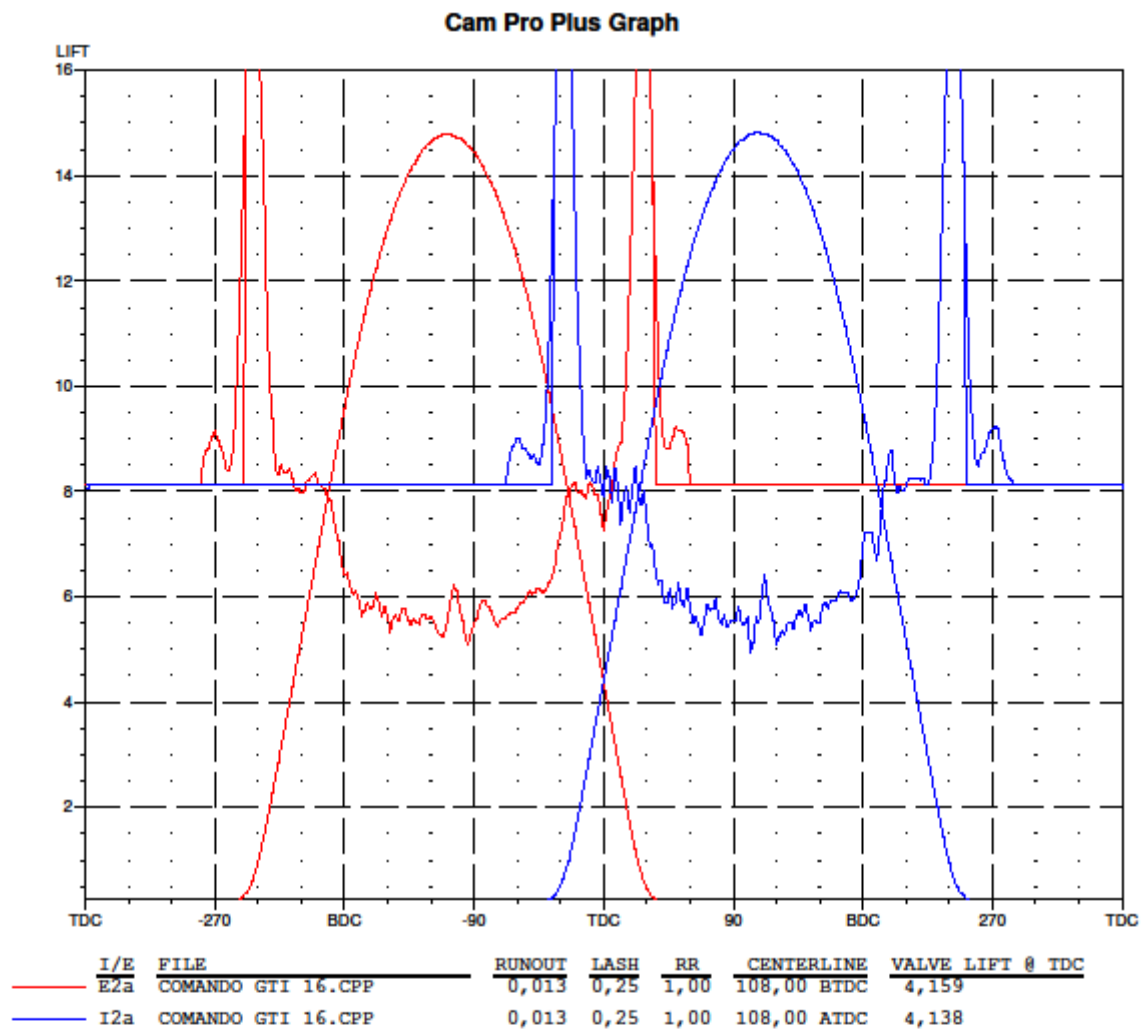

CHECK LIST

CLIENTE: LEONARDO VIVIAN – O.S 17120

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	100/260	100/260	100/260	100/260	100/260	100/260	100/260	100/260
ESC	100/260	100/260	100/260	100/260	100/260	100/260	100/260	100/260

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 49,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 10/05/2024

ORÇAMENTO

Nº 17.120

O.S.: 44.456.810

Cliente: LEONARDO VIVIAN

CPF/CNPJ: 03274283080

Fone: (054)99905-62 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	16,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	16,0	SE
1.259	MANDRILHAR MANCAIS 16V	1,0	SE
1.951	MANCAL	1,0	UN
1.146	SEDE DE BERILIO	8,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	4,0	UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.204	SOLDA ALOJAMENTO DE BICO	4,0	SE
1.091	GUIA 7MM	8,0	UN
2.211	TUCHO 35MM	16,0	UN

