



**LUIZ OTAVIO ROCHA CABRAL**

**ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO**



## SUMÁRIO

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. TABELA COM DADOS DE FLUXO ..... | 3 |
| 2. GRAFICOS DE FLUXO .....         | 4 |
| 3. CHECK LIST DO PRODUTO .....     | 5 |
| 4. ORÇAMENTO.....                  | 6 |



## TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

| No. | Operator                                                             | Customer   | Max CFM | Avg CFM |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| 1   | STUMPF CABEÇOTE                                                      | LUIZ OTAVI | 224,2   | 168,7   |
|     | GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - STREET - TESTE DE ADMISSÃO A 28" |            |         |         |
| 2   | STUMPF CABEÇOTE                                                      | LUIZ OTAVI | 156,6   | 127,8   |
|     | GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - STREET - TESTE DE ESCAPE A 28"   |            |         |         |

| Lift     | CCFM<br>No. 1 | No. 2 |
|----------|---------------|-------|
| 2,00     | 63,8          | 59,3  |
| 4,00     | 124,4         | 111,7 |
| 6,00     | 175,4         | 137,5 |
| 8,00     | 206,0         | 148,0 |
| 10,00    | 218,5         | 153,4 |
| Average: | 157,6         | 122,0 |



## GRAFICOS DE FLUXO A 28"

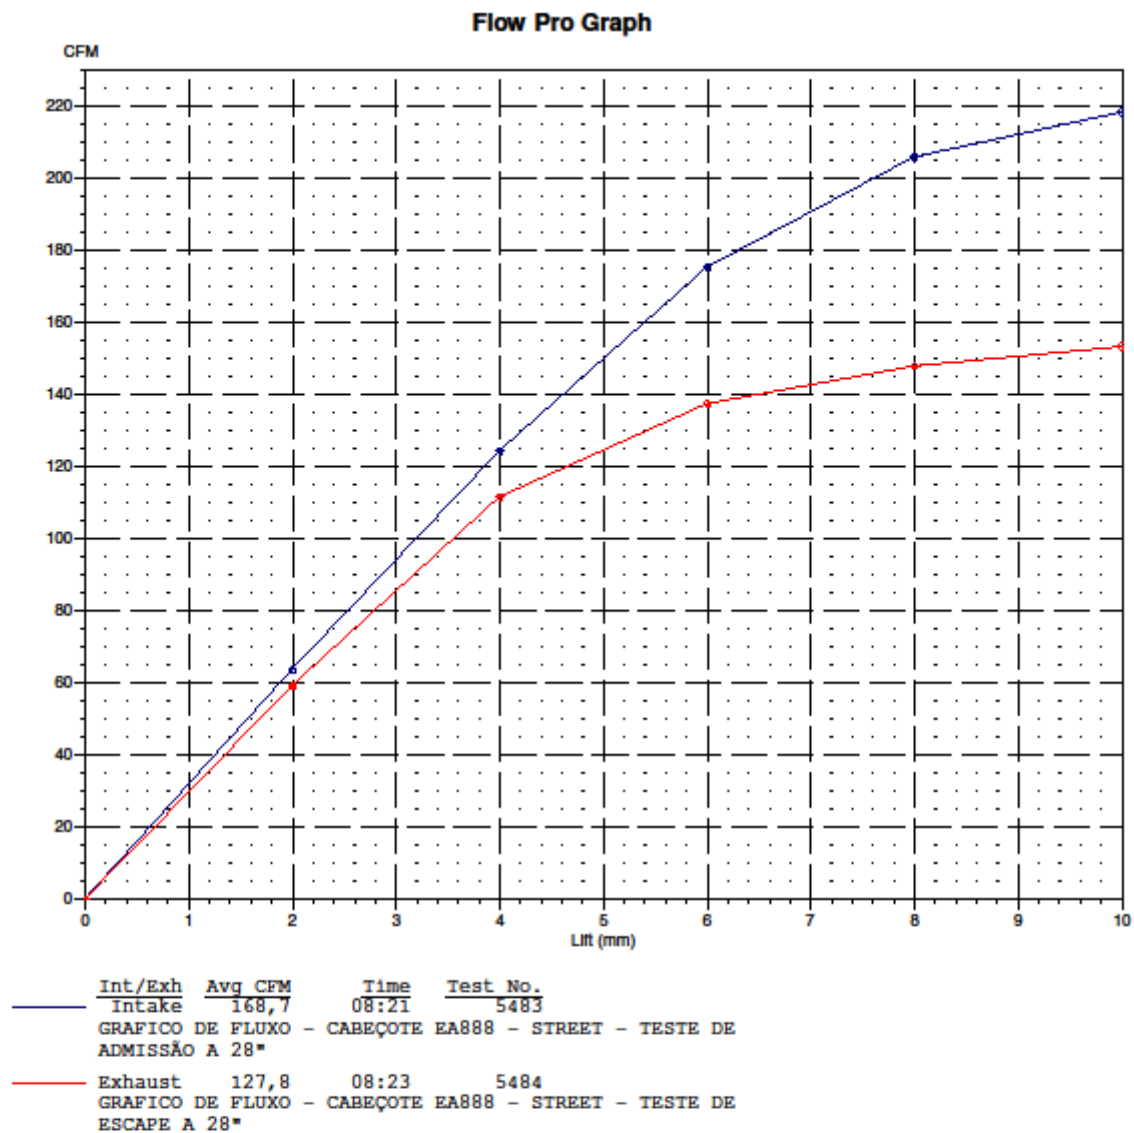


GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE EA888 - STREET - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



## CHECK LIST

**CLIENTE:** SLUIZ OTAVIO ROCHA CABRAL – O.S 19902

**VISTORIA:** ANDERSON

| FOLGA<br>VÁLVS. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM             | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESC             | - | - | - | - | - | - | - | - |

| CARGA<br>MOLAS | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ADM            | 90/183 | 90/183 | 90/183 | 90/183 | 90/183 | 90/183 | 90/183 | 90/183 |
| ESC            | 90/183 | 90/183 | 90/183 | 90/183 | 90/183 | 90/183 | 90/183 | 90/183 |

| VED.<br>SEDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESC           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**OBS:**      **VEDAÇÃO OK**

**VOLUME CAMARA: 47,6 CC**



## ORÇAMENTO

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | STUMPF                                     |
|                                                                                   | Tel/Fax: (45)99948-0123                    |
|                                                                                   | RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR |
|                                                                                   | CEP: 85818670                              |
|                                                                                   | CNPJ: 33826228000194                       |
|                                                                                   | E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com          |

Data: 12/02/2025

### ORÇAMENTO

Nº

19.902

O.S.:

Cliente: LUIZ OTAVIO ROCHA CABRAL

CPF/CNPJ: 04873107482

Fone: (081)8793-010 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

| Cod.  | Descrição                             | Quant. UN |
|-------|---------------------------------------|-----------|
| 1.845 | MAO DE OBRA DE ACABAMENTO             | 1,0 MO    |
| 1.530 | SEDE DE ACO FORJADO                   | 16,0 UN   |
| 1.283 | NITROGENIO PARA SEDES                 | 16,0 UN   |
| 1.187 | SUBSTITUIR SEDE                       | 16,0 SE   |
| 1.186 | RETIFICA DE SEDE                      | 16,0 SE   |
| 1.859 | SERVICO DE SOLDA                      | 1,0 SE    |
| 1.224 | MAO DE OBRA RETRABALHO 16V            | 1,0 MO    |
| 1.768 | VALVULA ORIGINAL GTI ADMISSAO. EA 888 | 8,0 UN    |
| 1.701 | VALVULA ORIGINAL GTI. EA 888          | 8,0 UN    |

