



MATHEUS ANDRADE PINTO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICO DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7
6. ORÇAMENTO	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Report

Pg 1

Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
STUMPF CABEÇOTE	MATHEUS AN	125,1	95,1
GRAFICO DE FLUXO - AP SV STREET PRO TURBO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM
2,00	31,3
4,00	69,3
6,00	90,0
8,00	108,2
10,00	119,0
12,00	123,1
14,00	125,1
Average:	95,1



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

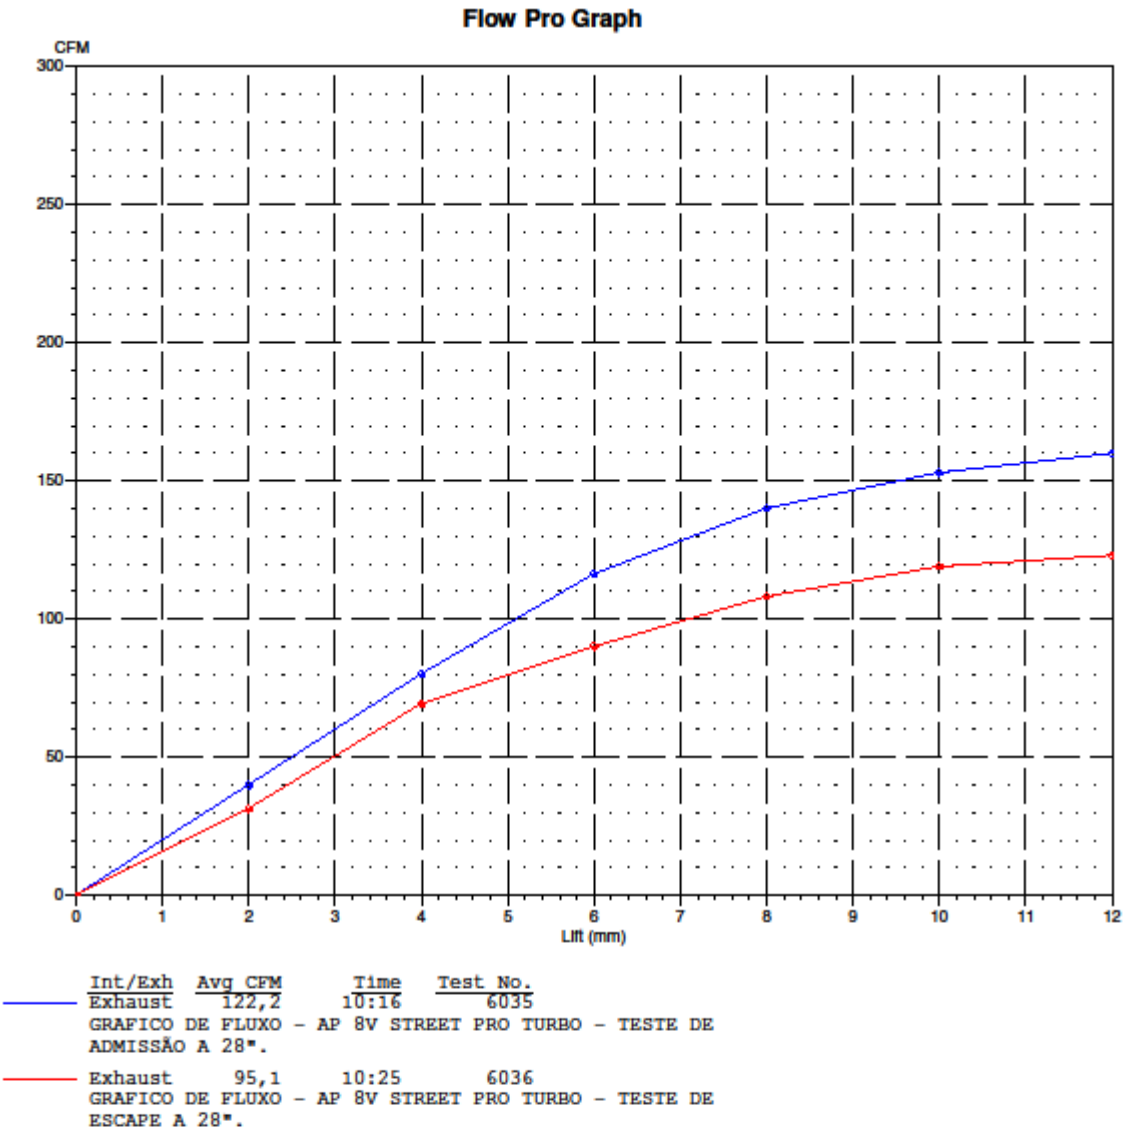


GRAFICO DE FLUXO - MATHEUS ANDRADE PINTO



CHECK LIST

CLIENTE MATHEUS ANDRADE PINTO
VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	110/240	110/240	110/240	110/240	-	-	-	-
ESC	110/240	110/240	110/240	110/240	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	-	-	-	-
ESC	√	√	√	√	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 35,2 CC
----------------------------	-------------------------------



ORÇAMENTO

	STUMPF	STUMPF
	CABEÇOTES	
	CEP: 85818670	
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

STUMPF
Tel/Fax: (45)99948-0123
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
CNPJ: 33826228000194

Data: 22/10/2025

ORÇAMENTO

Nº

22.571

O.S.:

Cliente: MATHEUS ANDRADE PINTO

CPF/CNPJ: 087.814.279-73

Fone: (041)9780-0991 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.179	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0	SE
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	4,0	UN
1.939	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE	4,0	UN
1.944	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO	4,0	UN
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
1.111	MOLA LONGA	8,0	UN
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	16,0	UN
2.211	TUCHO 35MM	8,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0	MO
1.468	COMANDO NACIONAL	1,0	UN
1.057	CASCO F.C. ALEMAO - ZERO	1,0	UN
2.554	KIT INSTALACAO	1,0	4
2.650	POLIA MTR - AP8V- VERMELHA	1,0	UN
1.534	JUNTA	1,0	UN
2.658	JUNTA ADMISSAO AP8V F.C	1,0	UN
1.290	CAMISETA STUMPF- G3 BRINDE	1,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN
2.018	CALCO MOLA ALUMINIO - 2MM	8,0	UN

