



PIRUKA RACING

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICO DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7
6. ORÇAMENTO	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Report

Pg 1


Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
STUMPF CABEÇOTE	PIRUKA RAC	232,1	171,0
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			

Lift	CCFM
2,00	57,0
4,00	112,4
6,00	156,9
8,00	187,2
10,00	221,4
12,00	230,1
14,00	232,1
Average:	171,0



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

Flow Pro Graph

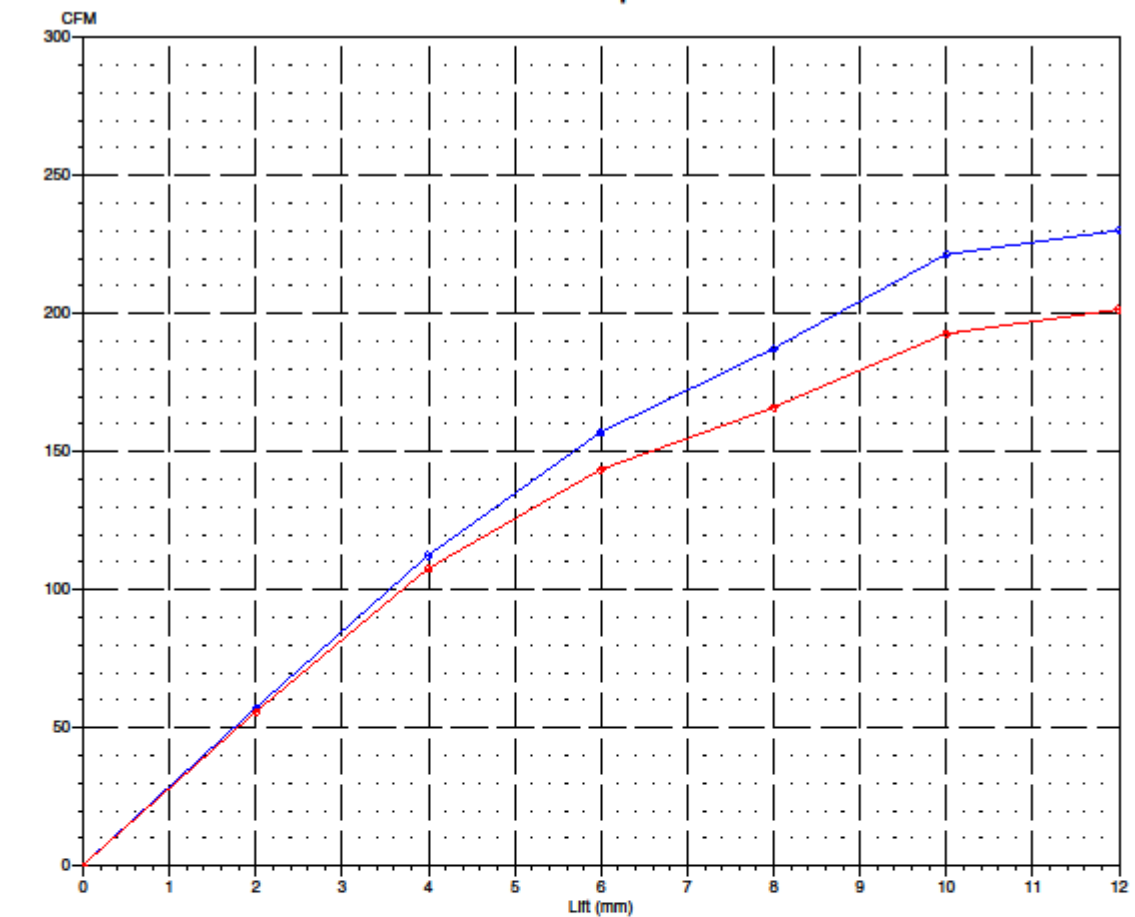

Int/Exh	Avg CFM	Time	Test No.
Exhaust	171,0	09:50	6027
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
Exhaust	153,2	09:55	6028
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - TESTE DE ESCAPE A 28".			

GRAFICO DE FLUXO - CRISTIAN FLAVIO



CHECK LIST

CLIENTE PIRUKA RACING OS 22516								
VISTORIA: VINICIUS								

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
ESC	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	130/250	130/250	130/250	130/250	130/250	130/250	130/250	130/250
ESC	130/250	130/250	130/250	130/250	130/250	130/250	130/250	130/250

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 47,00 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 16/10/2025 ORÇAMENTO N° 22.516
O.S.: 449.465.157.941

Cliente: PIRUKA RACING	
CPF/CNPJ: 43.454.963.0001/78	Fone: (067)9612-0307 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	16,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	16,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	16,0	UN
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0	SE
1.090	GUIA 7MM STD	16,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	4,0	UN
2.534	SOLDA GALERIA DE AGUA 16V	1,0	SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.259	MANDRILHAR MANCAIS 16V	1,0	SE
2.211	TUCHO 35MM	8,0	UN
2.189	PRISIONEIRO MANCAL	24,0	UN
2.018	CALCO MOLA ALUMINIO - 2MM	8,0	UN
1.439	SELO D'AGUA AP	1,0	UN



