



RETIFICA PRECISÃO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28''	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28''	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	RETIFICA P	187,3	150,4	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GMSV - TURBO DE RUA - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	RETIFICA P	147,5	113,5	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GMSV - TURBO DE RUA - TESTE DE ESCAPE A 28".				
Lift	CCFM No. 1	No. 2			
2,00	80,8	49,2			
4,00	127,5	92,5			
6,00	152,5	116,9			
8,00	171,7	132,2			
10,00	182,9	142,9			
12,00	187,3	147,5			
Average:	150,4	113,5			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

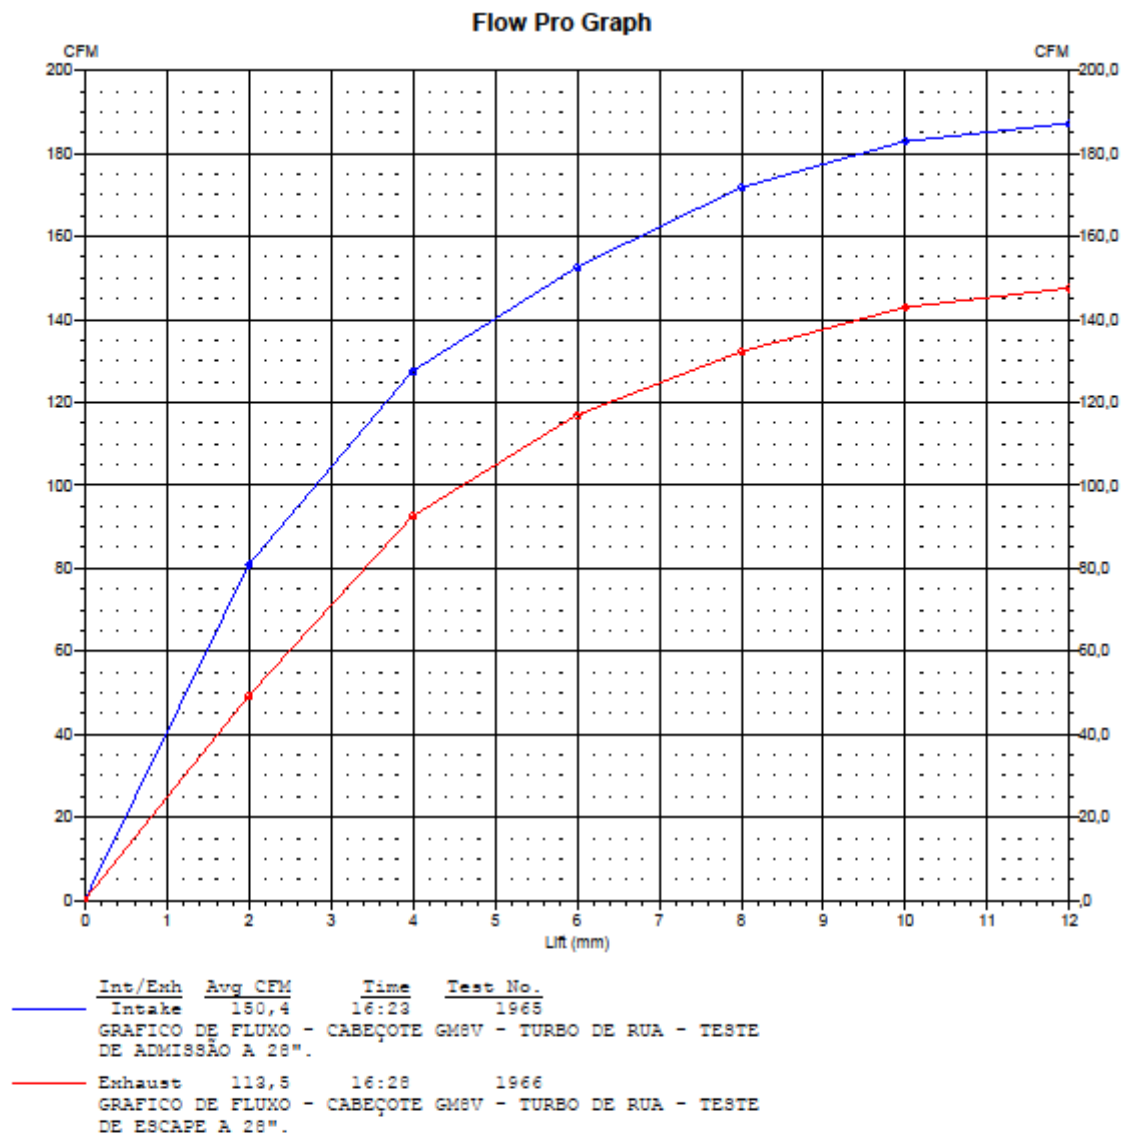


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GMSV - TURBO DE RUA - RETIFICA PRECISÃO.



CHECK LIST

CLIENTE: RETIFICA PRECISÃO – OS 11825

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVAS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-
ESC	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	86/220	86/220	86/220	86/220	-	-	-	-
ESC	86/220	86/220	86/220	86/220	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 48,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 25/08/2022

ORÇAMENTO

Nº 11.825

O.S.: 44.456.105

Cliente: RETIFICA PRECISAO CHAPECO SC LTDA

CPF/CNPJ: 34.008.915/0001-26

Fone: (049)98810-31 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
1.095	GUIA SOB MEDIDA 7MM	8,0 UN
1.833	VALVULA DE ADMISSAO HASTE 7MM	4,0 PC
1.834	VALVULA DE ESCAPE HASTE 7MM	4,0 PC
1.758	COMANDO GM	1,0 UN
1.836	TRAVA DE VALVULA - 7MM	16,0 UN
2.018	CALCO MOLA ALUMINIO - 2MM	8,0 UN
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0 SE
1.581	TUCHO MOTOR GM ASTRA/S10	8,0 UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO	8,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.414	PLAINA FACE	1,0 SE
1.458	MAO DE OBRA RETRABALHO 8V	1,0 MO
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0 SE
1.447	PLAINA LATERAL	2,0 SE

