



VALDEMIR PINHEIRO DE SOUZA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	VALDEMIR P	200,0	154,8
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V - TURBO - STREET - TESTE DE ESCAPE A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	VALDEMIR P	240,0	189,7
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V - TURBO - STREET - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	67,2	80,8
4,00	119,0	145,0
6,00	165,5	201,3
8,00	182,8	232,7
10,00	194,2	238,4
12,00	200,0	240,0
Average:	154,8	189,7



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

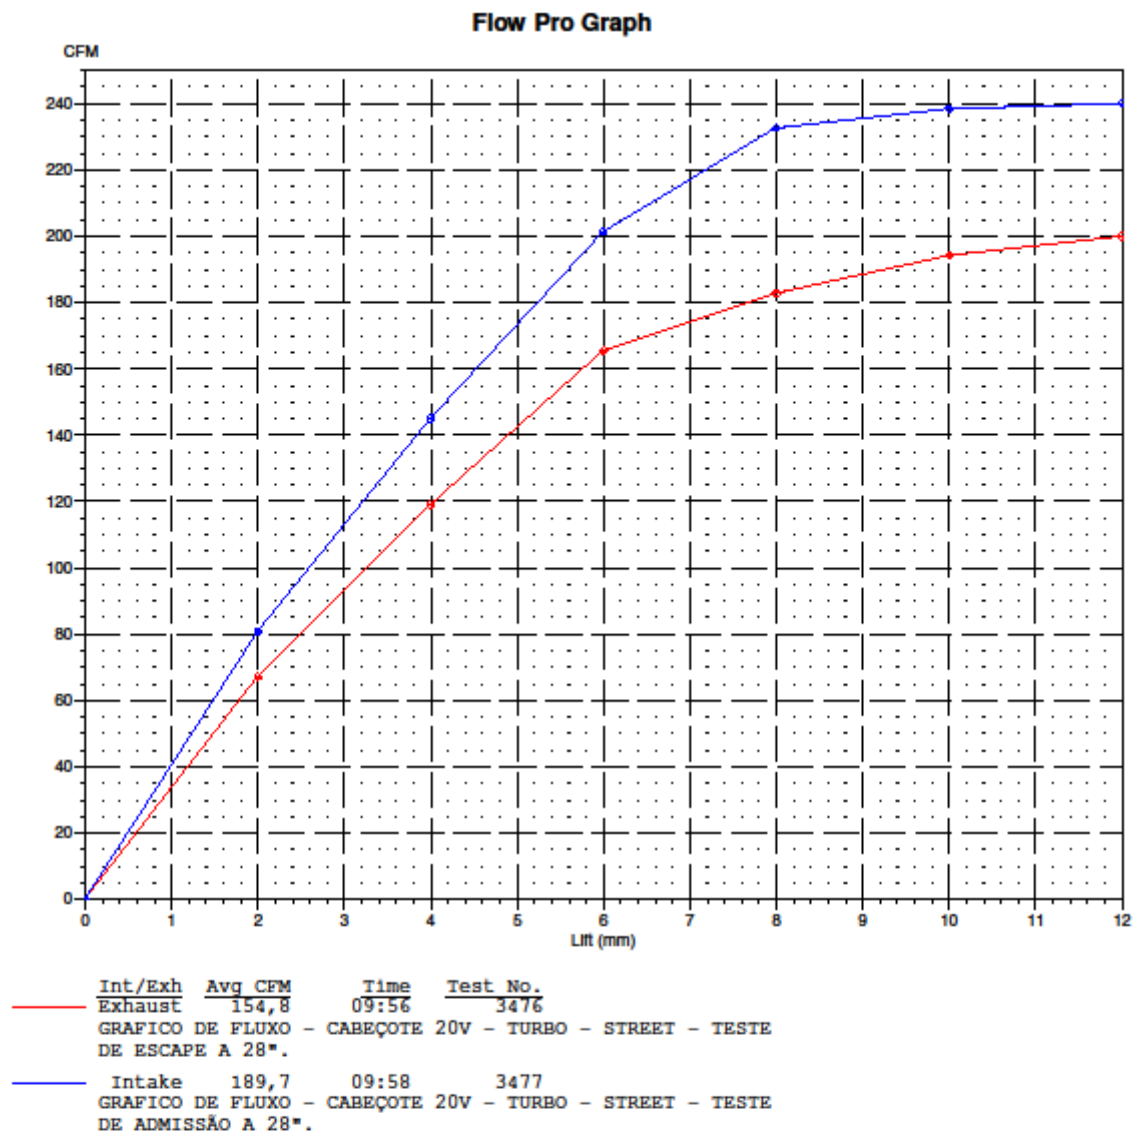


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V - TURBO - STREET - VALDEMIR PINHEIRO.





Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
 (45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
 cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : VALDEMIR PINHEIRO - O.S 14758

VISTORIA : ANDERSON

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	X	X	X	X

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	65/137	65/137	65/137	65/137	65/137	65/137	65/137	65/137	65/137	65/137	65/137	65/137
ESC	80/187	80/187	80/187	80/187	80/187	80/187	80/187	80/187	X	X	X	X

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 40 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 05/09/2023

ORÇAMENTO

Nº 14.758

O.S.: 44.457.312

Cliente: VALDEMIR PINHEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 185.418.188-29

Fone: (011)99403-421 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	20,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	20,0	SE
1.161	PLAINA FACE	1,0	SE
1.148	VEDADOR 6MM	20,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN
1.215	MAO DE OBRA RETRABALHO 20V	1,0	MO
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO- ADM	12,0	UN

